

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2010 YILI
FAALİYET RAPORU**





**Türk Milletinin istidadı ve
kesin kararı medeniyet
yolunda, durmadan,
yılmadan ilerlemektir.**

K. Atatürk



SUNUŞ

Tokat İl Özel İdaresi, verimlilik ve kalite unsurlarını ön plana çıkartan bir yönetim anlayışı içinde görevlerini yerine getirdiği, bir yılı daha geride bırakmıştır. 2010 yılı içerisinde, Kurumun yapmış olduğu faaliyetler, bir performans değerlendirmesi de yapılarak bu faaliyet raporu içerisinde sunulmaktadır.

Stratejik planlama süreci, üç temel ayak üzerine kuruludur. Uzun dönem vizyonun ve 5 yıl için hedeflerin belirlendiği stratejik plan ve stratejik plana uyumlu olarak hazırlanan yıllık yapılacak faaliyetlerin ortaya konduğu performans programları ve performans programlarının başarısını irdeleyen yıllık faaliyet raporlarıdır. Bu anlayış sorunlara geçici ve kısa dönem yaklaşımlar yerine, kalıcı ve uzun dönem yaklaşımları ortaya koyma amacıyla geliştirilmiştir. Bununla birlikte, hedefe yani hizmete odaklı bir anlayışı ortaya koyan ve hedefin gerçekleştirilmesini sorgulayan bir sistemdir. Söz konusu yaklaşımı içeren bu faaliyet raporunun daha da geliştirilerek hazırlanması, Kurumun faaliyetlerinin daha kaliteli ve verimli bir hizmete dönüştürülmesi açısından önemli olacaktır.

2010 yılı içerisinde, hizmetleri en üst düzeyde gerçekleştirmek için çaba, İl Özel İdaresinin karar organı İl Genel Meclisi Üyeleri ve kararları uygulamaya aktaran Kurum İdarecileri ve çalışanları tarafından üst düzeyde gösterilmiş olup, çalışmalarını takdirle karşılıyorum. İl Özel İdareleri geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Kaynakların oldukça sınırlı olması bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde zorlukları beraberinde getirmektedir. Buna rağmen kırsal kesimde imar, tarım ve eğitim alanlarında önemli yatırımları gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda ki en önemli amacımız; kaynakların kullanımında tasarrufu ve yatırımlarda ise verimliliği artırarak, insanlarımıza gelişmiş ülkeler standartlarında bir yaşamı sunabilmek olmalıdır.

2010 yılı faaliyet raporunu hazırlayan ilgili yönetici arkadaşlarımı hem bu rapor, hem de yıl içinde gösterdikleri başarılı çalışmaları nedeniyle kutluyor ve bundan sonraki yıllarda kendilerine daha ileri hedefler için üstün başarılar diliyorum.

Şerif YILMAZ
Tokat Valisi

Üst Yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsisi edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim

Şerif YILMAZ

Tokat Valisi

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim

Muhlis YEŞİLYURT
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2010 yılı Faaliyet Raporunun “III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Gürsel YILDIZ

Mali Hizmetler Müdürü

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER	1
A – Misyon ve Vizyon	2
B –Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
C – İdareye İlişkin Bilgiler	4
1. Fiziksel Yapı	4
2. Örgüt Yapısı	6
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	10
4. İnsan Kaynakları	12
5. Sunulan Hizmetler	17
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	17
II – AMAÇ VE HEDEFLER	20
A – İdarenin Amaç ve Hedefleri	21
B – Temel Politikalar ve Öncelikler	28
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	33
A – Mali Bilgiler	34
1. Bütçe Uygulama Sonuçları	34
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	39
B – Performans Bilgileri	42
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri	42
2. Performans Sonuçları Tablosu ve Değerlendirilmesi	55
• İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	56
• Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri	91
• Tarımsal Hizmetler	109
• Ruhsat ve Denetim Hizmetleri	138
• Sağlık Hizmetleri	149
• Kültür ve Turizm Hizmetleri	152
• Çevre Koruma ve Dinlenme Hizmetleri	157
• Sosyal Hizmetler	161
• Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri	165
• İdari Faaliyetler	169
IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GEĞERLENDİRİLMESİ	180
V – ÖNERİ VE TEDBİRLER	186

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2010 YILI
FAALİYET RAPORU**

I - GENEL BİLGİLER

A – MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz:

Adil, şeffaf, hızlı ve etkin, kaynak israfına müsaade etmeyen, hizmet ve yatırımlarda vatandaş memnuniyetini esas alan temel ilkeler ışığında ve yasalarla belirlenen görev sınırları içerisinde yaşayan yöre halkına; eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, gençlik ve spor, güvenlik, acil yardım ve kurtarma alanlarında hizmet vermektir.

Vizyonumuz:

Çağdaş beklentilere yakışır bir kalite ve hizmetin tüm topluma sunulduğu; bulunduğu ortamda mutlu, huzurlu ve geleceğe ümitle bakan insanlara sahip bir Tokat.

B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları; 5302 sayılı kanunun 6. maddesinde şu şekilde belirlenmiştir.

- a) Sağlık, Gençlik ve spor, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,
- b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ... ; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

yapmakla görevli ve yetkilidir.

C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. FİZİKSEL YAPI

Bina Durumu:

Çizelge 1. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait bulunan binalar ve kullanım amacına göre

BULUNDUĞU YER	VALİLİK KONUTU	HİZMET BİNASI	KAYMAKAM EVİ	MEMUR LOJMANI	OKUL	SAĞLIK OCAĞI	İŞYERİ
MERKEZ	1	4		58	20	1	1
ALMUS			1				14
ARTOVA		1	1	2			
BAŞÇİFLİK			1			1	
ERBAA		2	1	2	7	1	
NİKSAR		2	1	2	14	2	
PAZAR			1				
REŞADİYE		2	1	1			
SULUSARAY			1				1
TURHAL		1	1	1	12	2	
YEŞİLYURT			1		1		
ZİLE		2	1	1	10	2	4
TOPLAM	1	14	11	67	64	9	20

dağılımı.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan binalar Çizelge 1 ile verilmiştir. Toplam bina sayısı 186'dır. Bu binaların içerisinde işyeri olarak, Sulusaray Kaplıcası ile Merkez Gıj GIj tesisleri de yer almaktadır. Ayrıca İl Özel İdaresine ait merkez ve ilçelerde arsalar bulunmaktadır. Bu arsalar; eğitim, sağlık binaları, çeşitli kamu hizmetleri binaları ve rekreasyon alanları olarak kullanılmaktadır.

Araç ve Ekipman Durumu:**Çizelge 2. İl Özel İdaresi araç – makine park durumu.**


S. No	Cinsi	Miktarı (adet)	S. No	Cinsi	Miktarı (adet)	S. No	Cinsi	Miktarı (adet)
1	Otomobil	17	12	Yıkama cihazı	2	23	Roly tank	1
2	Pick-up	9	13	Paletli yükleyici	2	24	Kar püskürtme makinesi	1
3	Minibüs	5	14	Lastik tekerlekli yükleyici	9	25	Treyler Salı	7
4	Damperli kamyon	50	15	Kanal kazıyıcı	7	26	Kamp trayler	37
5	Sabit kasalı kamyon	1	16	Motor scrayper	2	27	Lastik tekerlekli silindir	2
6	Çekici	1	17	Trancher	1	28	Vibrasyonlu silindir	5
7	Forklift	2	18	Kompresör	6	29	Bakım (yama) silindiri	2
8	Mazot Roly tank	1	19	Palet delici	2	30	Seyyar kaynak makinesi	1
9	Yapım grayder	22	20	Asfalt yapım distribitörü	3	31	Jeneratör	1
10	Dozer	13	21	Asfalt bakım distribitörü	1	32	Delici Tabanca	10
11	Lastik tekerlekli traktör	2	22	Kamyona monteli roly tank	2	32	Kırıcı Tabanca	2
TOPLAM								229

Kurumun hizmetini gerçekleştirmesinde en önemli kaynağını iş makineleri ile ulaşım araçları oluşturmaktadır. İl Özel İdaresinin sahip olduğu makine park durumu çizelge 2’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Buna göre; kurumun çeşitli tipte 31 adet ulaşım aracı ile 198 adet iş makinesi bulunmaktadır.

2 - ÖRGÜT YAPISI

Organizasyon Şeması:

Tokat İl Özel İdaresi, 5302 sayılı kanunun 36.maddesine norm kadro ilke ve esaslarına göre yeniden 2007 yılı sonu itibariyle yeniden oluşturulmuştur. 2011 yılı Ocak ayı itibariyle mevcut teşkilat yapısı aşağıda liste halinde verilmiştir.



İl Özel İdaresi Organları:

- **İl Genel Meclisi:**

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl genel meclisine kanunla özel yetkiler verilmiştir. Örneğin, meclis, il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar verebilmektedir. İl genel meclisi, üyeleri arasından gizli oyla seçilen bir başkan tarafından yönetilir. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Gündem, meclis başkanı tarafından belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Valinin önerdiği hususlar gündeme alınır. İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde valiye gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez. Vali tarafından itiraz edilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de il genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Fakat valinin, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurma yetkisi vardır. Kanuna göre il genel meclisi, il özel idaresini periyodik olarak denetler. Bunun için il genel meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Komisyon, çalışmasını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, mart ayının on beşine kadar meclis başkanlığına sunar.

- **İl Encümeni:**



Kanuna göre il encümeni, valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Böylece encümenin toplam 11 kişiden oluşması öngörülmüştür. Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. İl encümeni, Yönetim Komitesi veya İcra Komitesi gibi vazife görür. Encümenin en önemli görevi stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmektir. Encümenin, haftada en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanması öngörülmüştür. İl encümeni ile vali arasındaki ilişkiler de önemli olan bir konudur. Kanuna göre vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü

encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen, eğer kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, vali, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. Bu uygulamayla bir taraftan kararların uygulanmasına sürat getirilmek istenmiş, diğer taraftan ise valinin de her halükarda gücü ve vesayet yetkisi korunmuştur.

- **Vali:**

Kanuna göre vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu niteliği ile aynı zamanda il encümenin başkanıdır. Vali, il özel idaresinin en üst amiri olarak kurumu yönetmek, hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Kanun, valiye, il özel idaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak, faaliyetlerin ve personelin performans ölçütlerini belirlemek, uygulatmak, izlemek ve bunlarla ilgili raporları meclise sunmak görevini vermiştir. Valinin stratejik planla ilgili belirli yükümlülükleri vardır. Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde stratejik planı hazırlamak zorundadır. Stratejik plan; kalkınma plan ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak hazırlanır. Stratejik plan ve ayrıca ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans planı vali tarafından il genel meclisine sunulur. Stratejik plan, varsa üniversiteler, meslek odaları ve konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plan ve performans planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve il genel meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Kanun, valinin görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan vali yardımcılarına, il özel idaresi görevlilerine veya ilçelerde kaymakamlara devredebileceğini belirtmiştir.

Ortaklıklar:

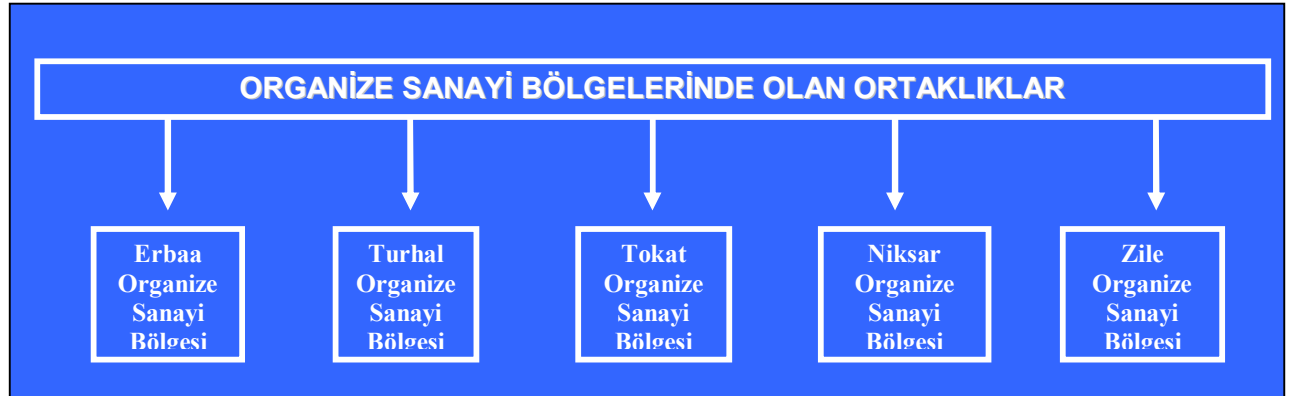

3 – BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

İl Özel İdaresi bilgiye ulaşma ve veri işleme sistemlerinin çağdaş normlara ulaştırılması amacıyla, İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından genel faaliyetler yürütülmekle birlikte, her birim kendi sistemine daha etkin hale getirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda İl özel İdaresinin bilgi ve teknolojik yapısını şu şekilde özetlenebilir:

- **Evrak Kayıt:**

Kurumumuz tarafından, e-devlet projesi uygulamaya konulmuş ve bu doğrultuda yapılanmaya gidilmiştir. Bu kapsamda Sayın Valilimizin önemle üzerinde durduğu ve bizzat katıldığı eğitim seminerleri düzenlenmiş ve gerekli eğitim ve altyapı çalışmaları sonrasında, 2008 yılının Nisan ayı itibariyle e-devlet uygulamasına fiilen başlanılmıştır. 2008 – 2010 yılları arasında, Kurum personelinin e-devlet uygulamalarına tam olarak adaptasyonunu sağlamıştır. 2010 yılı sonu itibariyle e-imza uygulamasına geçilmiştir. e-imza uygulamasına, Türkiye’deki tüm kurumların geçişi ile birlikte, evrakların iletimindeki etkinlik artacaktır.

- **Bilgi işlem:**

Bilgi işlem büromuzda idaremizin resmi web sayfasının mizanpaj, dizayn ve güncelleme hizmetleri yapılmaktadır. Hizmet sorunsuz olarak yürütülmektedir. Bununla birlikte, müşteri memnuniyeti ve saydamlık prensipleri ışığı altında, hizmetlerimizin daha iyi takip edilebilir hale getirilebilmesi amaçlarımız arasındadır. Bu bağlamda e-devlet uygulamaları ile web hizmetleri arasında bağlantının kurulabilmesi gerekmektedir.

- **Arşiv Hizmetleri:**

Arşiv hizmetleri, verilerin değerlendirilmesi ve kurumun yatırımlarına yön vermesi açısından, çok önemli faaliyetler arasındadır. Bütün arşiv hizmetlerinin günümüz teknolojisine uygun olarak elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. Bu konuda idarenin tüm birimlerine gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu konuda bazı çalışmalar yapılmakla birlikte henüz istenilen seviyeye gelmemiştir.

- **Teknolojik altyapı:**

Teknolojik altyapı açısından güçlü olunması, kurum etkinliğinin de üst düzeyde olmasını sağlayan en önemli araçlardandır. Teknolojik altyapı denildiğinde, elektronik ortam ve bu ortamda kullanılacak cihaz ve programlar akla gelmektedir. Kurum olarak son yıllarda, teknolojik altyapının güçlendirilmesi için önemli imkânlar sağlanmıştır. Bu bağlamda kurum bilgisayar kapasitesi personelin kullanımına müsait hale getirilmiştir. Kurum teknik ve idari personelinin, internete ulaşmaları sağlanmıştır.

Bununla birlikte, bilgisayarın etkin kullanımı cihaz ve programlar ile desteklenmelidir. Özellikle coğrafi bilgi sistemleri üzerine temin edilecek cihaz ve programlar, kurum için hayati önem taşımaktadır. Kurum etkinliğini artırmak ve kurumsal hizmetlerde maksimum tasarrufu sağlamak, bu konuya yapılacak yatırımlar ile mümkün olabilecektir. Bu konuda çeşitli bilgisayar programı ve cihaz alımları son yıllarda gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili dünyada meydana gelen tüm gelişmeler takip edilmelidir.

4 - İNSAN KAYNAKLARI

Tokat İl Özel İdaresinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi 97 adet memur, 4857 Sayılı İş Kanununa tabi 329 adet daimi ve 2 adet geçici işçi statülü personel ile 8 adet sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. Kurumumuza norm kadro ile tahsis edilen 166 memur kadrosundan 97 adedi dolu olup, 69 adet boş memur kadrosu bulunmaktadır. Bununla birlikte norm kadro ile tahsis edilen 102 adet daimi işçi personele karşılık 329 adet daimi işçi bulunmakta olup, 227 adet daimi işçi fazlası bulunmaktadır.

Tokat İl Özel İdaresi mevcut personel durumuna ilişkin bilgiler aşağıda çizelgeler halinde sunulmuştur.



Personel Statü ve Görev Yeri Tanımı:

Çizelge 3. Personel statü cetveli (dolu – boş).

PERSONEL		NORM KADRO	DOLU	BOŞ
MEMUR	Genel İdari Hizmetler	56	21	35
	Teknik Hizmetler	55	47	8
	Diğer Hizmetler	38	24	14
	Yardımcı Hizmetler	17	5	12
	TOPLAM	166	97	69
SÖZLEŞMELİ	Tam Zamanlı	8	8	0
	Kısmi Zamanlı			
İŞÇİ	Daimi	102	329	-227
	Geçici	2	2	0

Çizelge 4. Personel görev yerleri durumu.


PERSONEL	MEMUR			SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
	G.İ.H.	T.H.	Y.H.			
Merkez	31	47	1	8	253	340
Almus	1				12	13
Artova	1		1		8	10
Başçiftlik						
Erbaa	1				13	14
Niksar	1		1		11	13
Pazar	1				1	2
Reşadiye	2		1		10	13
Sulusaray	1					1
Turhal	2		1		9	12
Yeşilyurt	2					2
Zile	2				12	14
TOPLAM	45	47	5	8	329	434



Personel Eğitim Durumu:


Çizelge 5. Memur personel eğitim durumu.

Eğitim Durumu	Sayısı (adet)
Lisans	48
Ön Lisans	34
Lise	12
Ortaokul	2
İlkokul	1
TOPLAM	97




Çizelge 6. Sözleşmeli personel eğitim durumu.

Eğitim Durumu	Sayısı (adet)
Lisans	6
Ön Lisans	2
Lise	
Ortaokul	
İlkokul	
TOPLAM	8




Çizelge 7. İşçi personel eğitim durumu.

Eğitim Durumu	Sayısı (adet)
Lisans	10
Ön Lisans	16
Lise	81
Ortaokul	38
İlkokul	184
TOPLAM	329

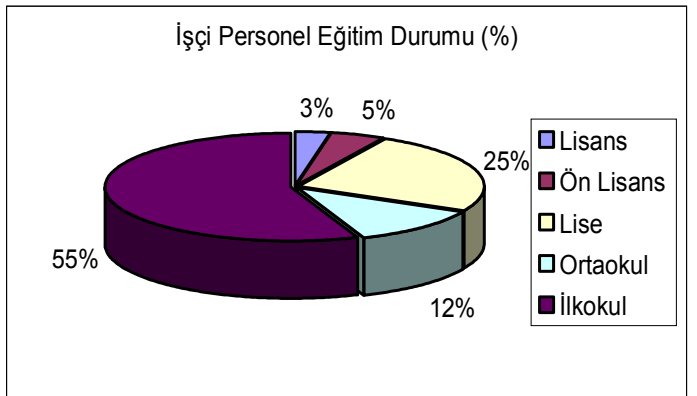


Çizelge 8. Toplam personel eğitim durumu.

Eğitim Durumu	Sayısı (adet)
Lisans	64
Ön Lisans	52
Lise	93
Ortaokul	40
İlkokul	185
TOPLAM	434




Çizelge 9. Memur personel yaş durumu.

Yaş Grubu	Sayısı (adet)
20-29	2
30-39	23
40-49	54
50+	18
TOPLAM	97

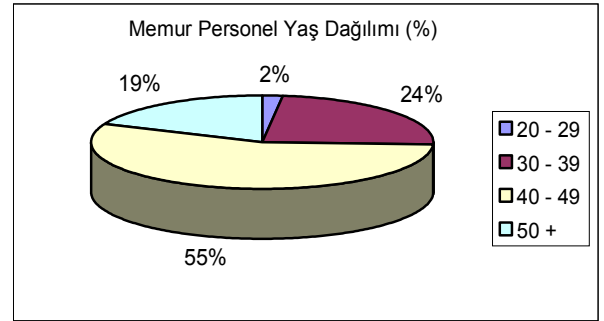


Çizelge 10. Sözleşmeli personel yaş durumu.

Yaş Grubu	Sayısı (adet)
20-29	3
30-39	5
40-49	
50+	
TOPLAM	8




Çizelge 11. İşçi personel yaş durumu.

Yaş Grubu	Sayısı (adet)
20-29	4
30-39	40
40-49	165
50+	120
TOPLAM	329

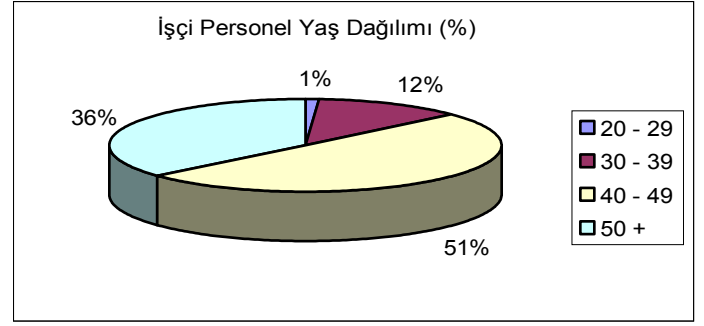

Çizelge 12. Toplam personel yaş durumu.

Yaş Grubu	Sayısı (adet)
20-29	9
30-39	68
40-49	219
50+	138
TOPLAM	434



5. SUNULAN HİZMETLER

Tokat İl Özel İdaresi, 5302 sayılı kanun ile verilen görevleri gereği; İl sınırları içerisinde yaşayan yöre halkına; Eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, gençlik ve spor, acil yardım ve kurtarma alanlarında hizmet vermektedir. Bu hizmet alanlarında; İlin çevre düzeni ve planı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, küçük işletmelere yönelik mikro krediler verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binaların yapım, bakım onarımı ile diğer ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içerisinde; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi yapımı ile ilişkin hizmetleri ise belediye sınırları dışında yapmaktadır.


Tokat İl Özel İdaresi, kanunla belirlenmiş görevlerine katkı sağlayacak, her türlü projeye destek sağlamakta ve sahiplenmektedir. Bu kapsamda, son zamanlarda kırsala hizmet sağlayan KÖYDES adı altında yer alan projenin içerisinde yer almıştır. Bu kapsamda önemli hizmetleri gerçekleştirmiştir. Bunun dışında, dış kaynaklı projelerinin (AB, Dünya Bankası vb.) hayata geçirilmesi amacıyla; eş finansman sağlanmasında, proje hazırlığında ve proje sahibi olarak katkı sağlamaktadır. Bu zamana kadar bu kapsamda birçok projenin gerçekleştirilmesini sağlamıştır.

6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Tokat İl Özel İdaresi, 5302 sayılı kanunun 36.maddesine norm kadro ilke ve esaslarına göre yeniden oluşturulmuş ve 2007 yılı Ağustos ayı itibariyle yönetim birimleri belirlenmiştir. Bu birimler ve görevleri aşağıdaki listede verilmiştir. Ayrıca Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcısı ve birim müdürlüklerinin yöneticilerine ait özgeçmişler, rapor ekinde sunulmuştur.

İl Özel İdarelerinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre iç ve dış denetim yapılır. Alınan kararların temel ilke, politika, öncelikler ve belirlenen stratejik hedeflere uygunluğu; yetkili makamlarca ve İl Genel Meclisi tarafından oluşturulan Denetim Komisyonunca iç denetimlere, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığınca da dış denetimlere tabi tutulmaktadır. İl genel Meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında, İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından; gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız

üyelerin İl genel Meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, Vali tarafından İl Özel İdaresi binası içerisinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi Valinin onayıyla, kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenilen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur. Komisyon, çalışmalarını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, izleyen ayın 15'ine kadar Meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak, Meclis Başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

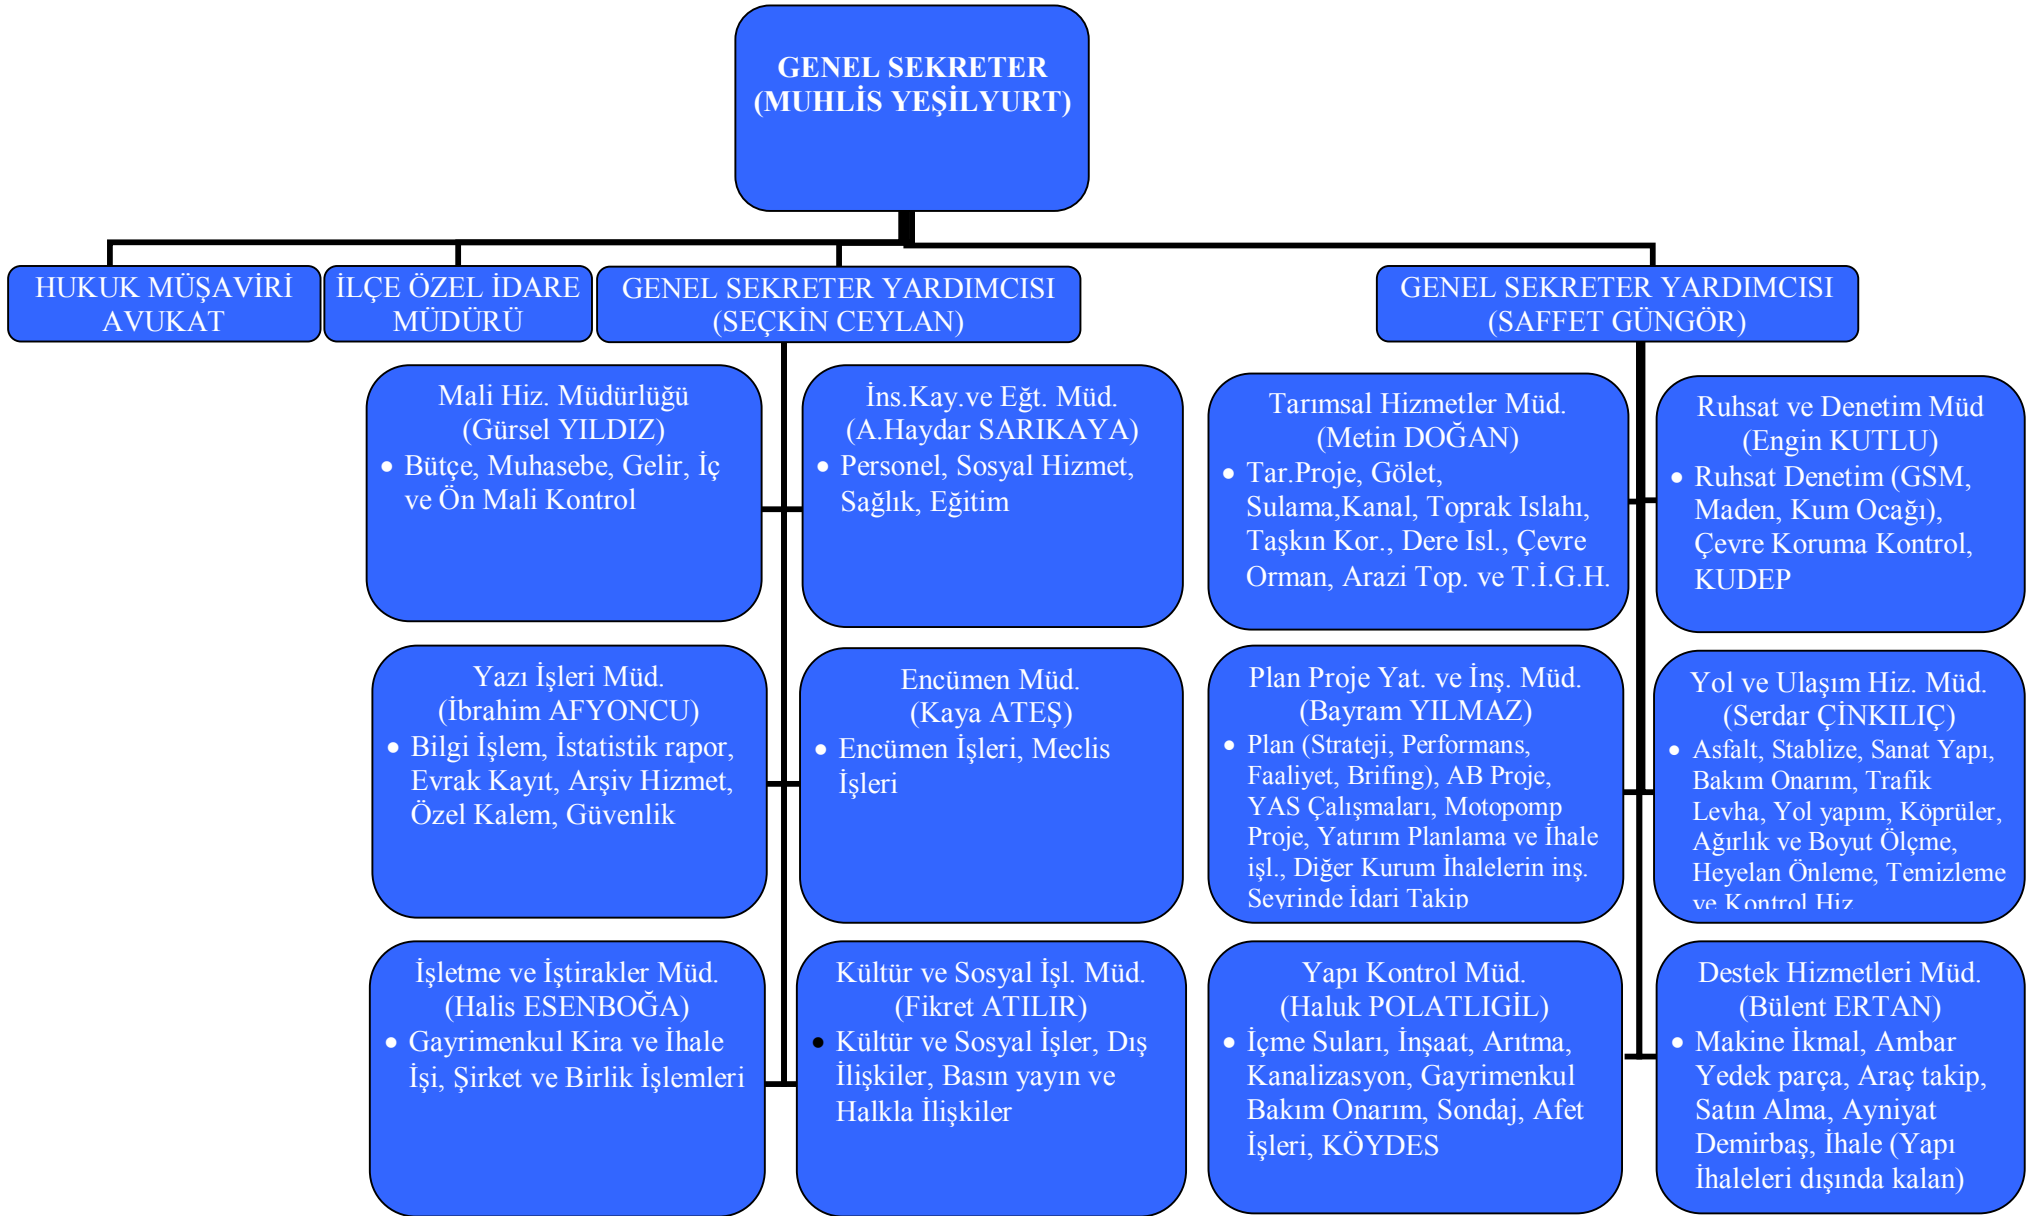

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2010 YILI
FAALİYET RAPORU**

II - AMAÇ VE HEDEFLER

A – İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

İdarenin 2009–2013 Stratejik Planına göre belirlediği amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir.

İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	TÜM KIRSAL YERLEŞİM BİRİMLERİNE; SAĞLIKLI VE YETERLİ İÇME SUYU SAĞLANACAKTIR.	1.1 Tokat ili kırsal yerleşim birimlerinin tümüne içme suyu sağlanmış olup, 2013 yılı sonunda içme suyu yetersizliği çeken köy oranı % 2.50 oranına indirilecektir. 1.2 Sağlıklı bir içme suyu sağlayabilmek için klorlama tesislerini kurmak ve 5 yıl içerisinde köylerin tamamında tesis etmek.
2	GÖREV ALANI İÇERİSİNDEKİ TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİNE, ÇALIŞIR DURUMDA KANALİZASYON HİZMETİNİ SUNMAK.	2.1 2012 yılı sonuna kadar köylerin % 95'inin kanalizasyonu tamamlanacaktır. 2.2 2013 yılı sonunda, bakım-onarım ihtiyacı hissedilen kanalizasyon tesisi oranı % 10'lar seviyesine indirilecektir.
3	ULAŞIMIN HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLANABİLMESİ İÇİN BÜTÜN KIRSAL YERLEŞİM BİRİMİ YOLLARI ÇAĞDAŞ STANDARTLARA KAVUŞTURULACAKTIR.	3.1 Kurumumuz görev alanı içerisinde yer alan yolların, yapılacak çalışmaları ile yol standardı yükseltilecektir. 3.2 Grup ve münferit köy yollarının trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için, trafik işaret ve levhaları tamamlanacaktır.
4	HALKIMIZA GELİŞMİŞ ÜLKE STANDARTLARINDA BAYINDIRLIK VE İMAR HİZMETLERİ SAĞLANACAKTIR.	4.1 İl bayındırlık ve imar hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır. 4.2 Köy içi yollarının ve ortak kullanım tesislerinin daha iyi standartlara kavuşturulması için katkı sağlanacaktır.

EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE GELİŞMİŞ ÜLKELER DÜZEYİNDE BİR EĞİTİM ALT YAPISI VE ÇEVRE DÜZENİ OLUŞTURMAK.	1.1 2013 yılı sonuna kadar; ilk ve orta öğretimde il genelinde yoğunlaşma olan 38 adet ilköğretim ile 9 adet ortaöğretim okulunda, derslik başına öğrenci sayısı 30'un altına düşürülecektir. 1.2 2013 yılı sonuna kadar, okul öncesi eğitimde okullaşma oranı; 60–72 ay yaş grubunda % 75'e, 36–60 ay yaş grubunda % 25'e çıkartılacaktır. 1.3 2013 yılı sonuna kadar, Tokat ili merkez ve ilçelerde orta öğretim öğrencilerinin yurt ihtiyacı % 80 oranında giderilecektir.
2	İLK VE ORTA ÖĞRETİMDEKİ ÖĞRENCİLERİN SPOR YAPABİLECEĞİ OKUL SPOR TESİSLERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER SEVİYESİNE ÇIKARTILACAKTIR.	2.1 2009–2013 yılları arasında, yapılacak küçük tip kapalı spor salonları ile ihtiyacın % 40'ı karşılanacaktır.
3	TÜM TOKAT HALKINA HİZMET SUNABİLECEK SPOR TESİSLERİNİ İNŞAA ETMEK VE İŞLERLİĞİNİ SAĞLAMAK.	3.1 Spor çeşitliliğini artıracak ve ihtiyacı karşılayacak modern spor tesisleri kazandırılacaktır. 3.2 Mevcut spor tesislerinin belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, bakım onarımı sağlanacak ve işlerliğine katkıda bulunulacaktır.
4	GENÇLERİMİZİ SPORTİF EĞİTİM VE FAALİYETLERE YÖNLENDİREREK, DAHA SAĞLIKLI VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK BİR NESİL YETİŞTİRİLMESİNE KATKIDA BULUNMAK.	4.1 Amatör kulüp sporcularının malzeme alımına destek sağlanacaktır.

TARIMSAL HİZMETLER

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	TARIMSAL ÜRETİM VE HAYVANCILIK GELİRİNİ ARTIRMAK.	1.1 Mevcut bitkisel ve hayvansal üretimi ve verimliliği artıracak ve de mevcut üretim deseninde yeni alternatif bitkilerin yer almasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. 1.2 Üretici birliklerine üye olan çiftçi sayısı 2009–2013 beş yıllık dönem içerisinde 3000 adete çıkartılacaktır.
2	İNSAN, HAYVAN VE BİTKİ SAĞLIĞINI KORUMAK.	2.1 İnsan, hayvan ve çevre sağlığının iyileştirilmesine ve korunmasına yönelik projeler geliştirilecektir.
3	TARIMSAL ÜRETİMDE TOPRAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRICI VE MİNİMUM GİRDİ (GÜBRE, SU, İLAÇ VB) KULLANIMINI SAĞLAYICI YÖNTEMLERİ ARTIRMAK.	3.1 Tarımda toprak analizine göre gübre uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacak ve laboratuvar hizmetleri gelişmiş ülkeler seviyesine getirilecektir. 3.2. Organik tarım ürünleri yetiştiriciliği yaygınlaştırılacaktır. 3.3 Tarımda minimum girdi (gübre, su, ilaç vb.) kullanımına yönelik çiftçilerin bilgilendirilmesi artırılabilecek ve bu yönde olumlu gelişmeler sağlanacaktır. 3.4 Tarımsal üretim ve yatırım kararlarında verimliliği artırıcı, toprak ve su kaynakları veri tabanı çalışmaları başlatılacak ve arazi çalışmaları tamamlanacaktır.
4	TÜM TARIM ALANLARINA YETERLİ OLABİLECEK SU KAPASİTESİ OLUŞTURULARAK; ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ SU KULLANIMI PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE, TÜM TARIM ALANLARINA SULAMA TESİSİ İNŞA EDİLECEKTİR.	4.1 2009–2013 yılları arasında; toplam gölet su tutma kapasitesi 3 milyon m³ artırılabilecektir. 4.2 2009–2013 yılları arasında; yapılacak yer altı sulama başvuruları DSİ ile ortak çalışma ile sonuçlandırılarak, ekstra 750 m³/h su kapasitesi elde edilecektir. 4.3 2009–2013 yılları arasında; toplam 6500 ha alana hitap edebilecek sulama tesisi inşa edilecektir.
5	ARAZİ TOPLULAŞTIRMA YATIRIMLARINDA, DEVAM ETMEKTE OLAN PROJELER	5.1 2010 yılı sonuna kadar, Niksar ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 30'unun toplulaştırması tamamlanacaktır.

	KURUMUMUZ TARAFINDAN 2010 YILI SONUNA KADAR, BÜTÇESİ TARIM BAKANLIĞINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE TAMAMLANACAK OLUP; BUNDAN SONRA YAPILACAK ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI TARIM BAKANLIĞI İLE KOORDİNELİ OLARAK, TARIM BAKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.	5.2 2010 yılı sonuna kadar, Erbaa ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 92'sinin toplulaştırması tamamlanacaktır. 5.3 2010 yılı sonuna kadar, Zile ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 26'sının toplulaştırması tamamlanacaktır.
--	--	--

RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	İLİMİZ YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARINDAN ELDE EDİLEN ÜRETİMİ, KAYNAKLARINI GELECEK NESİLLERE TAŞIMA VE ÇEVREYE DUYARLI BİR ANLAYIŞ İÇERİSİNDE ARTIRMAK.	1.1 İl genelinde, Kurum görev alanı içerisinde kalan gayri sıhhi ve sıhhi müesseselerin, ruhsatlı ve yasal sınırlar içerisinde çalışmalarını temin edilecektir. 1.2 Ruhsatsız ve yasal sınırlar içerisinde çalışmayan 1/A Grubu Maden (kum, çakıl) işletmesi ile su ürünleri işletmesi bırakılmayacaktır.
2	KURUM GÖREV ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN HARİTA İMAR HİZMETLERİNİ, MODERN BİR HİZMET ANLAYIŞI İÇERİSİNDE ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK.	2.1 Görev alanı içerisindeki harita imar hizmetleri karşılanacaktır.

SAĞLIK HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİNDE YAŞAYAN İNSANLARA İLK SAĞLIK MÜDAHELESİNİN YAPILABİLECEĞİ VE RAHATLIKLA ULAŞILABİLECEK, SAĞLIK TESİSLERİ İNŞAA EDİLECEK VE DÜZENLİ ÇALIŞMALARI SAĞLANACAKTIR.	1.1 İl genelinde ihtiyaç bildirilen sağlık ocağı ve sağlık merkezi ihtiyacı karşılanacak olup, mevcut sağlık tesislerinin etkin çalışabilmesi amacıyla gerekli bakım-onarım ve ekipman ihtiyacına yönelik gerekli destek sağlanacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	TOKAT İLİNDEKİ TARİHİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK MEKÂNLARI KORUMAK, GELİŞTİRMEK VE TANITIMINI YAPARAK TURİZME KAZANDIRMAK.	1.1 İl genelindeki kültürel ve turistik merkezleri geliştirmek ve korumak. 1.2 Tokat ilini, kültürel ve turizm açısından Türkiye ve dünya genelinde tanınan, bir il haline getirmek.

ÇEVRE KORUMA VE DİNLENME HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	İNSANLARA TEMİZ, YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK.	1.1 2013 yılı sonuna kadar kanalizasyonu tamamlanmış köylerin % 10'una doğal arıtma tesisleri yapılacaktır. 1.2 Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve beklentileri tam olarak karşılayamayan, “Tokat İli Çevre Düzeni Planı”, yeniden değerlendirilecek ve detaylandırılmış olarak 2013 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.
2	İLİMİZDE EKOLOJİK DENGİNİN BOZULMASI İLE EROZYONU ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINACAK VE ORMAN ZENGİNLİĞİ ARTIRILACAKTIR.	2.1 Ağaçlandırma ve orman bakım ve koruma faaliyetlerine katkı sağlanacaktır.
3	İLİMİZDEKİ MİLLÎ PARK, MESİRE YERİ VE YABAN HAYATI ALANLARI ARTIRILACAK, KORUNACAK VE GELİŞTİRİLECEKTİR.	3.1 İlimizdeki mesire alanı ve içi yollarının standardı artırılacaktır.

SOSYAL HİZMETLER

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	SOSYAL HİZMETLERDE AB STANDARTLARINDA BİR HİZMET ANLAYIŞI İÇERİSİNDE, SOSYAL YARDIMA İHTİYAÇ HİSSEDEN HERKESİN YANINDA YER ALINACAKTIR. TOPLUMUN HER KESİMİNİN ÜRETİME KATILIMI SAĞLANACAKTIR.	1.1 Sosyal hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır. 1.2 Dar gelirli ailelere mikro kredi desteği verilerek, ekonomik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanacaktır.

GÜVENLİK VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	GÜVENLİK VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ; ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ, MODERN BİR YAPIYA KAVUŞTURULACAKTIR.	1.1 Güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin güçlenmesine yönelik olarak, ilgili kurum ihtiyaçları doğrultusunda gerekli katkı sağlanacaktır.

B – TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Kurumsal Alanda:

Vizyonumuz, idari ve teknik açıdan modern ve etkin bir kurumsal yapıyı oluşturmaktır. Bunu başarabilmek için izlenecek temel politika, ulaşılmak istenen resmi belirlemek ve bu resmin oluşturulması için gerekli adımları atmaktan geçmektedir. Bunu yapabilmenin yolu, Kurum olarak uluslararası standartları yakalamaktır. Uluslararası standartları izlemek, Kurumu, istenilen kaliteye, kaynak israfına yol açmadan ulaştıracaktır. Bu konudaki önceliklerimiz;

- 5302 Sayılı Kanun ile oluşturulan yeni yapılanmanın üst çerçevesi belirlenmiş olmakla birlikte, yeni yapılanmanın işlevlerini yerine getirici ve hizmet etkinliğini artırıcı kurum içi çalışmalar ve düzenlemeler gerektiği anlarda yapılacaktır.
- Kurum personelinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla; çalışma ortamını geliştirici düzenlemeler yaparak, personel ihtiyacı olan teknolojik ekipman ihtiyacı karşılanacaktır.
- Kurum tarafından sahip olunması gerekliliği olmayan ve genel olarak Kuruma maddi külfet getiren gayrimenkuller, özelleştirilerek, Kurumun esas görevlerine odaklanmasına katkı sağlanacaktır.
- Kurum istatistik, yatırımların izlenmesi ve arşivleme sisteminin etkin hale getirilerek, bilgiye ulaşımının kolaylaştırılması ve yatırım kararlarının etkinliğinin artırılması sağlanacaktır.

Önceliklerimiz, 9.Kalkınma Planının (2007-2013) Gelişme Eksenleri Başlığı altında şu eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar:

Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması

- Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve işlevleri gözden geçirilerek bu alandaki mükerrerlikler giderilecek, kurum ve kuruluşların politika oluşturma, maliyetlendirme ve uygulama kapasiteleri artırılacak, insan kaynakları geliştirilecek, kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanılacak, adalet ve güvenlik hizmetlerinin etkili bir biçimde sunulması sağlanacaktır.

Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

- Kamu personelinin bilgi ve iletişim teknolojileri farkındalığı ve yetkinliği geliştirilecektir.

Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması

- Başta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecektir.

e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi

- Kamu hizmetleri; iş süreçleri, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlanarak ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanılarak, etkin, şeffaf, sürekli, güvenilir, tek kapıdan ve farklı platformlardan bütünlük şeklinde sunulacaktır.

Yatırım Hizmetleri Alanında:

Vizyonumuz, görev alanımız içindeki insanlarımızın sosyal ve ekonomik hayatlarını gelişmiş ülkeler standartlarına ulaştırmaktır. Bunu yapabilmek için ise, kurumsal olarak; imar hizmetlerinde, tarım, eğitim, sağlık ve spor altyapı, çevre alanlarında birçok yatırım gerçekleştirmektedir. Yapılan bu yatırım hizmetlerinde temel politikamız; insanlarımızın temel ihtiyaçları olan eğitim, sağlık, imar alanlarındaki ihtiyaçlarını birinci derecede karşılamak ve geliştirmektir. Bununla birlikte toplumun ekonomik düzeyini yükseltme amacıyla görev alanımız içerisinde yer alan tarımsal altyapıyı geliştirmek ve tarımsal üretimi artırıcı hizmetlerde bulunmaktadır. Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesindeki temel politikamız, modern kamu yatırım stratejisini yakalamaktır. Modern kamu stratejisi yatırımların belirleme aşamasından, gerçekleştirme aşamasına kadar bilimsel ve kurumsal etkinliği gerektirmektedir. Kurum yatırımların gerçekleştirmesinde; yatırımların belirlenmesinde bilimsel ve sosyal metotların kullanıldığı etkin bir yapı oluşturulacak, işler özel sektör tarafından yapılarak kamunun ağırlığı bertaraf edilecek ve etkin bir kontrol sistemi oluşturacaktır. Şu halde Kurum, vizyonu doğrultusunda strateji belirleyen ve bu stratejiler için projeler ortaya koyan ve bu projelerin yapımı için kontrolörlük hizmeti veren bir yapıya kavuşturulacaktır. Bütün bu değerlendirmeler ışığında yatırım hizmetlerinde önümüzdeki dönem için önceliklerimiz;

- Çalışma alanımızda, temel hak olan hizmetlerden (eğitim, sağlık, yol, su, kanalizasyon vb) faydalanamayan insan bırakılmayacaktır.
- Eğitim, sağlık ve imar hizmetlerinde kaliteyi artırıcı, gelişmiş ülke standartlarına yaklaştıracı faaliyetlerde bulunulacaktır.
- Mevcut su kullanım kapasitesinin artırılması için gölet vb su depolama yatırımlarına önem verilecektir.
- Sulanabilir alanlarda öncelikle kapalı sulama tesisleri olmak üzere, yeni sulama tesisleri inşa edilecektir.
- Toplulaştırma çalışmalarında devam eden işler tamamlanacaktır.
- İlimiz ekonomisine en önemli katkıyı sağlayan, meyve ve sebze tarımını geliştirmeye yönelik, yayım ve AR-Ge faaliyetleri Kurumumuz tarafından desteklenecektir.
- Projelerin değerlendirilmesinde, modern sosyal ve ekonomik değerlendirme metotları ortaya konmasına ve tüm projelerde bu metotların kullanımına geçilmesi yönünde çalışmalar başlatılacaktır.

Yatırım Hizmetleri Alanında:

Önceliklerimiz, 9.Kalkınma Planının (2007-2013) Gelişme Eksenleri Başlığı altında şu eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar:

Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması

- Kırsal kesimde merkezi yerleşim birimleri öncelikli olmak üzere, temel altyapı ihtiyaçları karşılanacaktır. Ekonomik ve sosyal gelişmeye yönelik proje ve destekler ile eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunumunda bu merkezi birimlere öncelik verilecektir.

Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi

- Su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların, öncelikle havza temelinde bütüncül bir yaklaşımla ve değişen tüketim taleplerini karşılamakta esneklik sağlayan bir şekilde planlamasını mümkün kılacak, ilgili kurumlar arasında güçlü ve yapısal bir eşgüdüm sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş kapsamlı bir mekanizma çerçevesinde ve suyun tasarruflu kullanımı sayesinde su kaynaklarının etkin kullanımına önem ve öncelik verilecektir.
- Tarımsal üretimin rekabet gücüne doğrudan katkıda bulunacak şekilde; yüksek üretim değeri bulunan tarım ürünleri üretiminin artırılması amacıyla maliyet etkin bir biçimde sulama yatırımları ve tarım işletmelerinde gözlenen arazi parçalılığı sorununun hafifletilmesine yönelik olarak toplulaştırma yatırımları yaygınlaştırılacaktır.
- Tarım sektöründe, kamu kurumlarınca yapılan Ar-Ge çalışmalarının ilgili kurumların faaliyetlerini destekleyici olması sağlanacaktır.

Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi

- Kalabalık sınıf mevcutları düşürülecek, ikili eğitim uygulaması azaltılacaktır. Her kademedeki eğitim tesislerinin etkin kullanılabilmesi için standartlar ve ortak kullanım imkanları geliştirilecektir. Okulların bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı, eğitim yazılımları öncelikli olmak üzere güçlendirilecek, yenilenen müfredatın gerektirdiği ortamlar ve donanım sağlanacaktır.

Çevre Hizmetleri Alanında:

Vizyonumuz, insanlarımıza doğal kaynakların korunup, geliştirildiği bir ortamı oluşturmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu konudaki politikamız, yapılacak yatırımlarda çevre faktörünü en önemli unsur haline getirmektir. Çünkü çevre ile ilgili yapılacak bir hatanın, telafisi güç olmakta ve problem gelecek nesilleri de etkilemektedir. Kurumumuz bu bağlamda, yapacağı tüm projelerde küresel ısınma, erozyon, çevre sağlığı ve doğal hayatın korunması konularında aktif bir yaklaşım sergileyecektir. Bu konudaki önceliklerimiz:

- Yapılacak tarımsal altyapı hizmetlerinde, küresel ısınma ve susuzluk tehlikesine duyarlı olarak, mümkün olan her yerde maksimum su tasarrufunun sağlanacağı damla sulama sistemleri tesis edilecektir.
- Su tasarrufu sağlamak amacıyla, açık sulama sistemleri yerine, toprak altı borulu sistemler tercih edilecektir.
- Erozyon tehlikesi dikkate alınarak, yapılacak sulama yatırımlarında, arazilerin eğimi 1.derecede önem arz edecektir. Erozyona sebep olacak eğimlerde, alternatif tarım sistemlerine yönelik uygulamalar teşvik edilecek ve damla sulama sistemi tesisi edilecektir.
- Yapılacak kanalizasyon yatırımlarında mutlaka doğal arıtma sistemi inşa edilecektir.

Yapılacak imar ve yol yatırımlarında, doğal çevrenin korunması dikkate alınacak ve bu amaçla yapılacak projelendirmelerde, doğal çevre konusu mutlaka irdelenecektir.

Önceliklerimiz, 9.Kalkınma Planının (2007-2013) Gelişme Eksenleri Başlığı altında şu eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar:

Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi

- Su, atık su, katı atık gibi çevre korumaya yönelik altyapı tesislerinin yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde ülke şartlarına en uygun sistem ve teknolojiler tercih edilecektir.
- Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması sağlanacak ve atık suların arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması teşvik edilecektir.
- Mevcut su sağlama tesislerinde kayıp ve kaçaklar azaltılarak ülke su kaynaklarının etkin kullanılması sağlanacaktır.

Sosyal Hizmetler Alanında:

Politikamız; ekonomik düzeyi yeterli olmayan insanları üretici konumuna getirmeye katkıda bulunmak ve onların ekonomik faaliyetlerini desteklemektir. Ayrıca, sosyal hizmetlere yönelik olarak, gençlerimizi sportif faaliyetlerinde desteklemek ve onları zararlı alışkanlıklardan korumak temel politikamızı oluşturmaktadır. Bu politikadaki önceliklerimiz:

- Ekonomik durumu yeterli olmayan insanların, üretime katılmalarını sağlamak amacıyla çeşitli finansal sistemler (mikro kredi, yardım vb) ile destek sağlanacaktır.
- İlimizde amatör spor yapılacak altyapının geliştirilmesi için katkıda bulunulacaktır.
- Amatör sporcularımızın başarısının artırılması ve gençleri spora yönlendirmek amaçlı olarak, her türlü destek sağlanacaktır.

Önceliklerimiz, 9.Kalkınma Planının (2007-2013) Gelişme Eksenleri Başlığı altında şu eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar:

Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin

Artırılması

- Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetleri desteklenecektir.

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2010 YILI
FAALİYET RAPORU**

**III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ
VE DEĞERLENDİRMELER**


A – MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2010 YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ (Ekonomik 4.Düzey Sınıflandırma)

KOD	AÇIKLAMA	BÜTÇE ODENEGİ
01	VERGİ GELİRLERİ	150,004.00
6 9 60	Yapı Kullanma İzin Harcı	150,004.00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1,100,036.00
1 1 01	Şartname, Basılı Kağıt, Form Satış Gel.	350,000.00
6 1 01	Lojman Kira Gelirleri	120,000.00
6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	350,036.00
6 2 01	Taşınır Kira Gelirleri	30,000.00
9 9 99	Diğer, Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	250,000.00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	32.00
1 0 00	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımları	6.00
2 0 00	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Yardım ve Bağışlar	5.00
3 0 00	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	6.00
4 0 00	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	4.00
5 0 00	Proje Yardımları	11.00
05	DİĞER GELİRLER	30,749,904.00
1 9 03	Mevduat Faizleri	2,800,000.00
2 2 51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay	27,500,000.00
2 9 99	Diğer Paylar	350,000.00
3 2 99	Diğer İdari Para Cezaları	60,000.00
3 4 01	Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zammı	14,904.00
9 1 01	Diğer Çeşitli Gelirler	25,000.00
06	SERMAYE GELİRLERİ	8,000,014.00
1 3 01	Taşınmaz Satış Gelirleri	1.00
1 4 1	Arazi Satışı	1.00
1 9 99	Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	8,000,000.00
2 1 01	Taşınır Satış Gelirleri	1.00
2 2 1	Taşıt Satış Gelirleri	1.00
3 0 00	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	9.00
9 0 00	Diğer Sermaye Satış Gelirleri	1.00
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	10.00
1 0 00	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	10.00
	TOPLAM	40,000,000.00


2010 YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ
(Ekonomik 4.Düzey Sınıflandırma) DAĞILIMI
(%)



- VERGİ GELİRLERİ
- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
- DİĞER GELİRLER
- SERMAYE GELİRLERİ



2010 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ (I. Düzey Ekonomik Sınıflandırma)

KOD	AÇIKLAMA	2010 TAHMİN
01	Personel Giderleri	3,679,478.00
02	S.G.K. Devlet Prim Giderleri	501,420.00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11,615,987.00
04	Faiz Giderleri	1.00
05	Cari Transferler	3,584,515.00
06	Sermaye Giderleri	18,977,953.00
07	Sermaye Transferleri	1,006,650.00
08	Borç Verme	120,000.00
09	Yedek Ödenekler	513,996.00
TOPLAM		40,000,000.00





2010 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİRİ (Karşılaştırmalı) (1.Düzye)

KOD	AÇIKLAMA	2009 GERÇEKLEŞEN	2010 TAHİMİNİ	2010 GERÇEKLEŞEN
01	Vergi Gelirleri	43,837.89	150,004.00	35,244.50
02	Sosyal Güvenlik Geliri	414.35	-	203.21
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,025,589.15	1,100,036.00	1,609,661.82
04	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gel.	58,152,667.01	32.00	74,115,015.53
05	Diğer Gelirler	25,226,493.02	30,749,904.00	30,189,824.93
06	Sermaye Gelirleri	15,316.31	8,000,014.00	4,705,100.00
08	Alacaklardan Tahsilat	30,000.00	10.00	-
09	Red ve İadeler	-	-	-
TOPLAM		84,494,317.73	40,000,000.00	110,655,049.99
ÖZGELİR TOPLAMI		26,341,650.72	40,000,000.00	36,540,034.46

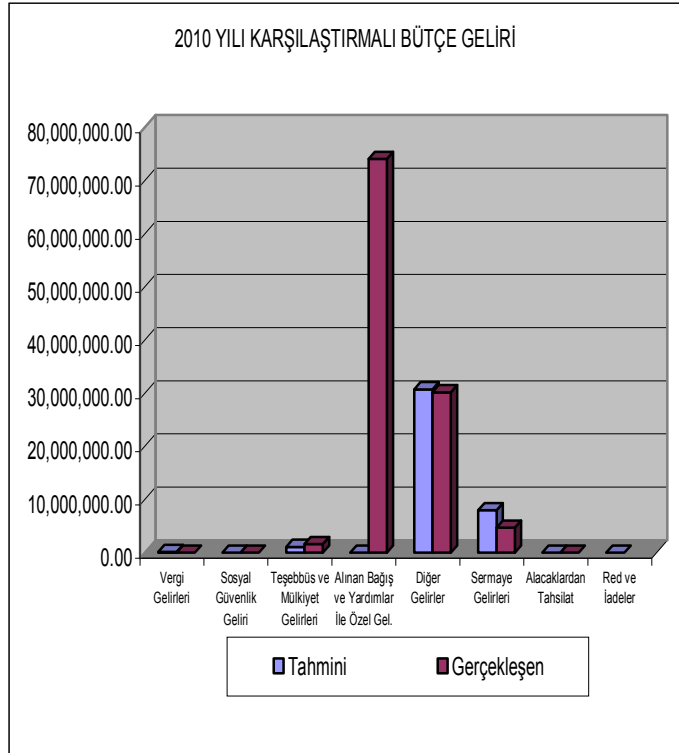

2010 YILI KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE GİDERİ

KOD	AÇIKLAMA	TAHİMİNİ	GERÇEKLEŞEN
01	Personel Giderleri	3,679,478.00	23,781,240.33
02	S.G.K. Devlet Prim Gideri	501,420.00	3,953,194.09
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	11,615,987.00	18,500,880.82
04	Faiz Giderleri	1.00	930,138.03
05	Cari Transferler	3,584,515.00	3,457,972.78
06	Sermaye Giderleri	18,977,953.00	51,887,996.92
07	Sermaye Transferleri	1,006,650.00	1,146,576.07
08	Borç Verme	120,000.00	120,000.00
09	Yedek Ödenekler	513,996.00	
	TOPLAM ÖDENEK	40,000,000.00	103,777,999.04

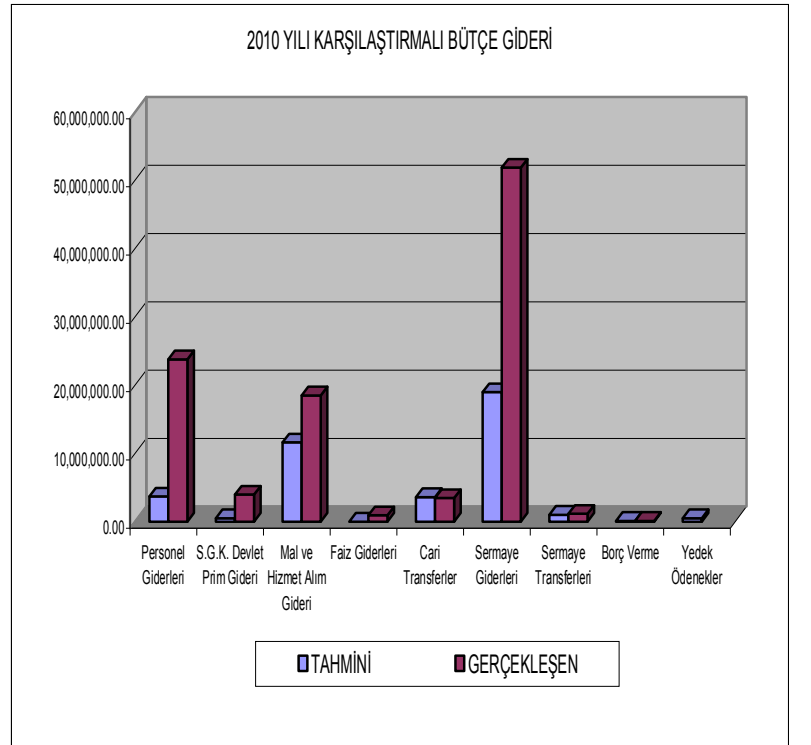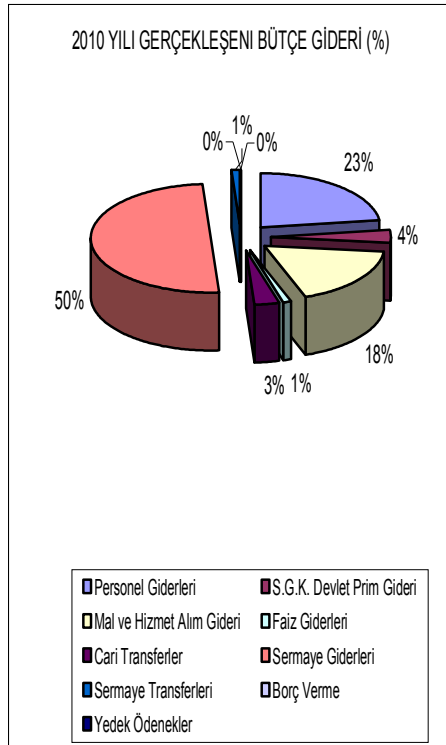

2010 YILI TOPLAMÖDENEKİCİMALI

KURUM	2009 Yılı Giderleri	2009 Yılı Devri	2010 Yılı Bütçesi	2010 Yılı Giderleri	2010 Yılı Devreden
Kültür ve Sosyal İşler Mİ	200,674.19	-	435,000.00	224,784.69	
Mali Hizmetler Mİ	21,439,246.25	11,763,666.61	5,739,819.00	21,734,386.07	21,971,725.40
İnsan Kaynakları Mİ	21,235,653.89	-	3,425,862.00	23,185,849.13	
Tanımsal Hiz. Mİ	2,883,941.79	-	5,673,010.00	7,212,210.51	2,013,687.35
Yapı Kontrol Mİ	1,221,230.24	-	3,322,965.00	2,677,610.99	592,173.17
Yazı İşleri Mİ	22,217.45	-	55,504.00	17,468.74	
Destek Hiz. Mİ	9,380,731.31	3,051,339.41	9,250,009.00	11,551,171.06	4,189,536.53
Yd Ulaşım Hiz. Mİ	2,093,686.76	-	15,330,000.00	13,155,882.55	1,558,364.49
İşletme ve İştirak Mİ	1,635,476.50	-	2,269,895.00	2,061,129.65	90,000.00
Plan Prj. Yat. ve İş. Mİ	13,225,743.53	2,543,999.24	6,916,003.00	9,277,575.27	9,293,543.50
Encümen Mİ	1,523,950.03	-	1,073,910.00	882,446.98	
Ruhsat ve Den. Mİ	67,013.06	-	90,000.00	850.00	29,150.00
Hukuk İşleri	26,179.97	-	110,000.00	74,583.59	
Almus İ.Ö. Mİ	645,665.82	8,149.32	110,397.00	708,099.65	36,358.43
Artova İ.Ö. Mİ	363,181.23	5,012.63	115,272.00	458,589.39	25,204.14
Başçıflık İ.Ö. Mİ	269,057.67	-	126,476.00	246,405.43	433.50
Ertaa İ.Ö. Mİ	1,683,768.99	38,910.38	128,854.00	1,923,340.08	16,243.61
Niksar İ.Ö. Mİ	1,466,196.53	7,505.45	115,475.00	1,838,944.43	31,049.61
Pazar İ.Ö. Mİ	430,183.92	23,030.94	105,947.00	573,672.36	7,189.15
Reşadiye İ.Ö. Mİ	1,327,121.02	20,885.15	119,064.00	1,588,777.21	7,704.32
Sulusaray İ.Ö. Mİ	346,745.33	28,738.05	107,622.00	429,112.95	12,385.91
Tutlal İ.Ö. Mİ	1,255,299.21	57,363.24	122,972.00	1,462,016.25	12,517.40
Yeşilyurt İ.Ö. Mİ	292,137.22	9,062.14	130,972.00	350,953.26	12,378.67
Zile İ.Ö. Mİ	1,864,791.96	37,009.57	124,972.00	2,142,138.80	214,378.49
TOPLAM	84,899,893.87	17,594,672.13	55,000,000.00	103,777,999.04	40,114,023.67

Ndt: 2010 Yılı bütçesine, 15000000 TL borçlarına dahil edilmiştir.

2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

GİDER BÜTÇESİ

2010 Yılı tahmini bütçesi 40,000,000.00-TL. olup, Devlet Yardımları tahmin edilemediğinden 2010 yılı tahmini bütçesinde finansman tipi 8 (sekiz) olan giderler tahmin edilememiştir.

2010 Mali Yılı sonu itibariyle;

01 Personel Giderleri	23,781,240.33 TL
02 S.G.K. Devlet Primi Giderleri	3,953,194.09 TL
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18,500,880.82 TL
04 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	930,138.03 TL
05 Cari Transferler	3,457,972.78 TL
06 Sermaye Giderleri	51,887,996.92 TL
07 Sermaye Transferleri	1,146,576.07 TL
08 Borç Verme	120,000.00 TL

olmak üzere toplam 103,777,999.04 TL gider gerçekleşmiştir. Bu giderin 46,947,159.74 TL' si öz gelirlerden, 56,828,839.30 TL' si ise devlet yardımlarından karşılanmıştır.

Personel Giderleri;

2010 Mali Yılı Personel Giderleri 23,781,240.33 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu giderin 3,681,995.00 TL' si öz gelirlerden, 20,099,245.33 TL'si ise devlet yardımlarından karşılanmış olup, toplam giderler içerisindeki oranı % 22.92'ye tekabül etmektedir.

S.G.K. Devlet Primi Gideri;

2010 Mali Yılı S.G.K. Devlet Primi Giderleri 3,953,194.09 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu giderin 610,568.00 TL'si öz gelirlerden, 3,342,626.99 TL' si ise devlet yardımlarından karşılanmış olup, toplam giderler içerisindeki oranı % 3.81'e tekabül etmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri;

2010 Mali Yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 18,500,880.82 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu giderin 8,554,806.00 TL' si öz gelirlerden, 9,946,074.82 TL' si ise devlet yardımlarından karşılanmış olup, toplam giderler içerisindeki oranı % 17.83'e tekabül etmektedir.

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri aşağıda gösterilmiştir.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7,861,906.91 TL
Yolluklar	484,782.99 TL
Görev Giderleri	212,957.39 TL
Hizmet Alımları	6,820,077.39 TL
Temsil ve Tanıtma Giderleri	244,653.28 TL
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri	1,538,804.77 TL
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1,309,992.73 TL
Tedavi ve Cenaze Giderleri	27,705.36 TL

Diğer İç Borç Faiz Giderleri;

2010 Mali Yılında, Halk Bankasından kullanılan krediye ait borçlanma gideri, 930,138.03 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu giderin tamamı öz gelirlerden karşılanmıştır.

Cari Transferler;

2010 Mali Yılı Cari Transferleri 3,457,972.78 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu giderin 3,148,556.00 TL'si öz gelirlerden, 309,416.78 TL'si bakanlık yardımlarından karşılanmış olup, oranı % 3.33'e tekabül etmektedir. Cari Transferler aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

FONKSİYONEL KOD	FİNANS KODU	EKONOMİK	AÇIKLAMA	TUTAR
01.6	5	05.1.2.05	Sosyal Güvenlik Kurumuna	24,100.00
01.6	5	05.2.5.03	Köylere	1,317,530.56
01.6	5	05.2.5.04	Mahalli İdare Birliklerine	765,416.47
01.6	5	05.3.1.01	Dernek, Birlik Kur.Kuruluş	217,682.75
01.6	5	05.3.1.05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	100,000.00
01.6	5	05.4.7.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	-
01.6	5	05.8.9.51	İller Bankasına Verilen Paylar	1,033,243.00
TOPLAM				3,457,972.78

Sermaye Giderleri;

2010 Mali Yılı Sermaye Giderleri 51,887,996.92 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu Giderin 28,754,519.92 TL'si öz gelirlerden, 23,133,478.07 TL'si bakanlık yardımlarından karşılanmış olup, toplam giderler içerisindeki oranı % 50.00'ye tekabül etmektedir. Sermaye Giderleri aşağıda gösterilmiştir.

Mamul Mal Alımları	6,559,573.00 TL
Gayri Maddi Hak Alımları	3,988.40 TL
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	118,000.00 TL
Menkul Malların Bakım Onarım Gideri	5,540.00 TL
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	36,174,975.19 TL
Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri	9,025,920.24 TL

Sermaye Transferleri;

2010 Mali Yılı Sermaye Transferleri 1,146,576.07 TL olarak gerçekleştirilmiştir. Bu giderin tamamı öz gelirlerden karşılanmış olup, toplam giderler içerisindeki oran %1.10'a tekabül etmektedir. Sermaye Transferleri aşağıda gösterilmiştir.

Yurtiçi Sermaye Transferleri	606,648.00 TL
Yurtdışı Sermaye Transferleri	539,928.07 TL

Borç Verme;

2010 Mali Yılı bütçesinin borç verme giderleri bölümüne mikro kredi için 120,000.00 TL ödenek konulması uygun görülmüştür. Toplam giderler içerisindeki oranı % 0.12'ye tekabül etmektedir.

B – PERFORMANS BİLGİLERİ

1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Tokat İl Özel İdaresi faaliyetlerini, 2009–2013 Stratejik Planına göre hazırlanan 2010 Yılı Performans Programında;

- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
- Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri
- Tarımsal Hizmetler
- Ruhsat ve Denetim Hizmetleri
- Sağlık Hizmetleri
- Kültür ve Turizm Hizmetleri
- Ağaçlandırma, Çevre Koruma ve Dinlenme Hizmetleri
- Sosyal Hizmetler
- Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri

ana başlıkları halinde belirlemiştir. Buna göre;

İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri:

- **İçme suyu tesislerinde iyileştirme ve bakım onarım çalışmaları yapılması.**

İlimizde içme suyu getirilmemiş köy bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı köylerimizde içme suyu yetersizliği bulunmaktadır. İçme suyu yetersizliği özellikle son yıllarda kuraklığın etkisi ile artış göstermiştir. Bununla birlikte, su kullanımında tasarruflu davranmama da önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Kurumumuz, su kullanımındaki tasarrufu da dikkate alarak, gerçekte su ihtiyacı bulunan yerlerin su ihtiyacını karşılama amaçlı olarak, sondaj yoluyla su elde etme yoluna gidecektir. Kurumun içme suyu teminindeki birinci derecede tercihi yüzey sularıdır. Bunun sağlanamadığı yerlerde, yer altı suyuna başvurulmaktadır.

Bir diğer faaliyet konusunu ise köylerdeki su şebekelerinin ve elektro motopomp tesislerinin bakım ve onarımı oluşturmaktadır. Her yıl önemli bir miktardaki köyün bu yöndeki ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu tip projelerin amacı, sulama şebekelerinin ve elektro motopomp tesislerinin genel bir bakımdan geçirilerek, düzgün çalışan ve su israfı yapmayan sulama şebekesine sahip olmaktır. Ayrıca iyi çalışmayan bir sistemde çok sayıda meydana gelebilecek ufak arızaların önüne geçerek iş, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktır.

- **İçme suyu kalitesinin artırılması amacıyla, içme suyu depolarına tam otomatik klorlama cihazının tesis edilmesi.**

Köylerimizdeki içme suyu tesislerinde kullanılan sular, içme suyu analizi neticesinde kullanılabilir olarak tespit edildiği takdirde herhangi bir işleme tabi tutulmadan direk olarak sisteme verilmektedir. Kurum stratejisi, yerleşim birimlerine sağlıklı bir içme suyu sağlamayı hedef olarak göstermektedir. Bu hedef doğrultusunda, mevcut suların içim kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir içme suyu sağlamak amacıyla, kurumumuz tarafından klorlama cihazlarının içme suyu sistemlerine eklenmesine yönelik proje ortaya konmuştur. Klorlama cihazları tam otomatik olacak ve su depolarına monte edileceklerdir. Cihazların tam otomatik olarak tercih edilmelerinin sebebi, cihazların kullanım kolaylığına sahip olmasıdır. Böylece etkin bir klorlama işlemi yürütülebilecektir.

- **Kanalizasyon tesisi bulunmayan yerleşim birimlerine yeni kanalizasyon tesisi yapılması.**

Kurum son yıllarda kanalizasyon yapımına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Kanalizasyonu toplum sağlığı ve şehirleşme açısından önemli bir unsur olarak değerlendirmektedir. Bu amaca yönelik olarak, stratejik plandaki hedefini 2012 yılı sonuna kadar, köylerin % 95'inin kanalizasyonunu tamamlamak olarak belirlemiştir. Kurum uygulamayı gerçekleştirirken, yapım hizmeti satın almakta ve de köy halkından işgücü konusunda yardım almaktadır. Kurumun bundan sonraki uygulama stratejisi, yapım işleminde müteahhitlik hizmetlerinden faydalanma yönündedir.

- **Mevcut kanalizasyon tesislerinde iyileştirme ve bakım onarım çalışmaları yapılması.**

Kanalizasyon tesislerinde zamanla yıpranmalar ve yerleşim yerlerinin büyümesi ile kanalizasyon tesislerine eklemeler yapılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaçlar, her yıl belli bir program dâhilinde giderilmektedir. Bu program yılı içerisinde Kurum tarafından kanalizasyon tesislerinde iyileştirme ve bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır. Bu konudaki stratejik hedef, bakım onarımı % 10'lar seviyesinde tutabilmektir. Kurum bunu gerçekleştirebilmek için, tesislerin yapımında daha kaliteli malzeme kullanımına yönelme amacındadır.

- **Yol yapım ve düzenleme çalışmaları.**

Kurum stratejimiz; bütün köy yollarımızı çağdaş standartlara getirebilmektir. Bu amaca ulaşılabilmesi için, son yıllarda KÖYDES programı ile birlikte önemli hizmetler gerçekleştirilmektedir. Yol yapım ve düzenleme çalışmaları 6 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar:

- ❖ Yeni yol açma (tesviye)
- ❖ Ham yollarda stabilize kaplama
- ❖ I.kat asfalt kaplama yapımı
- ❖ II.kat asfalt kaplama yapımı
- ❖ Yol sanat yapıları yapımı
- ❖ Yol trafik işaret levhalarının yerleştirilmesi olarak yer almaktadır.

Yol yapım faaliyetleri, 2005-2008 döneminde yoğun olarak, KÖYDES programı kapsamında gerçekleştirilmiştir. 2008 yılından itibaren, Kurum tarafından yol yapım faaliyetlerine ayrılan kaynak tekrar artırılmıştır. Kurum daha çok köy grup yollarının standardını artırma yönünde çalışma yapmayı planlamaktadır. Standardının yükseltilmesi ibaresi içerisinde her türlü yol yapım faaliyeti yer alabilmektedir. Yol yapım faaliyetleri genel olarak kurum iş makineleri ile karşılanmaktadır.

Kurumumuz yol yapım düzeyi açısından çok önemli ilerlemeler sağlamış olup, köylerin merkezlerinin şehirle olan bağlantı yollarını tamamlamıştır. Bu açıdan bakıldığında, yeni yol ihtiyacı kalmamıştır. Bununla birlikte, köy mahalleleri ve köyler arasında kısa yol bağlantıları talep edilmektedir. Yol ihtiyacının toplumlararası diyalogdaki önemi dikkate alınarak, bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla yeni yol yapımına gidilmektedir. Bununla birlikte yol çalışmalarında esas yatırımı, çağdaş yol standardına ulaşılması amacıyla asfaltlama oluşturmaktadır.

- **Yol güzergâhlarında emniyet sağlanması için trafik levhalarının yerleştirilmesi.**

Kırsal kesim yollarında, trafik levhaları çok az bulunmakta veya hiç bulunmamaktadır. Bu gelişmekte olan bir ülke için eksikliklerdir. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla köy yollarına trafik levhası konulması işlemine, 2008 yılı programında başlamıştır. Bu çalışma devam edecek olup, 2013 yılı sonuna kadar ihtiyacın genel olarak karşılanması hedeflenmektedir.

- **Köy içi imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, köy içi yol yapımı vb.) yapımı.**

Köylerimizin, yaşanabilir yerler haline getirilebilmesi, yapılacak köy içi imar hizmetleri ile mümkün olabilecektir. Bununla birlikte, bu tür yatırımların daha hızlı ve etkin olabilmesi, yerel kuruluşların devreye sokulması ile mümkündür. Bunun için küçük çaplı köy içi imar hizmetleri; ilçe özel idareleri, mahalli idare birlikleri ve muhtarlıklar vasıtasıyla yapılmaktadır.

Eğitim, Gençlik ve Spor:

- **İlk ve orta öğretimde derslik ihtiyacının karşılanması:**

Eğitimde okullaşma oranında önemli ilerlemeler sağlanmış ve ilk ve orta öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 25'in altına inmiştir. Bununla birlikte özellikle il ve ilçe merkezlerinde yoğunlaşmalar olmakta ve derslik ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu konudaki stratejik hedef şehir merkezlerinde olan bu yoğunlaşmayı da azaltarak tüm okullarda derslik başına düşen öğrenci sayısını 30'un altına düşürmektir. İlköğretim ve ortaöğretime yönelik olarak yapılacak ihtiyaçlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanmaktadır. Kurumumuz, bu plan ve programlar doğrultusunda uygulamayı gerçekleştirmektedir. Eğitimi, toplumun kalkınmasında en önemli unsur olarak gören Kurumumuz, bu konuda üzerine düşen görevi yapmakta ve önemli bir miktar kaynağı buraya ayırmaktadır. Dersliklerin yapımı hizmet alım yolu ile gerçekleştirilmektedir.

- **Okul öncesi eğitim ihtiyacına yönelik olarak derslik yapılması.**

Okul öncesi eğitim 36–60 ay ile 60–72 ay yaş grubu eğitimi olarak ikiye ayrılmaktadır. 2009–2013 Stratejik Plan hedefi okullaşma oranı olarak belirlenmiştir. Buna göre 36–60 ay yaş grubu için % 25, 60–72 ay yaş grubu için ise % 75'dir. Bu hedef doğrultusunda derslik yapımı

planlanmıştır. Son yıllarda okul öncesi eğitime verilen değer, Kurumumuzca da dikkate alınarak gereken katkı sağlanacaktır. Dersliklerin yapımı hizmet alım yolu ile gerçekleştirilmektedir.

- **Okullara bakım onarım ve çevre düzenleme yapılması:**

Modern bir eğitim altyapısına kavuşmayı amaçlayan ilimizde, bu yöndeki çalışmalar hızla devam etmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün programı kapsamında çalışmalar devam etmekte, Kurumumuz da bu konuda gerekli katkıyı yapmaktadır.

- **Küçük tip kapalı spor salonu yapılması.**

İlk ve orta öğretimde kullanıma yönelik küçük tip kapalı spor salonu yapılması, İl Mili Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yürütülecektir. Sporcu yetiştirmede erken yaşlarda yapılacak eğitimin önemi dikkate alındığında, yapılacak bu faaliyetin çok önemli bir işlevi olacağı görülmektedir. Bu konudaki ihtiyaç 13 adet kapalı spor salonu olarak belirlenmiştir. 2009–2013 Stratejik Planlama sürecinde yılda 1 adet olmak üzere toplamda 5 adet spor salonu yapımı planlanmıştır. Bu faaliyetin gerçekleşmesi Bakanlık Bütçesinden ayrılacak finansman ile mümkün olabilecektir.

- **Spor tesisi yapımı:**

Kurumumuz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün talepleri doğrultusunda çeşitli spor tesisleri yapımına destek sağlamaktadır.

- **Spor tesislerin yıllık bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi:**

Spora ve amatör sporculara destek sağlama anlayışı içerisinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün belirlediği spor tesisleri bakım onarımı için gerekli destek her yıl sağlanmaktadır. Spor aktivitelerinin düzenli bir şekilde sürdürülmesi ve amatör sporcularımızın desteklenmesi amacıyla yapılan bu hizmet, Kurumumuz tarafından bu yılki program döneminde de devam ettirilmiştir.

- **Spor merkezlerin sportif malzeme ihtiyacının karşılanması.**

Amatör spora destek kapsamı içerisinde; amatör sporcuların spor malzemesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak gerekli destek kurumumuzca sağlanacaktır.

Tarımsal Hizmetler:

- **Tarımsal ve hayvansal üretimi geliştirme amaçlı projelere destek sağlanması:**

Tokat ili tarımsal potansiyeli yüksek olan illerimizden birisidir. Özellikle meyve ve sebzeçilikte son yıllarda üretimini artırmış ve adını tüm Türkiye’de duyurmuştur. Bu yöndeki etkinliğinin artırılması ve daha çok ekonomik katkının Tokat tarımına sağlanması Kurum amaçları içerisinde yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda; meyve ve sebze üretim alanlarının artırılması yönündeki uygulama ve AR-GE çalışmalarına destek sağlanacaktır. Bu konudaki faaliyetler Tarım İl Müdürlüğü ile GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yürütülecektir.

- **Tarımsal ve hayvansal üretim birliklerine olan üye sayısının artması için desteklemek:**

Her yapılan ekonomik faaliyette olduğu gibi, tarımda da güçlü olabilmenin yolu birlikte hareket edebilmekten geçmektedir. Pazarlama her ekonomik faaliyetin en önemli aşamasıdır. İyi yapılamadığı takdirde, ekonomik faaliyetin sonlanmasına dahi sebep olmaktadır. Pazarlama, ekonomik faaliyet devam ettiği müddetçe önemini koruyacaktır. Tarımda en önemli problem olarak pazarlama yer almaktadır ve hala da önemini devam ettirmektedir. Özellikle tarımda eğitim seviyesinin düşüklüğü bu önemi daha da artırmakta ve birlik olmanın gerekliliğini artırmaktadır. Bu amaca yönelik olarak son yıllarda uygulamaya geçen yasayla birlikte, üretici birlikleri kurulmaya başlamıştır. Bugün itibariyle, ilimizde 16 adet üretici ve 3 adet yetiştirici birliği bulunmaktadır. Fakat burada önemli bir nokta, birliğin güçlü olması, daha doğrusu üyelerinin çok olması gerekliliğidir. Birlikte hareket edilebildiği takdirde, fiyat konusunda pazarlık gücü artacaktır. Yapılacak bu destek ile birliğin, kurumlaşma aşamasında güçlü olmasına ve üye sayısının artırılmasına katkı sağlanacaktır. Birlikler, zamanla gücünü ve üye sayısını artırarak, kendi ayakları üzerinde durabilecektir. Kurumumuz üretici birliklerine olan desteğe olumlu bakmaktadır ve bu konuda gerekli katkıyı sağlayacaktır. Bu destek Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonunda sağlanacaktır.

- **İnsan ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik projeler:**

Bu konu başlığı altında şu projelere yer verilmektedir. Bunlar:

- ❖ Hayvan ahırlarının modernleştirilmesi projesi,
- ❖ Hayvan aşılama ve ekinokok projesi,
- ❖ Kene ve kuş gribi ile mücadele projesi,
- ❖ Yabani domuz avlanması için av fişegi alımı,
- ❖ Büyükbaş hayvanların kayıt, tescil ve ilenmesi projesi.

Son yıllarda hayvan sağlığına yönelik problemlerin, insan sağlığını tehdit etmesi bu konuya vermemiz gereken önemi ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, kene ısırması ve kuş gribi vakaları, toplum sağlığını tehdit etmiştir ve hala da önemini korumaktadır. İlimiz her iki olayda da yer almaktadır. Hayvan ahırlarının modernleştirilmesi kapsamında ise, süt sağımına yönelik makineleşmeye önem verilmektedir. Böylece süt hijyeni konusunda da önemli gelişme sağlanacaktır.

İlimiz yabani domuz açısından çok zengindir. Yabani domuz çiftçilerin birçok ürününe zarar vermektedir. Bundan dolayı, domuz avına destek yapılması uzun yıllardır yapılan bir uygulamadır.

Tarım İl Müdürlüğünün önemli projelerinden birisi, hayvanların kayıt altına alınmasıdır. Hayvanların kayıt altına alınması, hayvan sağlığı ve verimliliğin artması açısından önemlidir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, belirlenen projelere önemleri dikkate alınarak destek sağlanacaktır. Destek, Tarım İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yapılacaktır.

- **Tarımsal laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi:**

Laboratuvar hizmetlerine yönelik projeler şu amaçları içermektedir:

- ❖ Laboratuvar hizmetlerinde kullanılan kimyasal malzeme alımı,
- ❖ Gıda katkı-kalıntı ve pestisit analizleri yapımına yönelik cihaz alımı,

Tarımsal laboratuvar hizmetleri tarımın gelişmesinde önemli yer tutmaktadır. Tarımsal verimlilikte toprakların analizi önemlidir. Çiftçilere yapılan analizde, maliyetin tümü yansıtılmamakta, maliyet sübvansede edilmektedir.

Bir diğer önemli konu, gıda katkı – kalıntı analizleri ve pestisit analizlerinin yapılmasıdır. Tokat ili tarımda çok önemli bir safhadadır. Meyve ve sebzecilikte gün geçtikçe ilerlemektedir. Bu ilerleme ile birlikte tarımda ilaç kullanımı da artmaktadır. Bu gıda sağlığı açısından tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Bunu belirlemek ve tedbir almak, hem bizim tüketicilerimiz ve hem de ihracat için önemlidir. Üretimi bu açıdan kontrol altına alabildiğimiz takdirde hem sağlıklı ürünler yetiştirilecek, hem de ihracat artacaktır. Dolayısıyla tarımda gelişme hızla devam edecektir. Bu proje ile yukarıda bahsedilen analizleri yapabilecek cihaz alımı gerçekleştirilecektir. Böylece, sebze ve meyveler insan sağlığı açısından risk arz eden katkı kalıntı açısından kontrol edilebilecektir.

Kurumumuz yukarıda belirtilen laboratuvar hizmetlerine gerekli desteği sağlayacaktır. Laboratuvara yönelik yapılacak bu hizmetler, ilimiz tarımının gelişmesini ve tarımsal ürünlerin pazarlanma gücünün artmasını sağlayacaktır. Toprak analizine yönelik çalışma Toprak ve Su

Kaynakları Araştırma Enstitüsü tarafından, cihaz alımı ise Tarım İl Müdürlüğü Tarım İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

- **Organik tarımın yaygınlaştırılması:**

Organik tarım tüm dünyada önemi artırmış ve artırmaya devam etmektedir. Tokat tarımı organik tarım açısından gerekli arazi, tarımsal uygulama ve iklimsel şartlara sahiptir. Türkiye genelinde de sağlıklı tarımsal ürünlerin yetiştirildiği yer olarak tanınmaktadır. Bu özelliklerimizi avantaja dönüştürmek ve tarımsal getiriyi artırmak mümkündür. Bu amaca hizmet etmek amacıyla organik tarım ürünleri yetiştirip, pazarlayabilmek için konu ile ilgili sertifikaya ihtiyaç bulunmaktadır. Kurumumuz Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonunda, organik tarım ürünleri yetiştiricisi sertifikası almak isteyen üreticilere, bu belgeyi alma yönünde gerekli desteği sağlayacaktır.

- **Toprak ve su kaynakları veri tabanının hazırlanması:**

Tarımsal üretim ve yatırım kararlarında, etkinliğin sağlanması o yörenin tarım ve su kaynaklarına ilişkin altyapının bilinmesine bağlıdır. Geçmişte hazırlanan bu tür veriler bulunmakla birlikte (toprak haritaları vb) çok eski kaynaklar ve de günümüz teknolojisi ile uyumlu bulunmaktadır. Günümüzde bu tür verilerin coğrafi bilgi sistemi ile uyumlu bir şekilde elektronik ortama atılması gerekmektedir. Stratejik planda yer alan bu hedef ile çok zaman alacak bir uğraşının içerisine girilecektir. Bu konuda Kurumumuz gerekli desteği sağlayacak ve kurumlar arasında gerekli ilişkiyi düzenlemeye gayret edecektir. Konunun sorumlusu Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsüdür.

- **Küçük ölçekli sulama göleti yapımı:**

İlimiz gölet yapımı açısından oldukça şanslı olup, 2009 yılı sonu itibariyle 46 adet sulama göletine sahiptir. Son yıllarda meydana gelen kuraklıklar, göletlerin sulamadaki önemini ortaya çıkarmıştır. Göletler, kışın yüzey ve sızıntı sularının depolandığı ve yazın kullanıldığı su depolama tesisleridir. Kurum stratejisi, bu tesislerin mümkün olduğu kadar artırılması yönündedir. Buna yönelik olarak da her yıl gölet yapımına hızla devam etmektedir. Sulama göletlerinin, proje ve uygulamaları, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Yapım işlemi hizmet alımı olarak gerçekleştirilmektedir.

- **Sulama suyu tesisi yapımı:**

Sulama suyu temini amacıyla yapılan projeler ve uygulamaları, Kurumun iki müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir. Bunlar Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüdür. Uygulamalar dışarıdan hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilmekte olup

Kurum tarafından yapı denetim hizmetleri yürütülmektedir. Sulama suyu temini projeleri üç şekilde ayrılabilir.

- 1) Sulama suyunun teminine göre;
 - ❖ Yerüstü suyu kaynaklı sulama tesisleri,
 - ❖ Yeraltı suyu kaynaklı sulama tesisleri,
- 2) Sulama suyunun araziye nakledişine göre;
 - ❖ Açık kanal sulama suyu tesisleri,
 - ❖ Kapalı sistem basınçsız sulama suyu tesisleri,
 - ❖ Kapalı sistem basınçlı sulama suyu tesisleri.
- 3) Sulama suyu temininde enerji kullanım durumuna göre;
 - ❖ Cazibe ile enerji gerektirmeden suyu temin edilen sulama suyu tesisleri,
 - ❖ Pompaj ile enerji harcanarak suyu temin edilen sulama suyu tesisleri.

Bu zamana kadar ilimizdeki projelerin ana yapısını yer üstü suyuna cazibe ile yapılan açık kanal sulama tesisleri oluşturmuştur. Hala da ağırlığını devam ettirmektedir. Fakat son yıllardaki kuraklık ile birlikte, bu sistem ciddi olarak tartışılmaktadır. Açık kanal sulama sisteminde su iletim kayıpları yüksek olmaktadır. Ayrıca yüzey sulamasının birçok dezavantajı bulunmaktadır. Bunlar: Sulamanın etkinliğinin düşük olması ve eğimli ortamlarda toprağa yaptığı erozyondur. Sistem, kullanım kolaylığı ve enerji ihtiyacı olmaması sebebiyle çiftçiler tarafından tercih edilmektedir.

Kurum tarafından uygulanan bir diğer proje tipi ise pompaj ile temin edilen sulama suyuna yapılan, açık kanal sulama suyu tesisleridir. Su kaynakları yerüstü veya yeraltından olabilmektedir. Daha çok yerüstü sulama sularına uygulama yapılmıştır. Bu tesislerde de yüzey sulamanın yukarıda belirtilen tüm olumsuzlukları mevcuttur. Buna ek olarak, suyun temininde de enerji kullanılmaktadır. Bu sistem, suyun cazibe ile elde edilemediği alanlarda uygulanmaktadır. Sistemde enerji maliyetinden dolayı olumsuzluklar yaşanmaktadır. İlimizde de birçok örneği mevcuttur.

Kurum tarafından önemliliği artırılan bir diğer proje tipi ise kapalı sistem sulama suyu tesisleridir. 2008 yılında Tarım Bakanlığı hibe programları desteği ile başlatılan çalışmalarda; 2008 yılında 2 adet, 2009 yılında da 2 adet ve 2010 yılında 3 adet olmak üzere toplam 7 adet projenin uygulamaya aktarılmıştır. Projeler yer altı suyu ve yer üstü suyuna uygulanabilmektedir. Özellikle yer altı suyundan elde edilen su kaynaklarına; Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği, kapalı sistem basınçlı sulama tesisi uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bununla birlikte, 2009 yılında yapılan, gölet kaynaklı basınçlı sulama suyu tesisi, yörede çok ilgi yaratmıştır. 2010 yılında da projelerin su kaynağını

göletler oluşturmıştır. Bundan sonra yapılacak, gölet kaynaklı sulama tesislerinin basınçlı sulama suyu tesisi olarak yapılmasını gündeme getirmiştir. Basınçlı tesisler, yörenin ürün yapısına göre yağmurlama veya damla sulama sistemi olarak tesis edilmektedir. Sistem, sulama etkinliğini artırmakta ve su kayıplarını minimuma indirmektedir. Sistemin ekipmana ihtiyaç hissettirmesi ve enerji masrafı olması, çiftçiler tarafından tercih edilmeme sebebi olarak ortaya çıkmaktadır.

Bir diğer sistem ise basınçsız kapalı sulama sistemleridir. Bu sistem ile su kapalı tesislerle iletilmekte fakat tarla içindeki sulama yüzey sulama olarak gerçekleştirilmektedir. Bu sistem bugüne kadar, komple bir sulama sistemi olarak ilimizde yapılmamıştır. Sistemin avantajı, su iletim kayıplarının açık kanala göre daha az olmasıdır. Bununla birlikte yüzey sulamanın tüm olumsuzluklarını üzerinde taşımaktadır.

Son yıllardaki kuraklık ile birlikte, sulama sistemlerinde açık kanal sulama sistemi azaltılmak istenmektedir. Bu yöne doğru bir eğilim mevcuttur. Fakat tesis masraflarının yüksekliği kapalı sistemlere olan geçişi geciktirmektedir. Özellikle dış kaynaklı projelerde basınçlı sulama sistemlerinin desteklenmesi, kapalı sisteme yönelik projelerin artmasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte, damla sulamanın avantajları çiftçiler tarafından kavranmıştır. Kurumumuzda damla sulama sistemine uygun alanlara, damla sulama tesisi inşa etme eğiliminde olup, bu yöndeki çalışmalarını önümüzdeki yıllarda gerçekleştirecektir.

- **Arazi toplulaştırma ve tarla İçi geliştirme hizmetleri yapımı:**

Toplulaştırma, tarımsal altyapı hizmetlerinin en önemli projesidir. Toplulaştırma çok parçalı ve düzensiz parsellerin bir araya getirilmesini kapsamaktadır. Toplulaştırma hizmetleri ile birlikte, tarla içi geliştirme hizmeti olarak isimlendirilen tesviye, drenaj, sulama gibi tarımsal altyapı hizmetleri de yerine getirilmektedir.

Tokat ili toplulaştırma hizmeti açısından, Türkiye’de en önde gelen illerden birisidir. Başarılı uygulamaları mevcuttur ve halen devam etmektedir. Fakat son yıllarda ödenek problemleri sebebiyle, sadece devam eden işlerin tamamlanmasına çalışılmaktadır. İlimizde toplulaştırmanın en yoğun yapıldığı yer Erbaa ilçesidir. % 95’e yakın tamamlanmıştır. Niksar ve Zile ovasında da toplulaştırma çalışmaları halen devam etmektedir. Kazova ve Çamlıbel ovalarında toplulaştırma henüz başlamamıştır. Bununla birlikte bu konuda hazırlanmış birçok proje beklemektedir.

Ruhsat ve Denetim Hizmetleri:

- **Gayri sıhhi ve sıhhi müesseselere ruhsat verilmesi ve denetleme yapılması:**

İl özel idarelerinde yapılan son düzenlemeler ile birlikte, Belediye mücavir alanları dışındaki tüm GSM ve sıhhi müesseselerin ruhsat ve denetim hizmetleri, Kurum tarafından yerine getirilmektedir. Daha çok yeni olmasına rağmen, önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu konuda hizmet kalitesinin ve kapasitesinin artırılması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

- **Maden, kum ocağı ve su ürünleri işletmelerine kiralama ve denetim yapılması:**

Yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklarının, üretime yönelik olarak kiralama ve denetim hizmetlerinden oluşmaktadır. Tokat ilinin çok zengin doğal kaynaklara sahip olması, bu yöndeki faaliyetlerin yoğunluğunu artırmaktadır. Özellikle kum ocağı için ruhsatlandırılabilir bölgelerde, çevresel faktörlere azami dikkat edilecektir. Bu konuda alternatif yaklaşımlar (kıрма taş ocakları gibi) desteklenecektir.

- **Harita imar hizmetlerinin yapılması:**

Bu konuda faaliyeti iki kısma ayırmak gerekmektedir. Birincisi, Köy Yerleşik Planları ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt işlemlerinin yapılmasıdır. Bu faaliyetler, her türlü yatırıma destek sağlayacak bir altyapı hizmeti olacaktır. Bu faaliyetlerden Köy Yerleşik Planlarının, 2013 yılı sonuna kadar tüm köyler için hazırlanması planlanmaktadır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt işleminde ise elektronik ortama veriler aktarılmış olup, 2009 yılında alan faaliyeti ile işlem tamamlanmıştır. Bu konulardaki ikinci kısım faaliyetleri ise, belediye mücavir alanları dışındaki parsellerin ifraz (bölme) ve tevhid (birleştirme) hizmetleri oluşturmaktadır. Bu işlemler rutin hizmetler olup; yapılan talep üzerine, yasal sınırlar içerisinde ifraz veya tevhid işlemini yerine getirmekte ve kanunen geçerlilik kazanması amacıyla, Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne yapılan işlemi bildirmektedir. Faaliyet ile ilgili herhangi bir sıkışıklık yaşanmamakta olup, gelen tüm taleplere cevap verilmektedir.

Sağlık Hizmetleri:

- **Hastane, sağlık ocağı ve evi yapımı:**

Hastane, sağlık merkezi, ocağı veya evi yapımı; İl sağlık Müdürlüğü'nün programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kurum olarak hedefimiz, herkesin sağlık hizmetinden kolaylıkla faydalanabilmesi için gerekli sağlık tesislerini ilimize kazandırmaktır. Bu yönde her türlü katkı Sağlık İl Müdürlüğü vasıtasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır.

- **Sağlık ocaklarında ve evlerinde bakım - onarım ve kalorifer tesisatı yapımı:**

Sağlık ocaklarına yapılacak hizmetin amacı; sağlık ocaklarının ve evlerinin, personelin daha iyi şartlarda hizmet verebileceği bir şekle getirilebilmesini ve dolayısıyla halka daha iyi hizmet götürülmesini amaçlamaktadır. Bakım ve onarım hizmetinin temelini kalorifer tesisatının yapımı oluşturmaktadır. Yapılacak hizmet, Sağlık İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir.

Kültür ve Turizm Hizmetleri:

- **Tokat ili kültürel değerlerinin ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi:**

Tokat ilinin hak ettiği turizm potansiyeline ulaşılabilmesi amacıyla, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün programı çerçevesinde; il tanıtım materyallerinin hazırlanmasına, fuar katılımlarına, tarihi mekânların restorasyonuna, arkeolojik kazı faaliyetlerine, kültürel ve sportif etkinliklere destek sağlanmaktadır.

Çevre Koruma ve Dinlenme Hizmetleri:

- **Kanalizasyon yapılan köylerde çevre kirliliğini azaltmak amacıyla doğal arıtma tesisleri yapımı:**

Kanalizasyon tesisleri, toplum sağlığı açısından önemli bir görevi yerine getirmekle birlikte, ayağının başıboş bırakılması durumunda çevre problemlerine sebep olmaktadır. Bu durum göz önüne alınarak son yıllarda, kırsal birimlerde kanalizasyon tesisi ile birlikte arıtma tesislerinin yapımı gerçekleştirilmektedir. Arıtma tesislerinin yapımında, basitliği, etkinliği ve maliyeti düşünülerek doğal arıtma sistemleri tercih edilmektedir. Doğal arıtma tesisleri yapımı, Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

- **Tokat İli Çevre Düzeni Planının yeniden düzenlenmesi:**

Tokat ili için yapılan Çevre Düzeni Planı'nın yeterli görülmemesi sebebiyle, yeniden düzenlenmesi konusunda karar alınmıştır. Belediyeler ve ilgili kuruluşlarca görüş alındıktan sonra, Bakanlıkça revize yetkisi alınıp, alt ölçekli planlar hazırlanacaktır.

- **Ağaçlandırma Faaliyetleri:**

Kurumumuz ağaçlandırmanın Tokat'ın bugünü ve geleceği için önemini dikkate alarak destekleme kararlılığındadır. Çevre ve Orman İl Müdürlüğünün koordinasyonunda gerekli destek sağlanacaktır.

Sosyal Hizmetler

- **Bina bakım onarımlarına ve malzeme alımlarına katkı sağlanması.**

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün çalışmalarına katkıda bulunulması amacıyla, bina yapımı, bakım onarımı ve malzeme alımlarına katkı sağlanacaktır.

- **Sosyal yardım ve destek sağlanması.**

Kurumumuz tarafından, asker ailelerine yardım programı yapılmakta ve ihtiyaç sahibi asker ailelerinin bütçelerine katkı sağlanmaktadır. Bir diğer sosyal program kapsamında, sokak hayvanlarının korunmasına katkı sağlanmaktadır. Kurumumuzun önemli bir programı ise; iş kurmakta zorlanan insanlara, mikro kredi desteği ile yardım sağlanmasıdır. Bu destek “Türkiye Grameen Mikro Kredi Destek Programı” kapsamında yürütülmektedir.

Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri

- **Sivil savunma hizmetlerine yönelik malzeme ve hizmet alımı yapılması.**

İl Acil Afet Müdürlüğünün çalışmalarına katkıda bulunulması amacıyla, kurum hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli sivil savunma malzemeleri alımına destek sağlanacaktır.

- **Hizmet binası ve lojman yapım ve bakım onarımı.**

İl Emniyet Müdürlüğünün programı kapsamında yapılacak olan muhtelif inşaat faaliyetlerine destek sağlanacaktır.

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2010 YILI
FAALİYET RAPORU**

**PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
VE
DEĞERLENDİRİLMESİ**

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2010 YILI
FAALİYET RAPORU**

**İSKÂN VE TOPLUM REFAHI
HİZMETLERİ**



STRATEJİK AMAÇ 1

TÜM KIRSAL YERLEŞİM BİRİMLERİNE; SAĞLIKLI VE YETERLİ İÇME SUYU SAĞLANACAKTIR.

STRATEJİK HEDEF 1.1

Tokat ili kırsal yerleşim birimlerinin tümüne içme suyu sağlanmış olup, 2013 yılı sonunda içme suyu yetersizliği çeken köy oranı % 2.50 oranına indirilecektir.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
İçme suyu tesisi bakım onarım yapılan köy oranı (%)	21	31	17	40	+ 23


** Tokat İli toplam köy sayısı 583 olarak alınmıştır.*

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Bakım onarım ve ilave yapılan içme suyu tesisi yapılan yerleşim birimi sayısı (adet)	120	180	102	235	230
2	Bakım onarım ve ilave yapılan içme suyu tesislerine ayrılan kaynak miktarı (TL) (KÖYDES Hariç)	150,147.25	416,678.37	818,450.00	763,629.58	93
3	Bakım onarım ve ilave yapılan içme suyu tesislerine ayrılan kaynak miktarı (TL) (KÖYDES Dahil)	1,685,534.25	616,678.37	-	1,558,037.38	-

Değerlendirme:

- ✓ Stratejimiz, içme suyu tesislerine yapılan bakım-onarım miktarını yıllar içerisinde azaltmaktır. Bu strateji doğrultusunda, 2009 yılında kaynak miktarında azalma sağlanmış fakat 2010 yılında tekrar artış yapılmıştır. 2010 yılında hem KÖYDES'den hem de Özel İdare kaynaklarından, daha fazla miktarda ödenek ayrımı yapılmıştır. İçme suyu tesislerine yapılan yatırımın artış sebepleri şu şekilde tanımlanabilir:
- Heyelan ve kuraklıktan dolayı, gözelerdeki su miktarının azalması veya kaybolması,
 - Özellikle eski yapım içme suyu tesislerinin iletim hatlarında sık sık arızaların meydana gelmesi,
 - Su sayacı kullanımının oranının düşük olmasından dolayı, su kullanımında dikkatli davranılmaması ve buna bağlı olarak ek tesis ihtiyacının ortaya çıkmasıdır.
- ✓ 2013 yılı sonuna kadar, bakım-onarım oranının % 2.50'ye indirmenin mümkün olamayacağı görülmektedir. Bu orana inilmesi mümkün olmasa dahi, yıllar içerisinde ayrılan kaynağı azaltmak ve bakım-onarım oranlarını mutlaka makul seviyelere indirmek gerekmektedir. Bunu yapabilmek için; tesislerin bakım-onarım işlerinin daha farklı alternatifler üretilerek yapılmasında gereklilik görülmektedir. Bunlar:
- Ekonomik ömrünü doldurmuş tesislerin komple yenilenmesi,
 - Tesislerin yapılacak kanuni düzenlemeler ile tesisleri kullanan tüzel kişiliklere teslimi ve bakım ve onarımın bu tüzel kişiler tarafından karşılanması,
 - Su sayacı kullanımının yaygınlaştırılması ve su ücreti alınması.
- vb. alternatifler olabilir.

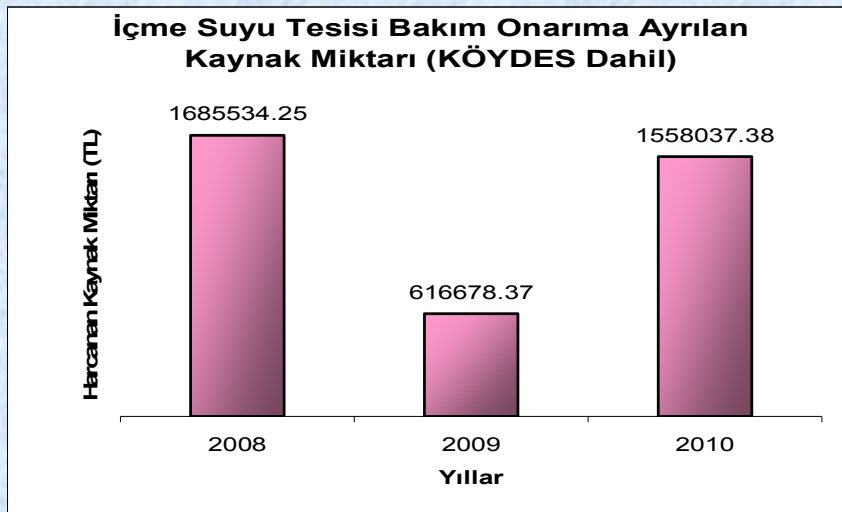

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	İçme suyu tesisi yapımı, bakım-onarımı amacıyla faaliyet (projeli yapım, malzeme yardımı vb.) yürütülen yerleşim yerleri: • <u>Merkez:</u> Bakışlı, Pınarlı, Ulaş, Tahtoba, Dedeli, Alan, Kervansaray, Döllük, Uğrak, Yazıbaşı, Çamlık, Ortaören, Karakaya, Tekneli, Çördük, Derekişla, Kömeç, B.Bağlar, Çerçi, Söngüt, Kocacık, Aydınca, Kızılköy, G.O.P., Çamaltı, Semerci, Daylıhacı, Çubuklu, Hasanbaba, Beşören, Yeşilyurt, Gözova, Günevi, Gülpınar, Bedirkale, Güğümlü, Çamdere, Sarıtarla, Gölçük, Nebi, Dereyaka, Keşlik, Kızılöz, Karkın, Halilalan, Güzeldere, Killik, Mülk, Efe, Büyükyıldız, Çerdiğin • <u>Almus:</u> Sahil, Gebeli, Çamköy, Hubyar, Dereköy, Kolköy, Kızılelma, Babaköy, Çaykıyı, Karadere, Alan, Üçgöl • <u>Artova:</u> Ahmetdanişment, A.Güçlü, Ağmusa, Gürardıç, Y.Güçlü • <u>Başçiftlik:</u> Alan, Şahanlar, Yeşilçam, Eriklikeke • <u>Erbaa:</u> Çatalan, İverönü, Beykaya, Demirtaş, Aydınsofu, Aşağıçandır, Canbolat, Hacıbükü, Narlıdere, Gümüşalan, Küplüce, Çakır, Dokuzçam, Ermeydanı, İkizce, Bağpınar, Doğanyurt, Kızılelma, Yukarıçandır, Endikpınarı	185	583,568.62	Tamamlandı.

	• <u>Niksar</u>: Terzioğlu, Camidere, Haydarbey, Yalıköy, Kumçiftlik, Boyluca, Ayvalı, Bayraktepe, Beyçayırı, Budaklı, Akıncı, Muhtardüzü, Ormancık, Büyükyurt, Kaşıkçı, Gülbayır, Işıklı, Özalan, Mercimekdüzü • <u>Pazar</u>: Kaledere, Bağlarbaşı, Dereçaylı, Ocaklı, Ovacık, Tatar, Çayköy, Beşevler, Ovayurt, Taşlık • <u>Reşadiye</u>: Keteniği, Karataş, Çayırpınar, Özlüce, Konak, Güvendik, Taşlıca, Çambalı, Umurca, Karacaagaç, Bostankolu, Çınarcık, Çakırlı, Eymür, Sarıyayla, Çakraz, Çamlıkaya, Muratkaya, Elmacık, Ahmetdanişment, İbrahimşeyh, Karlıyayla, Kuyucak, Çavuşbeyli, Darıderesi • <u>Turhal</u>: Yağlıalan, Çayıraltı, Akbuğday, Kalaycık, Elalmış, Necip, Çarıksız, Bahçebaşı, Kuytul • <u>Sulusaray</u>: Beyazıt, Alanyurt, Sarıyaprak, Belpınar • <u>Yeşilyurt</u>: Sivri, Bahçebaşı, Ekinli, Karaoluk, Çırdak • <u>Zile</u>: Yünlü, Yapalak, Osmanpınarı, Binbaşıoğlu, Yeniderbent, Kozdere, Boldacı, Kireçli, Küçükkarayün, Eskiderbent, Salur, Reşadiye, Büyüközlü, Akdoğan, Kırlar, Selamet, Ede, Yanıdağıçı, Üçköy, Küçüközlü, Ayvalı			
--	---	--	--	--

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ – KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	İçme suyu tesisi yapımı, bakım-onarımı amacıyla faaliyet (projeli yapım, malzeme yardımı vb.) yürütülen yerleşim yerleri: • <u>Merkez:</u> Kızılkaya, Tekneli • <u>Başçiftlik:</u> Erikbelen • <u>Erbaa:</u> Merkez • <u>Niksar:</u> Kaşıkçı, Gülbayır, Büyükyurt • <u>Sulusaray:</u> Belpınar	8	128,524.72	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak (İller Bankası Kaynaklı)	İşin durumu
1	İçme suyu tesisi yapımı, bakım-onarımı amacıyla faaliyet (projeli yapım, malzeme yardımı vb.) yürütülen yerleşim yerleri: • <u>Merkez:</u> Halilalan • <u>Erbaa:</u> Karaağaç • <u>Pazar:</u> Tatar • <u>Turhal:</u> Dökmetepe	-	51,536.24	İşler devam ediyor.

**Uygulayan Birim: : KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİK BAŞKANLIĞI – İL ÖZEL İDARESİ
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ (KÖYDES PROGRAMI)**

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak (KÖYDES)	İşin durumu
1	İçme suyu tesisi yapımı, bakım-onarımı amacıyla faaliyet (projeli yapım, malzeme yardımı vb.) yürütülen yerleşim yerleri: • <u>Merkez:</u> Yelpe, Kızık • <u>Artova:</u> A.Güçlü, Y.Güçlü • <u>Erbaa:</u> Pınarbeyli, Tepekışla, Demirtaş-Canbolat, Hacıbükü, Kızılcubuk • <u>Pazar:</u> Taşlık, Bağlarbaşı • <u>Sulusaray:</u> Alpudere, Ballıkaya, Uylubağı, Sarıyaprak, Belpınar • <u>Turhal:</u> Necip, Kayaören, Çarıkısız, Gümüştöpe, Akçatarla, Bahçebaşı, Çamlıca, Çayıraltı, Çivril, Derbentçi, Dökmetepe, Elalmış, Erenli, Hasanlı, Kamalı, Kazancı, Kuytul, Ormanözü, Samurçay, Sarıkaya, Sütluce, Yeniceler, Yeniköy, Yeşilalan, Yeniköy	42	794,407.80	Tamamlandı.

STRATEJİK HEDEF 1.2

Sağlıklı bir içme suyu sağlayabilmek için klorlama tesislerini kurmak ve 5 yıl içerisinde köylerin tamamında tesis etmek.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefften Sapma (%)
Klorlama tesisi tamamlanan içme suyu tesisi oranı (Kümülatif toplam) (%) (Toplam tesis sayısı 1652 alınmıştır)	3.4	4.0	6.9	4.4	- 36

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Klorlama cihazı yapılan tesis sayısı	16	7	50	9	18
2	Klorlama cihazı için harcanan kaynak miktarı (TL)	11,540.40	5,600.00	40,000.00	11,250.00	28

Not: 2010 yılında yapılan anket sonucuna göre, 1652 su deposu içerisinde klorlama tesisi ünitesi kurulan, su deposu sayısı 64 adettir.

Değerlendirme:

- ✓ İçme suyu tesislerine klorlama ünitesi konması, Kurumun amaçları arasına 2009–2013 Stratejik Planı ile birlikte girmiştir. Bu amaç; Kurumun hizmet verdiği insanlara daha kaliteli bir hizmet götürme vizyonundan ileri gelmektedir. 2010 yılında, çoğunluğu KÖYDES'ten olmak üzere 9 adet içme suyu deposuna klorlama tesisi yapılabilmektedir. Bu miktar hedeflerimizin oldukça altındadır. 2013 yılı sonuna kadar, tüm depoların klorlama ünitesi ile donatılması hedefinin yakalanması güç gözükmemektedir. Bununla birlikte gerekli kaynak ayrılabilirdiği takdirde, hedefin gerçekleştirilebilmesi çok kısa süre içerisinde sağlanabilecektir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Klorlama tesisi monte edilen su depolarının bulunduğu yerleşim yerleri: • <u>Niksar</u>: Buzköy	1	1,250.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: : KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİK BAŞKANLIĞI – İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ (KÖYDES PROGRAMI)				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak (KÖYDES)	İşin durumu
1	Klorlama tesisi monte edilen su depolarının bulunduğu yerleşim yerleri: • <u>Erbaa</u>: Demirtaş, Pınarbeyli • <u>Pazar</u>: Tatar, Bağlarbaşı, Taşlık • <u>Turhal</u>: Necip, Gümüştöpe, Kayaören	8	10,000.00	Tamamlandı.

STRATEJİK AMAÇ 2**GÖREV ALANI İÇERİSİNDEKİ TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİNE, ÇALIŞIR DURUMDA KANALİZASYON HİZMETİNİ SUNMAK.****STRATEJİK HEDEF 2.1****2012 yılı sonuna kadar köylerin % 95'inin kanalizasyonu tamamlanacaktır.****Performans Hedefi:**

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefften Sapma (%)
Kanalizasyon tamamlanma oranı (Kümülatif Toplam) (%)	83	84	85	86	+1

* Kanalizasyon oranları, 2010 yılında köy muhtarlıkları ile yapılan ankete göre yeniden düzenlenmiştir. **Tokat İli toplam köy sayısı 583 olarak alınmıştır.**

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Yapılan yeni tesis kanalizasyon sayısı (adet)	11	6	6	13	216
2	Kanalizasyonu tamamlanan köy sayısı (adet)	482	488	494	501	101
3	Yeni tesis kanalizasyon için harcanan kaynak miktarı (TL)	60,500.00	45,000.00	50,000.00	122,727.23	245

Değerlendirme:

- ✓ **Kanalizasyon değerlendirmeleri 2010 yılında yapılan, Köy Durum Anketlerine göre yeniden düzenlenmiş ve köy sayısının son durumuna göre oranlama yapılmıştır. Son duruma göre; 2012 yılı sonuna kadar köylerin % 95'inin kanalizasyonunun tamamlanma ihtimali zayıf gözükmemektedir. Bununla birlikte, 2010 yılında yapılması planlanan kanalizasyon tesisi sayısının 2 katı tesis yapılmıştır. Bu yıl gösterilen performans diğer yıllarda da gösterilebildiği takdirde, hedefi yakalamak ve hatta geçmek mümkün olabilecektir.**

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Yeni tesis kanalizasyon yapımı • <u>Merkez:</u> Yenice, Sarıtarla • <u>Almus:</u> Hubyar, Mescit • <u>Niksar:</u> Bozcaarmut, Gültepe, Bayraktepe, Çalca • <u>Turhal:</u> Akbuğday, Kuytul • <u>Sulusaray:</u> Sarıyaprak • <u>Yeşilyurt:</u> Bahçebaşı, Karaoluk	13	122,727.23	Tamamlandı.

STRATEJİK HEDEF 2.2

2013 yılı sonunda, bakım-onarım ihtiyacı hissedilen kanalizasyon tesisi oranı % 10'lar seviyesine getirilecektir.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Yıllık bakım-onarım ihtiyacı olan kanalizasyon tesisi oranı (%)	26	35	26	34	+ 8

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Kanalizasyon tesisi İyileştirme ve bakım- onarım çalışması yapılan yerleşim yeri sayısı (köy)	125	173	130	171	131
2	Kanalizasyon iyileştirme ve bakım-onarım için harcanan kaynak miktarı (TL)	232,313.39	412,885.00	655,000.00	569,473.77	87


Değerlendirme:

✓ 2010 yılı içerisinde; bakım onarım yapılan tesis sayısı planlanan oranın yaklaşık % 30 üzerinde gerçekleşmiştir. Mevcut kanalizasyon tesislerinin % 34'ünde bakım-onarım gerçekleştirilmiştir. Tesislerin üçte biri bakım görmüştür. Bu oran çok yüksektir. Stratejimiz olan % 10'lar değerinin çok üzerindedir. Ayrıca aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi son iki yıldır bakım onarıma ayrılan kaynak miktarı artarak devam etmektedir. Tesislerde bakım onarım oranının fazlalığı, özellikle eski tesislerde büz kullanımının yaygın olması ve bunun tıkanmalar sebep olmasından ileri gelmektedir. Yeni yapım tesislerde, bu olumsuzluğu gidermek amacıyla, büz yerine korige boru kullanılmaktadır. 2013 yılı sonuna kadar, bakım-onarım oranının % 10 düzeyine indirmenin mümkün olamayacağı görülmektedir. Bunu yapabilmek için; tesislerin bakım-onarım işlerinin daha farklı alternatifler üretilerek yapılmasında gereklilik görülmektedir.

Bunlar:

- Ekonomik ömrünü doldurmuş tesislerin komple yenilenmesi,
- Tesislerin yapılacak kanuni düzenlemeler ile tesislerin kullanan tüzel kişiliklere teslimi ve bakım ve onarımın bu tüzel kişiler tarafından karşılanması,

vb. alternatifler olabilir.

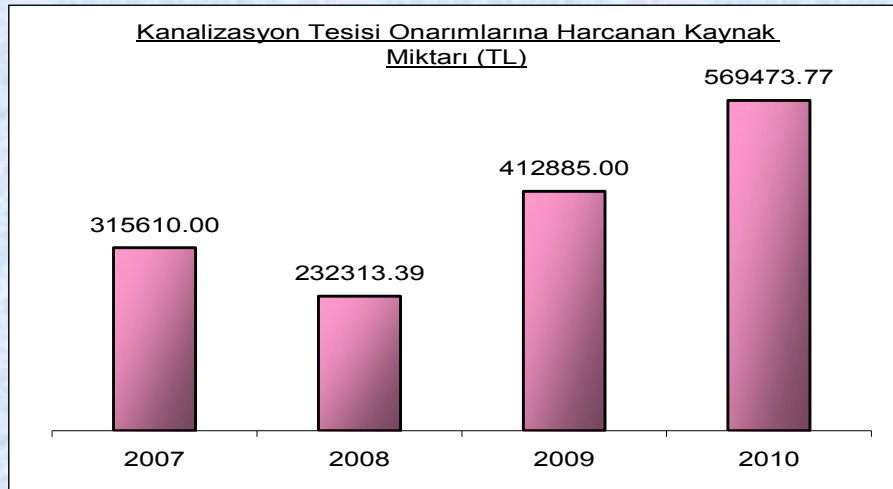

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Bakım onarım ve iyileştirme yapılan kanalizasyon tesisi yapımı <u>Merkez</u>: Keşlik, Kılıçlı, Pınarlı, Ulaş, Çayören, Bakışlı, Gülpınar, Günçalı, Uğrak, Güzeldere, Semerci, Akyurt, Kadıvakfı, Söngüt, Tahtoba, Şehitler, Akın, Daylıhacı, Dökmetepe, Güzelce, Kömeç, G.O.P., Karakaya, Kabatepe, Kervansaray, Büyükbağlar, Bula, Alan, Gölçük, Döllük, Yazıbaşı, Çöreğibüyük, Dodurga, Çördük, Çerçi, Yakacık, Çamağzı, Derekışla, Çubuklu, Ormanbeyli, Çerdiğin, Dereyaka, Küçükbağlar, Hasanbaba, Ortaören, Beşören, Gözova, Kızılöz, Ekincilik, Avşarağzı, Bedirkale, Çamdere, Yayladalı, Kızık, Dedeli, Batmantaş, Taşlıçiftlik, Aydınca, Çökelikkışla, Güğümlü, Çamaltı, Kocacık, Kabakboğazı, Mülk <u>Almus</u>: Çambulak, Arısu, Kapıcı, Bakımlı, Dereköy, Alan, Oğulbey, Durudere <u>Artova</u>: Ahmetdanişment, Boyunpınar, Ağmusa, Sivri, Devecikarkın, Taşpınar, Kayaönü, Y.Güçlü <u>Başçiftlik</u>: Erikbelen <u>Erbaa</u>: Gümüşalan, Endekpınar, Kale, Aydınsofu, Evciler, Tepekışla, Bağpınar, Yaylacık, Küplüce, Sokutaş <u>Niksar</u>: Çiçekli, Camidere, Köklüce, Çayköy, Yeşilkaya, Şeyhler, Güdüklü, Gökçeoluk, Ormancık, Budaklı, Ormanözü, Sulugöl, Armutalan, Esence <u>Pazar</u>: Bağlarbaşı, Çiftlik, Dereçaylı, Dereköy,	169	540,856.77	Tamamlandı.

	Menteşe, Ovayurt • <u>Reşadiye</u>: Elmacık, Muratkaya, Beşdere, Eyüp, Gülkonak, Özlüce, Saraykışla, İsmailiye, Yağsıyan, Dalpınar, Güvendik, Köklü, Güzeldere, Kuzgölcük, Çakraz • <u>Sulusaray</u>: Alanyurt, Belpınar • <u>Turhal</u>: Derbentçi, Gökdere, Tatlıcak, Çivril, Kalaycık, Koruluk, Gümüştop, Kamalı, Üçyol, Ağcaşar, Hasanlı, Uluöz, Erenli, Necip, Akçatarla, Dökmetepe, Arzupınar, Sarıçiçek, Yeşilalan, Elalmış • <u>Yeşilyurt</u>: Yeniköy, Ekinli • <u>Zile</u>: Kazıklı, Kozdere, Boldacı, Akdoğan, Salur, Kırlar, Reşadiye, Çayıroluğu, Osmanpınarı, Ayvalı, Üçköy, Ede, Eskiderbent, Yeniderbent, Özyurt, Hatıppınarı, Yünlü, Kurupınar, Emirdolu			
--	--	--	--	--

Uygulayan Birim : İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ - KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Bakım onarım ve iyileştirme yapılan kanalizasyon tesisi yapımı • <u>Merkez</u>: Kabakboğazı • <u>Yeşilyurt</u>: Ekinli	2	28,617.00	Tamamlandı.

STRATEJİK AMAÇ 3

ULAŞIMIN HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLANABİLMESİ İÇİN BÜTÜN KIRSAL YERLEŞİM BİRİMİ YOLLARI ÇAĞDAŞ STANDARTLARA KAVUŞTURULACAKTIR.

STRATEJİK HEDEF 3.1

Kurumumuz görev alanı içerisinde yer alan yolların, yapılacak çalışmalar ile standartları artırılacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Yol yapım ve bakım çalışmalarının çok çeşitlilik arz etmesinden dolayı, herhangi bir performans hedeflemesi yapılamamıştır.					

Performans Göstergeleri:


S. N o	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Tesviye Yapımı (km)	45	5	0	16	-
2	Orman Yolu Yapımı (km)	-	352.5	100	155	155
3	Yayla Yolu Onarımı (km)	-	-	-	132.5	-
4	Yayla Yolu Reglaj Yapımı (km)	-	-	-	160	-
5	Yol Onarımı Yapımı (km)	306.5	66.7	50	96.6	193
6	Stabilize Kaplama Yapımı (km)	112	310.7	150	396.4	264
7	I.Kat Asfalt Kaplama Yapımı (km)	13.1	33.7	-	204.8	-
8	II.Kat Asfalt Kaplama Yapımı (km)	67.1	142.0	-	242.6	-
9	Asfalt Bakımı Yapımı (km)	320	1453	800	1512	189
10	Malzemeli Bakım Yapımı (km)	22.5	31.65	50	60.4	121

11	Greyderli Bakım (km)	2200	5740	4000	5310	133
12	Büz-Menfez Konması (köy)	40	18	8	11	138
13	Köprü-Menfez Dolgusu Yapımı (köy)	46	16	5	9	180
14	Köprü Yapımı (adet)	-	-	-	2	-
15	Köprü Onarımı (adet)	-	-	-	1	-
16	Heyelan Temizliği Yapımı (köy)	-	44	20	56	280
17	Yol yapım-bakım ve çeşitli mal ve malzeme için harcanan kaynak miktarı (KÖYDES Hariç) (TL)	284,780.00	2,093,686.76	2,200,000.00	13,303,244.00	605
18	Yol yapım-bakım ve çeşitli mal ve malzeme için harcanan kaynak miktarı (KÖYDES Dahil) (TL)	3,782,091.84	7,780,686.76	-	22,835,813.57	-

- Performans değerlerine KÖYDES dâhil edilmiştir.

Değerlendirme:

- ✓ Tokat İli kırsalında, yolu olmayan yerleşim merkezi bulunmamaktadır. Bununla birlikte her yıl yeni yol yapımı ihtiyacı doğmakta olup, son üç yıl içerisinde toplam 66 km yeni yol (tesviye yapımı) yapımı gerçekleştirilmiştir. Bu durum mahalleler arası köy yolu açma isteğinden ileri gelmektedir. 2010 yılında yol yapım çalışmaları tüm faaliyetlerde zirveye çıkmıştır. KÖYDES dahil 2009 yılına göre yaklaşık 3 kat ödenek artışı sağlanmıştır. Bunun sebebi KÖYDES programı ile birlikte, ek program ile gelen kaynağın yol faaliyetlerine aktarılmasından ileri gelmektedir. Kurum kaynakları ile son yıllarda ilk kez asfalt yapımı gerçekleştirilmiştir. KÖYDES programı ile birlikte toplam 450 km asfalt yapılmıştır. Önceki yıllarda asfalt yapımı tamamen KÖYDES programından yapılmıştır. Özel İdare kaynaklarından asfalt yapımı gerçekleştirilmemiştir.
- ✓ Yol yapım faaliyetlerinde üzerinde durulması gereken en önemli konu yol standartlarının yükseltilmesi ve yapılan yol yatırımlarının etkinliğinin artırılmasıdır. Yol onarımları, stabilize yol yapımları, menfez ve köprü yapımları ve II.kat asfalt yapımları yol standartlarının yükseltilmesinde çok önemli işlevlere sahip faaliyetlerdir. Son üç yıl içerisinde bu konuda çok önemli mesafeler alınmış ve yatırımlar gerçekleştirilmiştir.

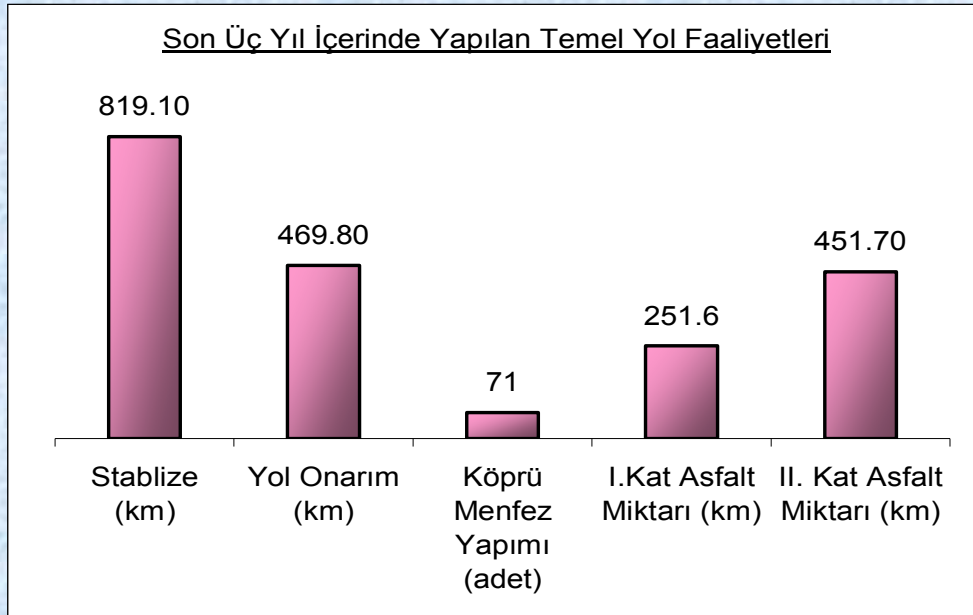

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Tesviye Yapımı <u>Merkez</u>: Mülk- Üçgöl, Kabakboğazı-Üçgöl: 9 km <u>Erbaa</u>: Narlıdere-Merkez Mah.: 2 km <u>Reşadiye</u>: Yuvacık-Tozanlı, Bozcalı-Elmalı: 5 km	16 km	-	Tamamlandı
2	Orman Yolu Yapımı Merkez: 10 km, Almus: 23 km, Başçiftlik: 3 km, Niksar: 53 km, Zile: 66 km	155 km	-	Tamamlandı
3	Yayla Yolu Onarımı Merkez: 25 km, Almus: 37.5 km, Erbaa: 3 km, Niksar: 67.5 km	132.5 km	-	Tamamlandı
4	Yayla Yolu Reglaj Yapımı Merkez: 5 km, Almus: 110 km, Başçiftlik: 5 km, Erbaa: 10 km, Niksar: 30 km	160 km	-	Tamamlandı
5	Yol Onarımı Yapımı <u>Merkez</u>: Yayladağı, Semerci-Hanpınar, Çördük, Aluç, Bakışlı, Halilalan, Çamaltı, Aydoğdu, Günçalı: 42.5 km <u>Erbaa</u>: Tandırlı-Çizene Mah.Yolu, Ermeýdanı-Çobanlı Mah.Yolu, Gökal Grup Yolu, Narlıdere-Merkez Mah., Dokuzçam: 12.3 km <u>Niksar</u>: Gerit, Yalı, Aydoğmuş-Hanyeri, Beyçayırı, Gürçeşme: 7.8 km <u>Pazar</u>: Tepeçaylı, Ballica, Dereçay:11 km <u>Reşadiye</u>: Karşıkent-Bostankolu, Taşlıca-Bereketli-Kavaklıdere Grup Yolu: 6 km <u>Turhal</u>: Turhal-Pazar-Şatroba: 15 km <u>Zile</u>: Kuruçay-Sulusaray: 2 km	96.6 km	383,793.75 (Ek Program:15 km)	Tamamlandı
6	Stabilize Kaplama Yapımı <u>Merkez</u>: Aluç, Karakaya, Söngüt, Bakışlı, Döllük, Keşlik, Kılıçlı, Kocacık, Bozatalan, Mülk-Üçgöl: 46 km <u>Almus</u>: Oğulbeyli, Bağtaşı-Kolköy, Çiftlik: 19 km	286.9 km	355,000.00 (Ek Program:14 km)	Tamamlandı

	• <u>Erbaa</u>: Çataalan-Billur Mah., Feribot, Doğanyurt-Genise Mah., İleboynu-Ortaköy-Alan-Şükür Grup Yolu, Çalkara, Kozlu, Çakır, A.Çandır, Ezebağı, Çerkezfındıcak, Gölönü, Cibril, Kale, Narlıdere, Çakır, Gökal Grup Yolu: 45 km • <u>Niksar</u>: Çayköy, Kapağzı, Terzioğlu, Gülbayır, Korulu, Kiracı, Akıncı, Camidere, Özdemir-Fakırdamı, Geyikgölü: 20.3 km • <u>Pazar</u>: Tepeçaylı, Üzümlören-Kaledere-Çayköy, Ovayurt-Tatlıcak, Çayköy, Ovayurt, Ocaklı: 32 km • <u>Reşadiye</u>: Güvendik-Demircili Grup Yolu, Kızılcaören-Kuyucak Grup Yolu, Karşıkent-Bostankolu, Taşlıca-Bereketli-Kavaklıdere Grup Yolu Bağlantısı, Saraykışla, Uğurlu, Güllüköy, Çamlıkaya, Yoğunpelit: 31 km • <u>Turhal</u>: Dökmetepe-Necip, Bahçebaşı-Armutalan, Bahçebaşı-Çayıraltı, Yenisu-Üçyol, Koruluk-Yazıtepe, Ulutepe-Ormanözü-Eriklitekke, Kuytul-Karkın-Erenli, Yeniceler-Buzluk: 57 km • <u>Zile</u>: Narlıkışla-Haramikışla, Reşadiye Grup Yolu, Yalıyazı Grup Yolu, Yaraş, Uzunöz, Kazıklı, Korucak, Kurupınar, Yeşilce-Fatih, Çeltekin Mevzısı, Derebaşı, Yünlü, Üyük-Hatıppınarı, Karakaya-Kervansaray: 36.6 km			
7	I.Kat Asfalt Kaplama Yapımı • <u>Merkez</u>: Çamlıbel-Büget, Batmantaş-Sivas İl Sınırı, Kızılöz-Sevindik, Çat-Ormandibi: 17.5 km • <u>Almus</u>: Karadere-Babaköy, Kolköy-Çayönü, Almus-Sazak Grup Yolu: 16 km • <u>Artova</u>: Artova-Zile Grup Yolu: 14.5 km • <u>Erbaa</u>: Gökal Grup Yolu, Erbaa-Gökdere-Avlunlar: 33 km • <u>Niksar</u>: Yazıcık-Kuyucak, Arıpınar-Ataköy, Eyneaplı-Özalan: 20 km • <u>Pazar</u>: Çiftlik-Ovayurt: 2.5 km • <u>Reşadiye</u>: Güvendik-Demircili, Çavuşbeyli-Köklü:	148.8 km	9,429,633.80 (Ek Program: 144.3 km) + 316,348.40 (İller Bankası: 4.5 km)	Tamamlandı

	21.8 km <u>Turhal</u>: Kazancı-Kamalı: 4.5 km <u>Zile</u>: Reşadiye-Yalinyazı, B.Kozluca-Zile, Uzunöz: 19 km			
8	II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı <u>Merkez</u>: Merkez-Sevindik-Çat, Çat-Ormandibi: 11 km <u>Artova</u>: Artova-Zile Grup Yolu: 6 km <u>Erbaa</u>: Kale Grup Yolu: 10 km <u>Niksar</u>: Yazıcık-Kuyucak, Yolkonak Beldesi, Arıpınar: 11.2 km <u>Sulusaray</u>: Dutluca-Ballıkaya-Balıkhisar, Dutluca-Buğdaylı: 15.3 km <u>Yeşilyurt</u>: Karagözügöllüalan, Ekinli, Karacaören: 8.75 km <u>Zile</u>: Şeyhnusrettin-Özyurt: 4 km	66.2 km	846,370.20 (Ek Program-Tüm)	Tamamlandı
9	Asfalt Bakımı (Yama) Yapımı	432 km	999,812.00 (İller Bankası)	Tamamlandı
10	Malzemeli Bakım Yapımı Merkez: 9.1 km, Almus: 39 km, Erbaa: 5.2 km, Niksar: 3.8 km, Zile: 3.3 km	60.4 km	-	Tamamlandı
11	Greyderli Bakım Merkez: 850 km, Almus: 650 km, Artova: 120 km, Başçıftlık: 55 km, Erbaa: 850 km, Niksar: 580 km, Pazar: 45 km, Reşadiye: 720 km, Sulusaray: 50 km, Turhal: 650 km, Yeşilyurt: 40 km, Zile: 700 km	5310 km	-	Tamamlandı
12	Büz-Menfez Konması <u>Almus</u>: Bakımlı, Bakımlı Duvar, Haramikışla, Kapıcı, Çilehane-Gümelönü, Çilehane-Bağtaş, Çiftlik, Arısu-Eskici <u>Niksar</u>: Çatak, Mahmudiye-Şahinli <u>Sulusaray</u>: Tekkeyönü	11 köy	-	Tamamlandı
13	Köprü-Menfez Yapımı <u>Merkez</u>: Bakımlı <u>Erbaa</u>: Çakır, Doğanyurt-Güнесе Mah., Yurtalan,	6 köy	-	Tamamlandı

	Üzümlü			
	<u>Zile</u>: Savcı			
14	Köprü Yapımı <u>Niksar</u>: Büyükyurt-Irmak Mah.-Akkuş-Gökçebayır <u>Sulusaray</u>: Beyazıt	2 adet	43,424.00 (Ek Program 1 köprü)	Tamamlandı
15	Köprü Onarımı <u>Reşadiye</u>: Duttibi	1 adet	-	Tamamlandı
16	Heyelan Temizliği Yapımı Merkez: 12 köy, Almus: 11 köy, Başçiftlik: 1 köy, Erbaa: 15 köy, Niksar: 13 köy, Reşadiye: 1 köy, Zile: 3 köy	56 köy	-	Tamamlandı

Uygulayan Birim : KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ - İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (KÖYDES PROGRAMI)

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Stabilize Kaplama Yapımı <u>Merkez</u>: Sarıtarla-Çerdiğin, Mülk-Derekışla-Üçgöl Grup Yolu: 12 km <u>Başçiftlik</u>: Dağüstü-Erikbelen: 3 km <u>Niksar</u>: Muhtelif: 30 km <u>Reşadiye</u>: Çevrecik-Saraykışla, Yuvacık-Özen, Karşıkent-Bayramaltı Mezrası: 22 km <u>Yeşilyurt</u>: Muhtelif: 13 km <u>Zile</u>: Yalinyazı-Reşadiye, Üçköy-Zile, Üçköy-Yeşilce, Çelteke-Honar Mezrası, Ede-Kızılüzüm Mezrası, Karakaya, Yünlü, Derebaşı, Yaraş, B.Kozluca-Göynücek, Emirdolu: 29.5 km	109.5 km	973,388.20	Tamamlandı
2	I.Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı <u>Merkez</u>: Çöreğibüyük-Tokat, Kabatepe, Söngüt, Bakışlı, Fırindere-Batmantaş, Ulaş: 14.7 km <u>Almus</u>: Tozanlı Grup Yolu: 11.5 km <u>Erbaa</u>: Akkoç-Tanoba: 8.1 km <u>Reşadiye</u>: Kızılcaören-Kuyucak, Bereketli, Elmacık, Güvendik-Demircili: 8.7 km <u>Turhal</u>: Gümüştop-Çamlıca-Yazıtepe, Kat-Sarıçiçek: 5 km	56 km	3,045,552.16	Tamamlandı

	• <u>Yeşilyurt</u>: Sekücek: 0.5 km • <u>Zile</u>: Yalinyazı-Reşadiye, Yıldıztepe-Reşadiye, Karakuzu: 7.5 km			
3	II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı • <u>Merkez</u>: Bula-Tokat, Beşören-Tokat, Çamlıbel-Büget, Daylahacı, Dereyaka, Efeköy-Avlunlar Grup Yolu, Gözova-Çökelikli Grup Yolu, Kızık, Altıntaş, Çördük: 42 km • <u>Artova</u>: Ağmusa Grup Yolu, Yağcımusa, Çelikli-Iğdır-Salur-Tuzla: 28 km • <u>Başçiftlik</u>: Alan: 13.3 km • <u>Erbaa</u>: Doğanyurt-Yaylalı, İverönü-Kürlüce: 12 km • <u>Niksar</u>: Gülbayır-Niksar, Gültepe-Karakaş-Edilli, Hüseyingazi-Niksar, Arpaören-Hacılı-Asar-Muhtardüzü, Eryaba, Korulu-Çayköyü-Terzioğlu-Ayvalı, Kiracı-Niksar, Buzköy-Niksar, Beyçayırı-Niksar, Sorhun-Niksar, Kümbetli-Niksar, Cer-Güvenli-Niksar, Ustahasan-Esence Grup Yolu, Akıncı, Köklüce, Mercimekdüzü, Örenler, Yeşilyurt, Camidere, Büyükyurt, Cercöy, Derindere, Sulugöl, Eryaba-Oluklu: 40.7 km • <u>Pazar</u>: Doğançalı: 5.6 km • <u>Reşadiye</u>: İsmailiye-Çat, Bereketli-Yolayırımı-Taşlıca, Bereketli-Kavaklıdere, Güvendik-Demircili: 23 km • <u>Yeşilyurt</u>: Sekücek, Doğanca: 11.8 km	176.4 km	2,348,032.15	Tamamlandı
4	Asfalt Bakımı (Yama) Yapımı	1080 km	1,590,935.00	Tamamlandı
5	Köprü-Menfez Yapımı • <u>Merkez</u>: Çördük, Güzeldere • <u>Zile</u>: Savcı	3 köy	56,000.00	Tamamlandı

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK DAĞILIMI

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Yol yapım çalışmalarında kullanılan; yol dolgu malzemesi, inşaat malzemesi, patlayıcı madde ve hizmet alımı yapılması (Normal program ödeneği).		575,949.92	Tamamlandı
2	Yol yapım çalışmalarında kullanılan büz, menfez alımı ve boru alımı yapılması (Normal program ödeneği).		88,310.44	Tamamlandı
3	Menfez ve köprü yapımı (Normal program ödeneği)		150,000.00	Tamamlandı
4	Asfalt, stabilize, yol onarım, köprü yapımı (Ek program ödeneği).		11,147,960.57	Tamamlandı
5	Yol dolgu malzemesi alımı (Ek program ödeneği).		24,862.67	Tamamlandı
6	Asfalt yapım ve asfalt yama yapımı. (İller Bankası Ödeneği).		1,316,160.40	Tamamlandı
TOPLAM			13,303,244.00	

Uygulayan Birim: : KÖYDES PROGRAMI KAYNAK DAĞILIMI

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Asfalt, stabilize, köprü menfez yapımı.		6,422,972.51	Tamamlandı
2	Yol yapım çalışmalarında kullanılan asfalt malzemesi, parke, büz, menfez ve boru alımı yapılması.		3,109,597.06	Tamamlandı
TOPLAM			9,532,569.57	

STRATEJİK HEDEF 3.2

Grup ve münferit köy yollarının trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için, trafik işaret ve levhaları tamamlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Köy yollarının toplam ihtiyacı olan trafik işaret ve levhasının tamamlanma oranı (Kümülatif Toplam) (%)	0.0	9.4	33.7	21.6	- 36

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Takılan trafik levhası miktarı (adet)	660 (Yapım İşlemi)	660 (Levha takılması)	1700	850	50
2	Trafik levhası için harcanan kaynak miktarı (YTL)	37,357.62	0.00	200,000.00	153,000.00	76

Değerlendirme:

- ✓ Kurum sorumluluğu altındaki yollara, trafik işaret ve levhalarının asılması, insan can ve mal güvenliği açısından önem kazanmaktadır. 2009 ve 2010 yılında takılan toplam trafik işaret ve levhası sayısı 1510 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam belirlenen hedefin altındadır. 2009–2013 Stratejik Planı dönemi sonunda, 7000 adet trafik işaret ve levhasının, monte işleminin tamamlanması planlanmıştır. Bu zamana kadar gösterilen performans devam ettiği takdirde, hedef yakalanamayacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 4

HALKIMIZA GELİŞMİŞ ÜLKE STANDARTLARINDA BAYINDIRLIK VE İMAR HİZMETLERİ SAĞLANACAKTIR.

STRATEJİK HEDEF 4.1

İl bayındırlık ve imar hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
İl Bayındırlık Müdürlüğünün makine ve teçhizat ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacaktır.					

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	İl Bayındırlık Müdürlüğünün çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için harcanan kaynak miktarı (TL)	6,745.96	29,011.63	48,000.00	45,481.19	95

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL BAYINDIRLIK MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Araç bakım onarım giderleri	Muhtelif	1,776.50	Tamamlandı.
2	Kırtasiye alım giderleri	Muhtelif	13,321.02	Tamamlandı.
3	Bilgisayar yazılım alım gideri	Muhtelif	2,755.00	Tamamlandı.
4	Akaryakıt alımı	Muhtelif	4,882.68	Tamamlandı.
5	Mamul mal alım giderleri	Muhtelif	8,026.99	Tamamlandı.
6	Taşıma giderleri	Muhtelif	13,775.00	Tamamlandı.
7	İlan giderleri	Muhtelif	944.00	Tamamlandı.
TOPLAM			45,481.19	

STRATEJİK HEDEF 4.2

Köy içi yolların ve ortak kullanım tesislerinin daha iyi standartlara kavuşturulması için katkı sağlanacaktır.

Performans Hedefi:


Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Küçük çaplı yatırım yapılan köy sayısı	143	302	200	300	+ 50

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Köy içi imar altyapısını düzeltmek üzere harcanan kaynak miktarı (TL)	478,680.20	1,159,137.40	1,320,000.00	1,645,647.01	125

Değerlendirme:

- ✓ Köy yardımları, küçük çaplı imar hizmetlerini kapsamaktadır. Böylece, küçük ölçekli hizmetlerin, mahallinde karşılanması sağlanarak, para ve zaman tasarrufu yapılmaktadır. 2010 yılı programı içerisinde tahmin edilen 200 yerleşim birimi aşılıarak, yaklaşık 300 yerleşim birimine hizmet götürülmüştür. Konu ile ilgili hedeflenen ödeneğin % 25 üzerinde harcama yapılmıştır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, özellikle belde merkezlerinin daha düzenli hale getirilmesi amaçlı yaptığı yatırımların, son iki yılda olduğu gibi, 2010 yılında da devam etmiştir.
- ✓ Köy yardımları, etkinliği ve kontrol mekanizması iyi sağlandığı takdirde, hizmetin en az maliyetle yapılmasını sağlayan etkin bir yöntemdir.
- ✓ Hizmetin % 41'i İlçe Özel İdareleri, % 29'u ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, % 23'ü Yapı Kontrol Müdürlüğü, % 7'si Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

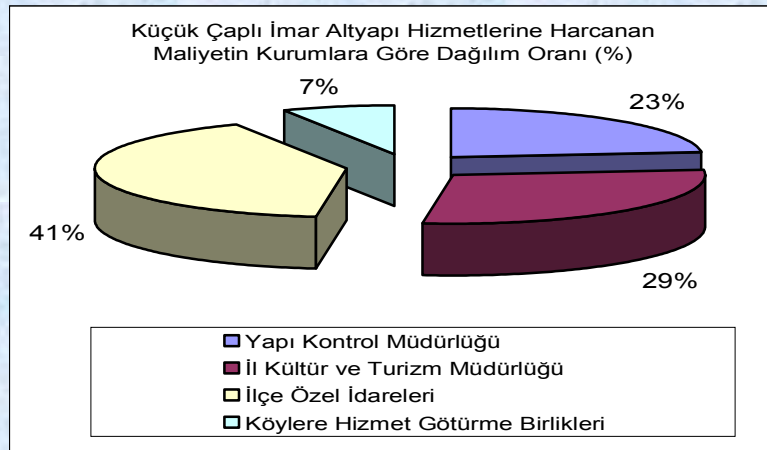

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (adet)	Kaynak	İşin durumu
	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Merkez/ Dedeli, Çamdere, Kabatepe, Söngüt, Karakaya, Daylihacı, Çamlık, Yazıbaşı, Günçalı, Akın, Kocacık, GOP, Acıpınar, Kadıvakfı, Gözova, Killik, Nebiköy, Ulaş, Bağbaşı, Döllük, Çubuklu, Karkın, Çamaltı, Karkıncık, Çökelikkışla, Ballıdere, Kızılöz, Gülpınar, B.Bağlar, Dereyaka, Ulaş, Günevi, Yeşilyurt, Akyurt, Çamağzı, Bedirkale, Bakışlı, Yakacık, Dereagzı, Kızılköy, Çayören, Semerci, Güzelce, Akın, Güğümlü, Kızık, Boyalı, Eski, İhsaniye, Hasanbaba, Batmantaş, Ormanbeyli, Tekneli, Gökdere, Gökçe, Gülpınar, Uğrak, Mülk, Kömeç, Beşören, K.Bağlar, Akyamaç, Çerçi, Keşlik, Kılıçlı, Derekişla, Sarıtarla, Efeköy, Aluç, Aydınca, Ortaören, Beşören, Gülpınar, Pınarlı, Gözova, Tahtoba, Çördük	77	382,750.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, kanalizasyon, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı • <u>Merkez</u>: Çat, Emirseyit, Akbelen, Kemalpaşa, Avlunlar • <u>Artova</u>: Çelikli • <u>Erbaa</u>: Koçak, Akça, Karayaka, Tanoba • <u>Niksar</u>: Yolkonak, Gürçeşme • <u>Reşadiye</u>: Büşürüm, Hasanşeyh, Cimitekte, Bozçalı, Bereketli • <u>Sulusaray</u>: Merkez • <u>Yeşilyurt</u>: Merkez, Koçak • <u>Zile</u>: Yıldıztepe, Güzelbeyli, Evrenköy	23	469,933.24	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: ALMUS İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı • Gümeleönü, Çayönü, Durudere, Alan, Arısu, Çamdalı	6	13,500.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: ARTOVA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Aktaş, Tanyeli, Bayırlı, Kayaönü, Aşağıgüçlü, Ahmetdanişment, Ağmusa, Bebekderesi, Yağcımusa, Taşpınar, Devecikarkın, Yukarıgüçlü, Gazıpınar, Gürardıç, Ulusulu, Mertekli, Evlidere, Sağlıca, Kayaönü, Salur, Iğdır, Kunduzağılı, Yenice, Boyunpınar	24	101,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: BAŞÇİFTLİK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Alan	1	1,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: ERBAA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Ağcaalan, Kaleköy, Küplüce, Pınarbeyli, Hacıali, Gölönü, Gümüşalan, Yaylalı, Eryaba, Karaağaç, İverönü, Demirtaş, Kızılçubuk, Aşağıçandır, Tosunlar, Şükür, Çakır, Çevresu	18	47,400.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: NİKSAR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı • Oluklu, Eryaba, Sarıyazı, Boyluca, Terzioğlu, Geyikgölü, Yeşilkaya, Buzköy, Yeşilyurt, Yeşilhisar, Yalıköy, Budaklı, Çimendüzü, Mercimekdüzü, Yarbaşı, Musapınarı, Direkli, Kaşıkçı, Güdüklü, Akgüney, Büyükyurt, Çiçekli, Güzelyayla, Muhtardüzü, Hanyeri, Ormancık, Sorhun, Pelitlik, Yeşilköy, Dalkaya, Kumçiftliği, Ayvalı, Haydarbey, Ustahasan, Kapağzı, Arıpınar, Hüseyingazi	37	90,380.56	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: PAZAR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı • Beşevler, Tepeçaylı, Taşlık, Dereçaylı, Çayköy, Ovacık, Bağlarbaşı, Ocaklı	8	22,500.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: REŞADİYE İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Dutdibi, Çavuşbeyli, Yoğunpelit, Eyüp, Hebüllü, Kuyucak, Çakmak, Esenköy, Darıderesi, Eymür, Sarıyayla, İslamlı, Bayırbaşı, Güzeldere, Altıparmak, İbrahimşeyh, Çambalı, Karataş, Yağsiyan, Gülburnu, Keteniği, İsmailiye, Karlıyayla, Çakırlı, Taşlıca, Kaşpınar, Bağtatl, Çamlıkaya, Çakraz, Umurca, Gülkonak, Özlüce, Yuvacık, Gurbetli, Güneygölcük, Eyüp, Elmacık, Esenköy	39	216,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: SULUSARAY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Çime, Balıkhisar, Ilıcak, Ballıkaya, Uylubağı, Belpınarı, Alpudere, Tekkeyeni, Sarıyaprak, Beyazıt, Buğdaylı, Arpacıkaraçay	12	62,500.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: TURHAL İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Necip	1	11,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: YEŞİLYURT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Sekücek, Karagözügöllüalan, Bahçebaşı, Damlalı, Çırdak, Karacaören, Doğanca, Yeniköy, Ekinli	9	37,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: ZİLE İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Acısu, Ağcakeçili, Armutalan, Yaylakent, Yünlü, Çiçekpınarı, Güngörmez, Salur, Köylüürünü, Olukman, Çayıroluğu, Karşıpınar, Çamdere, Uğurluören, Yeniderbent, Şeyhköy, Yapalak, Kazıklı, Yeşilce, Haremikişla, Emirdolu, Akkılıç, Gölcük, Büyükkarayün, Fatih, Söğütözü, Kireçli, Uzunöz, Küçüközlü, Korucak, Ede, Sekikişla, Osmanpınarı, Yaraş, Türkderbent, Hasanağa, Bibaşıoğlu, Üyük, Büyükkaköz	39	71,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Merkez ilçe köyleri	Muhtelif	60,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: ALMUS KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Almus köyleri	Muhtelif	30,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: PAZAR KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Ovacık, Taşlık, Menteşe, Ballica, Çayköy	5	29,138.05	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: ZİLE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Derebaşı	1	545.16	Tamamlandı.

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2010 YILI
FAALİYET RAPORU**

**EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR
HİZMETLERİ**



STRATEJİK AMAÇ 1

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE GELİŞMİŞ ÜLKELER DÜZEYİNDE BİR EĞİTİM ALT YAPISI VE ÇEVRE DÜZENİ OLUŞTURMAK.

STRATEJİK HEDEF 1.1

2013 yılı sonuna kadar; ilk ve orta öğretimde il genelinde yoğunlaşma olan 38 adet ilköğretim ile 9 adet ortaöğretim okulunda, derslik başına öğrenci sayısı 30'un altına düşürülecektir.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
1) İlköğretimde yoğunlaşma olan 38 adet ilköğretim okulunda derslik başına düşen öğrenci sayısı	39	37	36	34	+ 6
2) Ortaöğretimde yoğunlaşma olan 9 adet ortaöğretim okulunda derslik başına düşen öğrenci sayısı	38	36	33	34	- 3

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	İlköğretime yönelik olarak yapılan derslik sayısı (adet)	74	72	90	34	38
2	Ortaöğretime yönelik olarak yapılan derslik sayısı (adet)	-	16	24	24	100
3	İlk ve orta öğretime yönelik olarak yeni derslik yapımına harcanan kaynak miktarı (TL)	2,425,778.00	4,602,065.27	10,380,000.0	4,326,121.00	42

Değerlendirme:

- ✓ İlköğretim için yeni derslik yapımında; 2010 yılı için hedeflenen miktarın % 38'ine ulaşılabilmektedir. Yapılan derslik sayısı ile kullanılan ödenek arasında uyum bulunmaktadır. Hedeflenen ödeneğin de % 42'sine ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte üç adet okulda 14 adet derslik yapımı da devam etmektedir. Yapımı devam eden derslikler 2010 yılı performansına dâhil edilmemiştir.
- ✓ Öğrenci yoğunlaşmasının yüksek olduğu merkezlerde, derslik başına düşen öğrenci sayısı, üç yıl içerisinde ilköğretimde 38'den, orta öğretimde ise 39'dan 34'e düşürülmüştür. Bu durum stratejik hedef ile uyumludur. Hedeflenen derslik yapımında istenilen sayıya ulaşılamamasına rağmen, stratejik hedefte başarı sağlanmasının sebebi; 2010 yılında yapılan yeni dersliklerin çoğunluğunun şehir merkezlerinde olmasından ileri gelmektedir. Bu performans devam ettirilebildiği takdirde, 2013 yılı sonuna kadar, yoğunlaşma olan okullarda, derslik başına belirlenen 30 olan öğrenci hedefine ulaşılabilecektir.
- ✓ Orta öğretimde ise belirlenen hedef kadar yeni derslik yapımı gerçekleştirilmiştir. İl genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 25 civarında olmakla birlikte; özellikle şehir merkezlerinde yoğunlaşma olan okullar bulunmaktadır.
- ✓ Okul bakım onarımlarında belirlenen hedefin % 50 üzerinde performans sergilenmiştir. Bu performans belirlenen kaynak hedefinin % 67'si ile gerçekleştirilmiştir. Bu durum onarımların küçük ölçekli olduğunu göstermektedir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi (İLKÖĞRETİM)	Derslik Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Merkez İ.Ö.O. Yapımı	18	1,175,838.00	Tamamlandı.
2	Merkez/Altıntaş Köyü İ.Ö.O. Yapımı	2	87,653.00	Tamamlandı.
3	Erbaa/Hacı Fatma Uslu İ.Ö.O. Ek Derslik Yapımı	8	25,134.00	Tamamlandı.
4	Niksar/Yolkonak Merkez Mah.İ.Ö.O. Ek Derslik Yapımı	2	65,812.00	Tamamlandı.
5	Sulusaray/Ballıkaya Köyü İ.Ö.O. Yapımı	4	499,966.00	Tamamlandı.
6	Erbaa/Hacıpazarı İ.Ö.O. Yapımı	-	0.00	İş devam ediyor. 8 derslik.
7	Niksar/Gürçeşme Kasabası Bodrumlu Derslik Yapımı	-	0.00	İş devam ediyor. 4 derslik.
8	Pazar/Ocaklı Köyü İ.Ö.O. Yapımı	-	0.00	İş devam ediyor. 2 derslik.
TOPLAM		34	1,854,403.00	

Uygulayan Birim: : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi (ORTAÖĞRETİM)	Derslik Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Zile Anadolu Öğretmen Lisesi Yapımı	24	2,471,718.00	Tamamlandı.
TOPLAM		24	2,471,718.00	

STRATEJİK HEDEF 1.2

2013 yılı sonuna kadar, okul öncesi eğitimde okullaşma oranı; 60–72 ay yaş grubunda % 75’e, 36–60 ay yaş grubunda % 25’e çıkartılacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefften Sapma (%)

Performans tanımlaması yapılmamıştır.

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Okul öncesi eğitime yönelik olarak yapılan derslik sayısı (adet)	1	3	10	5	50
2	Okul öncesi eğitime yönelik olarak derslik yapımına harcanan kaynak miktarı (TL)	194,943.00	84,252.00	350,000.00	52,000.00	15

Değerlendirme:

- ✓ Okul öncesi eğitime yönelik olarak yapılması hedeflenen ana okulu sayısının % 50’si yakalanabilmiştir. Esasında; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2010 yılı programında yer alan Merkez ve Turhal da olmak üzere üç yerde 11 derslikli anaokulundan birinin yapımı devam etmekte, 2 adedi ise ihale edilmek üzeredir. Programın uygulamaya aktarılmasında gecikme yaşanmıştır. 2011 yılı içerisinde bu kayıp telafi edilebilecektir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Okul Sayısı	Kaynak	İşin durumu
	Merkez/Yayladalı Köyü İ.Ö.O. Ana Sınıfı Yapımı	-	0.00	İş devam ediyor.

Uygulayan Birim: : KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Okul Sayısı	Kaynak	İşin durumu
	Okul bakım-onarım, çevre düzenleme, güçlendirme vb. faaliyetlerin yapımı - Merkez/Beşerön Köyü İ.Ö.O. Ana Sınıfı Yapımı - Turhal /Fatih İ.Ö.O. Ana Sınıfı Yapımı - Yeşilyurt/Merkez İ.Ö.O. Ana Sınıfı - Zile/Büyükkozluca Köyü Ana Sınıfı Yapımı - Zile/Köylüürünü Köyü Ana Sınıfı Yapımı	5	52,000.00	Tamamlandı.

STRATEJİK HEDEF 1.3

2013 yılı sonuna kadar, Tokat ili merkez ve ilçelerde orta öğretim öğrencilerinin yurt ihtiyacı % 80 oranında giderilecektir.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Yurt ihtiyacının tamamlanma oranı (%)	-	16.00	32.00	16.00	- 100

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Yapılan yeni öğrenci yurdu sayısı (adet)	1	2	2	0	0
2	Yurt yapımı için harcanan kaynak miktarı (TL)	877,176.85	646,204.08	2,000,000.00	0.00	0

Değerlendirme:

- ✓ 2010 yılı hedefleri yakalanamamıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 Yılı Yatırım Programında; Merkez, Niksar da olmak üzere 2 adet yurt 2010 yılı programında yer almış fakat yapı yaklaşık maliyetinin 2010 yılında yetiştirilememesi sebebiyle ihale edilmemiştir. Projelerin, 2011 yılı içerisinde ihalesi yapılarak inşaatlarına başlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.4

İlk ve orta öğretim okullarının kalorifer tesisatı yapımı, çevre düzenlemesi ve bakım ihtiyaçları her yıl belirlenen duruma göre yapılacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Yurt ihtiyacının tamamlanma oranı (%)	İl Milli Eğitim Müdürlüğünün programı doğrultusunda belirlenen okulların çevre düzenlemesi ve bakım onarım ihtiyacı giderilecektir.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapılan okul sayısı (adet)	82	63	100	154	154
2	Bakım onarım için harcanan kaynak miktarı (TL)	2,305,036.53	5,986,879.50	5,000,000.00	3,468,733.35	69
3	Taşımalı eğitim hizmeti için harcanan kaynak miktarı (TL)	1,685,213.39	4,946,112.00	Muhtelif	3,965,141.08	-
4	Menkul mal, mal, mamul mal alımı ve tüketime yönelik harcamalar (yakacak, elektrik, su vb)	1,283,676.80	4,015,167.00	Muhtelif	3,189,644.00	-

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Okul Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	OKUL ÖNCESİ EĞİTİM			
	Okul bakım-onarım, çevre düzenleme, güçlendirme vb. faaliyetlerin yapımı Zile/Anaokulu	1	26,285.00	Tamamlandı.
2	İLKÖĞRETİM			
	Okul bakım-onarım, çevre düzenleme, güçlendirme vb. faaliyetlerin yapımı - Merkez/26 Haziran İ.Ö.O. - Merkez/Bedestenlioğlu İ.Ö.O. - Merkez/Çat Kasabası İ.Ö.O. - Merkez/Kervansaray Köyü İ.Ö.O. - Merkez/Bozatalan Köyü İ.Ö.O. - Merkez/Kızılköy İ.Ö.O. - Merkez/Akın Köyü İ.Ö.O. - Merkez/Beşören Köyü İ.Ö.O. - Merkez/B.Bağlar Köyü İ.Ö.O. - Merkez/Çamağzı Köyü İ.Ö.O. - Merkez/Çökelikkışla Köyü İ.Ö.O. - Merkez/Dedeli Köyü İ.Ö.O. - Merkez/Çubuklu Köyü İ.Ö.O. - Merkez/Gözova Köyü İ.Ö.O. - Merkez/Kadıvakfı Köyü İ.Ö.O. - Merkez/K.Bağlar Köyü İ.Ö.O. - Merkez/Ormanbeyli Köyü İ.Ö.O. - Merkez/Söngüt Köyü İ.Ö.O. - Merkez/Taşlıçiftlik Köyü İ.Ö.O. - Merkez/Ulaş Köyü İ.Ö.O. - Merkez/Kızıllöz Köyü İ.Ö.O. - Merkez/Ortaören Köyü İ.Ö.O. - Merkez/Bağbaşı Köyü İ.Ö.O. (İş devam ediyor) - Merkez Çerçi Köyü İ.Ö.O. (İş devam ediyor.)	52	1,995,502.00	60 adet İ.Ö.O.'nun bakım onarım çalışması 2010 yılında başlanmış fakat 52 adedi tamamlanmıştır. 8 adet okul da onarım çalışması devam etmektedir.

	• Almus/Babaköy İ.Ö.O. • Almus/Çevreli Şehit Abdullah Eymür İ.Ö.O. • Almus/Akarçay YİBO • Almus/Atatürk İ.Ö.O. • Artova YİBO • Başçiftlik İ.Ö.O. • Başçiftlik/Hatipli İ.Ö.O. • Başçiftlik/Karacaören İ.Ö.O. • Erbaa/Doğanyurt İ.Ö.O. • Erbaa/Keçeciler Köyü İ.Ö.O. • Niksar/Kaya İsmet Özden İ.Ö.O. • Niksar/Ulvi Saime Kaya YİBO • Niksar/Albayrak İ.Ö.O. • Niksar/İhsan Karatay İ.Ö.O. • Niksar/Ulucan İ.Ö.O. • Niksar/Çalca Köyü İ.Ö.O. • Niksar/Günebeka İ.Ö.O. • Niksar/Mahmudiye Köyü İ.Ö.O. • Reşadiye/Bereketli İ.Ö.O. • Reşadiye/Taşlıca İ.Ö.O. • Reşadiye/Kızılcaören Köyü İ.Ö.O. • Sulusaray/Dutluca Köyü İ.Ö.O. • Turhal/Cengiz Topel İ.Ö.O. • Turhal/Kazım Karabekir İ.Ö.O. • Turhal/Alparslan İ.Ö.O. • Turhal/Hürriyet Şeker İ.Ö.O. • Turhal/Mehmet Akif İ.Ö.O. • Turhal/Yazıtepe İ.Ö.O. • Turhal/Atatürk İ.Ö.O. • Turhal/Necip Köyü İ.Ö.O. (İş devam ediyor.) • Turhal/Tatlıcak Köyü İ.Ö.O. (İş devam ediyor.) • Turhal/Yenisu Kasabası İ.Ö.O. (İş devam ediyor.) • Turhal/Hacılar Köyü İ.Ö.O. (İş devam ediyor.) • Yeşilyurt/ İ.M.K.B. YİBO			
--	--	--	--	--

	• Zile/Hüseyin Gazi İ.Ö.O. (İş devam ediyor.) • Zile/Melik Gazi İ.Ö.O. (İş devam ediyor.)			
3	ORTA ÖĞRETİM			
	Okul bakım-onarım, çevre düzenleme, güçlendirme vb. faaliyetlerin yapımı • Merkez/Atatürk Lisesi • Merkez/Cumhuriyet Lisesi • Merkez/Gaziosmanpaşa Lisesi • Merkez/Anadolu Lisesi • Merkez/Rehberlik Araştırma Merkezi • Merkez/Yavuz Selim İş Okulu • Merkez/Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler Okulu • Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi • Merkez/Tokat Ticaret Lisesi • Merkez/Tokat Sağlık Meslek Lisesi • Artova Lisesi • Erbaa Ticaret Meslek Lisesi • Niksar Danışmend Gazi Lisesi • Reşadiye Lisesi • Reşadiye/Bereketli Çok Programlı Lise • Reşadiye İmam Hatip Lisesi • Reşadiye Ticaret Meslek Lisesi • Turhal/Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi • Zile/ Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi • Zile/Mesleki Eğitim Merkezi • Merkez/Tokat Kız Meslek Lisesi (İş devam ediyor.) • Merkez/Mesleki Eğitim Merkezi (İş devam ediyor.) • Almus Çok Programlı Lisesi (İş devam ediyor.) • Almus Halk Eğitim Merkezi (İş devam ediyor.) • Pazar Halk Eğitim Merkezi (İş devam ediyor.)	20	659,329.00	28 adet O.Ö.O.'nun bakım onarım çalışması 2010 yılında başlanmış fakat 20 adedi tamamlanmıştır. 8 adet okul da onarım çalışması devam etmektedir.

	• Turhal Kız Meslek Lisesi (İş devam ediyor.) • Zile Endüstri Meslek Lisesi (İş devam ediyor.) • Zile Kız Meslek Lisesi (İş devam ediyor.)			
--	--	--	--	--

Uygulayan Birim : KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Okul Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	İLKÖĞRETİM			
	Okul bakım-onarım, çevre düzenleme, güçlendirme vb. faaliyetlerin yapımı • <u>Merkez</u>: Kabakboğazı, Kabatepe, Çerçi-Avara, Kızılöz • <u>Almus</u>: Atatürk, Üçgöl • <u>Artova</u>: Gazipaşa, Altınova, Çelikli, A.Güçlü, Y.Güçlü, Boyunpınar, Yağcımus, Bayırlı, Sağlıca, Gürardıç, Ahmetdanişment, Ağmusa, Devecikarkın, Salur, İğdir, Kunduzağlı • <u>Erbaa</u>: Üzümlü, Mehmet Akif • <u>Niksar</u>: Dr.İsmet Sakarya, Serenli, Budaklı, Karakaş, Yavuz Selim, Eryaba, Gözpınar, Gökçeli • <u>Pazar</u>: Ovayurt, Tatar • <u>Reşadiye</u>: Mehmet Akif, Atatürk, Kelkit, Bozcalı, Demircili, Nebişeyh, Çamlıkaya • <u>Sulusaray</u>: Balıkhisar • <u>Turhal</u>: Yeşilırmak, Şatroba, G.O.P., Kat-Uzunyurt, Kayaören, Kalaycık, Fatih • <u>Yeşilyurt</u>: Ekinli, Bütet, Kuşcu, Gündoğan, Yunus Emre, Yeniköy, Çırdak, Milli Hakimiyet, Çıkrık • <u>Zile</u>: Ayvalı, Boldacı, Büyükkozluca, Çayır, Derebaşı, Kireçli, Köylüürünü, Kurupınar, Uzunöz, Yapalak, Yeşilce, Merkez 12 adet İ.Ö.O.	81	787,617.35	Tamamlandı.

STRATEJİK AMAÇ 2

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDEKİ ÖĞRENCİLERİN SPOR YAPABİLECEĞİ OKUL SPOR TESİSLERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER SEVİYESİNE ÇIKARTILACAKTIR.

STRATEJİK HEDEF 2.1

2009–2013 yılları arasında, yapılacak küçük tip kapalı spor salonları ile ihtiyacın % 40'ı karşılanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Küçük tip kapalı spor salonu tamamlanma oranı (%)	-	0.00	8.00	0.00	- 100

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Yapılan küçük tip kapalı spor salonu sayısı (adet)	-	-	1	0	0
2	Küçük tip kapalı spor salonu için harcanan kaynak miktarı (TL)	-	-	750,000.00	0.00	0

Değerlendirme:

- ✓ Hedeflenen spor salonu yapımı 2010 yılında başlamış fakat halen yapım aşaması devam etmektedir. Herhangi bir harcama 2010 yılı içerisinde yapılmamıştır.

Uygulayan Birim: : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Erbaa/Karayaka Başaralar YİBO Spor Salonu Yapımı	-	0.00	İş devam ediyor.
TOPLAM		-	0.00	

STRATEJİK AMAÇ 3

TÜM TOKAT HALKINA HİZMET SUNABİLECEK SPOR TESİSLERİNİ İNŞA ETMEK VE İŞLERLİĞİNİ SAĞLAMAK.

STRATEJİK HEDEF 3.1

Spor çeşitliliğini artıracak ve ihtiyacı karşılayacak modern spor tesisleri kazandırılacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
İhtiyaç doğrultusunda spor tesisleri yapılacaktır.	Performans tanımlaması yapılmamıştır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Yapılan spor tesisi sayısı (adet)	3	0	5	0	0
2	Yapılan spor tesisi için harcanan kaynak miktarı (TL)	1,565,383.63	0.00	1,600,000.00	0.00	0

Değerlendirme:

- ✓ Spor tesisi yapımı, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün programları doğrultusunda yürütülmektedir. 2010 yılı için yapılması planlanan spor tesislerinin, yapımına başlanamamıştır. Bu projelerden Reşadiye Sentetik Futbol Sahası, Artova ve Başçiftlik Kapalı Spor Salonu yapımlarına proje hazırlık aşamalarının tamamlanamaması sebebiyle 2010 yılına yetiştirilememiştir. Bununla birlikte; söz konusu tesislerin, 2011 yılı başlangıcında ihaleleri gerçekleştirilmiş ve iş teslimleri yapılmıştır. Ayrıca, 2010 yılında Merkez Bedestenlioğlu ve Yeşilyurt İlçesinde yapılması planlanan spor tesislerinin ihaleleri ise, tapu ve arsa problemleri sebebiyle gerçekleştirilememiştir. Söz konusu tesislerin yapımına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

STRATEJİK HEDEF 3.2

Mevcut spor tesislerinin belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, bakım onarımı sağlanacak ve işlerliğine katkıda bulunulacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Spor tesislerinin işlerliğinin sağlanması için, tesislerin yıllık bakım ve onarımları sağlanacaktır.	Performans tanımlaması yapılmamıştır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Bakım ve onarım yapılan tesis sayısı (adet)	muhtelif	muhtelif	muhtelif	muhtelif	-
2	Bakım onarım ve çeşitli idari giderler için harcanan kaynak miktarı (TL)	99,478.14	193,594.14	350,000.00	677,022.33	193

Değerlendirme:

- ✓ 2010 yılı içerisinde, spor tesisleri bakım onarım ve idari giderler için yapılan destek miktarı, belirlenen hedefin yaklaşık 2 katına ulaşmıştır. İlk olarak da Turhal Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, İlçedeki spor tesislerinin bakım onarımına kaynak ayrılmıştır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Ali Şevki Erek Kapalı Yüzme Havuzu bakım onarımı	-	77,620.40	Tamamlandı.
2	Niksar ve Erbaa Spor Salonları bakım onarımları	-	60,770.00	Tamamlandı.
3	Merkez Uzunburun Çim futbol sahasının uzatılması	-	70,800.00	Tamamlandı.
4	Pazar Spor Salonu bakım onarımı	-	44,191.00	Tamamlandı.
5	Çevreli Güreş Eğitim Merkezi bakım onarımı	-	17,740.96	Tamamlandı.
6	Tenis Kortu bakım onarımı	-	5,982.60	Tamamlandı.
7	Diğer gayrimenkul mal bakım onarım gideri	-	170,204.05	Tamamlandı.
8	Mamul mal alım giderleri	-	52,638.50	Tamamlandı.
9	Hizmet alım giderleri	-	84,699.82	Tamamlandı.
10	Gayrimenkul sermaye üretim giderleri	-	18,690.00	Tamamlandı.
TOPLAM			603,337.33	

Uygulayan Birim: : KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Turhal Spor Tesisleri Bakım Onarımı	2	73,685.00	Tamamlandı.
TOPLAM			73,685.00	

STRATEJİK AMAÇ 4

GENÇLERİMİZİ SPORTİF EĞİTİM VE FAALİYETLERE YÖNLENDİREREK, DAHA SAĞLIKLI VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK BİR NESİL YETİŞTİRİLMESİNE KATKIDA BULUNMAK.

STRATEJİK HEDEF 4.1

Amatör spor faaliyetlerinde başarının artırılabilmesi için gerekli eğitim, yarışma, ödüllendirme, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, sporcu ve çalıştırıcılara katkı, vb. her türlü destek sağlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefften Sapma (%)
Amatör spor faaliyetlerinde bulunan gençlerin, spor malzemesi ihtiyaçlarının karşılanmasına destek sağlanacaktır.	Performans tanımlaması yapılmamıştır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Spor malzemesi alımı için harcanan kaynak miktarı (TL)	86,934.73	73,134.96	160,000.00	62,769.92	39
2	Gençlik Merkezi faaliyetlerine yapılan katkı miktarı (TL)	22,550.00	11,835.62	125,000.00	60,879.52	49

Değerlendirme:

- ✓ 2010 yılı içerisinde, amatör spor faaliyetleri ve Gençlik Merkezine yapılan katkı, belirlenen hedefin yaklaşık yarısında kalmıştır. Spor malzemesi alımı son üç yıl içerisinde devamlı bir azalma halindedir. Bu durum, spor malzemesi ihtiyacı ile ilgilidir. Gençlik Merkezi faaliyetlerine yapılan ödenek miktarı ise son yıllardaki duruma göre oldukça yükselmiş fakat belirlenen hedefin altında kalmıştır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Merkez ve ilçe spor tesislerimizde kullanılmak üzere spor malzemesi alımı	Muhtelif	62,769.92	Tamamlandı.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Gençlik eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılan giderler	Muhtelif	60,879.52	Tamamlandı.

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2010 YILI
FAALİYET RAPORU**

TARIMSAL HİZMETLER



STRATEJİK AMAÇ 1**TARIMSAL ÜRETİM VE HAYVANCILIK GELİRİNİ ARTIRMAK.****STRATEJİK HEDEF 1.1**

Mevcut bitkisel ve hayvansal üretimi ve verimliliği artıracak ve de mevcut üretim deseninde yeni alternatif bitkilerin yer almasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Mevcut tarımsal ve hayvansal üretimde, katma değeri yüksek üretim yapısına ve üretim miktarına ulaştırmaya yönelik destek sağlanacaktır.	Performans tanımlaması yapılmamıştır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Sebze, meyve, çilek yetiştiriciliği, kesme çiçek üretimi, plastik tünel ve farklı alternatif ürünlerin yöreye adaptasyon uygulamaları ile patates tohumluk üretimini geliştirmek amacıyla yürütülen proje tipi sayısı (adet) (AR-GE dahil)	15	10	12	14	117
2	Hayvancılığı geliştirme amaçlı yapılan proje sayısı (adet) (AR-GE dahil)	2	2	0	2	-
3	Bitkisel üretimi geliştirmek amacıyla yapılan projelere,	252,924.57	317,779.95	465,000.00	516,348.50	111

	faaliyetlere ve idari giderlere harcanan kaynak miktarı (TL) (AR-GE dahil)					
4	Hayvancılığı geliştirme amaçlı projelere ayrılan kaynak miktarı (TL) (AR-GE dahil)	35,810.99	121,000.00	0	136,216.03	-
5	Tarımsal projelerin takibi, makine tamir bakım, ihale masrafları, çeşitli plan ve rapor hazırlama masrafları, yakıt giderleri ve büro malzemesi alım için destek sağlanması amacıyla sağlanan kaynak miktarı (TL)	140,762.90	50,000.92	20,000.00	18,056.88	90
6	AR-GE çalışması yapılan proje sayısı	5	5	6	9	150
7	AR-GE projelerine ayrılan kaynak miktarı (TL)	11,682.09	38,627.09	165,000.00	229,107.93	139

Değerlendirme:

- ✓ Bitkisel üretimi geliştirmeye yönelik olarak son üç yıl içerisinde, kaynak miktarında artış sağlanmıştır. Özellikle sera ile ilgili destekleme programlarına oldukça önemli bir kaynak ayrılmıştır. Ayrıca fidan ve tohumluk teminine yönelik faaliyetler diğer yıllarda da olduğu gibi 2010 yılında da devam ettirilmiştir. AR-GE faaliyetlerinin, 2/3'ü bitkisel üretimin geliştirilmesine yöneliktir.
- ✓ 2010 yılında hayvancılığı geliştirmeye yönelik herhangi bir proje öngörülmemiş olmakla birlikte, AR-GE faaliyetleri kapsamında iki adet proje uygulamaya alınmıştır. Bunlar balıkçılık ve koyunculüğün geliştirilmesi üzerinedir.
- ✓ 2010 yılında AR-GE faaliyetlerinde artış sağlanmıştır. Hem proje hem de kaynak miktarı belirlenen hedefin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu durum AR-GE faaliyetlerine verilen önemin göstergesidir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Proje Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Meyveciliği geliştirme amacıyla fidan dağıtım projeleri sayısı • 12000 adet Ceviz Fidanı Alımı	1	30,000.00	Tamamlandı.
2	Tarla üretimini geliştirme amacıyla tohum dağıtımı yapılan projeler sayısı • Sebze tohumu alımı • Baklagil tohumu alımı • Hububat tohumu alımı	3	11,700.60	Tamamlandı.
3	23 adet Plastik Örtülü Sera Yapımı	1	250,000.00	Tamamlandı.
4	Tarımsal Alan İle İlgili Yayın Hizmeti • Tokat İli Tarımsal Yapısı ve Potansiyeli İsimli Kitap Basımı (500 adet) • 8. Bölge Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı Sonuçları İle İlgili Kitap Basımı (500 adet)	2	16,756.00	Tamamlandı.
5	Tarımsal projelerin takibi, makine tamir bakım, ihale masrafları, çeşitli plan ve rapor hazırlama masrafları ve büro malzemesi alımı için destek sağlanması • İhale ilanı masrafları • Posta masrafları • Kırtasiye malzemesi alımı • Otomobil lastiği alımı	Muhtelif	18,056.88	Tamamlandı.
TOPLAM			326,513.48	

Uygulayan Birim: : GOP ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Proje Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Başçiftlik Beyazı Yerel Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşidinden Seçilen Ümitvar Klonların Performanslarının Belirlenmesi	1	4,800.00	2010 yılı sonuçları alınmıştır.
2	Tokat ve Yöresinde CIP Kaynaklı Ümitvar Klonların ve Başçiftlik Beyazı Yerel Genotipinin Değerlendirilmesi	1	18,060.00	2010 yılı sonuçları alınmıştır.
3	Tokat Yöresinde Domates ve Biber Tarımının Geliştirilmesi - Farklı Yetiştirme Koşullarında Bazı Aşılı Bitkilerin Biberde Verim, Kalite ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi (Sonuçlandırılmamıştır.) - Tokat Yöresinde Açıkta Sırik Domates Yetiştiriciliğinde Hasat Periyodunun Geciktirilmesinin Verim ve Ürün Fiyatı üzerine Etkisi - Tokat Yöresinde Domates ve Biber Tarımı Yapılan Alanlarda Karşılaşılan Önemli Hastalıklar ve Fizyolojik Bozuklukların Teşhisi ve Mücadele Alternatiflerinin Belirlenmesi	2	26,214.50	3 alt projeden ikisinden 2010 yılında sonuç alınmıştır.
4	Tokat Bağcılığının Geliştirilmesi Projesi - Çardak Sistem Sofralık Üzüm Yetiştiriciliği	1	32,000.00	2010 yılı sonuçları alınmıştır.
5	Bölge Balıkçılığının Sürdürülebilirliği İçin Sertifikalı Yavru Balık Üretim Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi	1	37,180.03	2010 yılı sonuçları alınmıştır.
6	Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Projesi	1	8,817.40	2010 yılı sonuçları alınmıştır.
7	Geri Dönüşümlü Bafra Koyunu Yetiştiriciliği Projesi	1	99,036.00	2010 yılı sonuçları alınmıştır.
TOPLAM		8	226,107.93	

Uygulayan Birim: : TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Proje Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Tokat Yöresi Kanola Üretiminde Potansiyel Üretim Alanları ve Verimin Belirlenmesi Demonstrasyon Alanları: • Merkez/Enstitü • Artova/Yağcımusa (Sonuçlanmamıştır.) • Erbaa/Karayaka • Niksar/Bayraktepe (Sonuçlanmamıştır.) • Turhal/Dökmetepe (Sonuçlanmamıştır.) • Zile/Evrenköy • Başçiftlik/Merkez (Sonuçlanmamıştır.) • Reşadiye/Çayırpınar • Almus/Çevreli	1	3,000.00	9 farklı lokasyonda yapılan çalışmaların 5 adedi sonuçlandırılmıştır.
TOPLAM		1	3,000.00	

Uygulayan Birim: : TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ - KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Proje Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Sertifikalı Buğday Tohumluğu Dağıtım Projesi • Artova • Sulusaray • Turhal • Yeşilyurt • Zile	1	115,000.00	Tamamlandı.
TOPLAM		1	115,000.00	

STRATEJİK HEDEF 1.2

Üretici birliklerine üye olan çiftçi sayısı 2009–2013 beş yıllık dönem içerisinde 3000 adete çıkartılacaktır.

Performans Hedefi:


Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Üretici ve yetiştirici birlikleri üye sayısı	1442 (Üretici)	2400 (Üretici)	2500 (Üretici)	2529 (Üretici)	- 10
	1461 (Yetiştirici)	1900 (Yetiştirici)	2500 (Yetiştirici)	1968 (Yetiştirici)	

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Üretici yetiştirici birliklerine harcanan kaynak miktarı (TL)	65,235.93	44,987.96	60,000.00	55,000.00	92

Değerlendirme:

- ✓ Üretici ve yetiştirici birliklerinin amacı, tüm çiftçileri ve yetiştiricileri birlik çatısı altına almaktır. Böylece faaliyetlerinin etkinliğini artıracak ve üyelerinin çıkarlarını koruyabilecektir. Son üç yıl içerisinde üye sayısında devamlı bir artış sağlanmıştır.

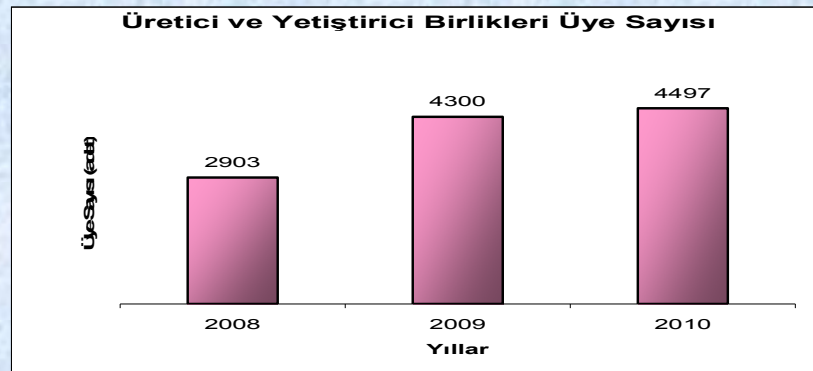

- ✓ Konu ile ilgili Özel İdarenin sağladığı kaynak miktarı belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleşmiştir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Birlik Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Destekleme yapılan üretici birlikleri: - Niksar, Zile, Tokat, Turhal, Reşadiye, Almus Süt Üreticileri Birliği - Merkez Koyun-Keçi Üreticileri Birliği - Tokat, Turhal, Pazar Sebze Yetiştiricileri Birliği - Niksar Organik Meyve Üreticileri Birliği	11	55,000.00	Tamamlandı.
TOPLAM			55,000.00	

STRATEJİK AMAÇ 2**İNSAN, HAYVAN VE BİTKİ SAĞLIĞINI KORUMAK.****STRATEJİK HEDEF 2.1****İnsan, hayvan ve çevre sağlığının iyileştirilmesine ve korunmasına yönelik projeler geliştirilecektir.****Performans Hedefi:**

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Hayvancılıkta hijyen sağlanması ve kayıt altına alınması, yabani hayvan zararının azaltılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir.	Performans tanımlaması yapılamamıştır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Destek sağlanan, hayvan ve bitki hastalıklarını önlemeye yönelik faaliyet veya proje sayısı	muhtelif	2	2	3	150
2	Hayvanların kayıt altına alınması amacıyla alınan küpe sayısı	8000	8000	10000	0	0
3	Yabani domuzla mücadeleye yönelik olarak alınan av fişegi sayısı	19700	8922	10000	17435	174
4	Faaliyetler için harcanan kaynak miktarı (TL)	25,177.60	27,681.04	90,000.00	49,449.33	55

Değerlendirme:

- ✓ Hayvan ve bitki hastalıklarının önlenmesine yönelik faaliyet sayısı ve domuzla mücadeleye yönelik alınan fişek sayısı, belirlenen hedefin üzerinde gerçekleştirilmiş fakat belirlenen ödeneğin ancak yarısı kullanılmıştır. Hayvanların kayıt altına alınmasıyla ilgili küpe alımı, 2010 yılında yapılmamıştır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Hayvan sağlığının korunmasına yönelik alınan aşı miktarı (doz) S-19 aşısı alımı	8000	9,000.00	Tamamlandı.
2	Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı ile mücadele için alınan ilaç sayısı (adet)	4000	24,796.80	Tamamlandı.
3	Alınan av fişeği sayısı (yabani domuz için) (adet)	17435	10,001.97	Tamamlandı.
4	Boş zirai ilaç kutusu toplatma projesi kapsamında alınan zirai ilaç miktarı (adet)	2280	5,650.56	Tamamlandı.
TOPLAM			49,449.33	

STRATEJİK AMAÇ 3

TARIMSAL ÜRETİMDE TOPRAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRICI VE MİNİMUM GİRDİ (GÜBRE, SU, İLAÇ VB) KULLANIMINI SAĞLAYICI YÖNTEMLERİ ARTIRMAK.

STRATEJİK HEDEF 3.1

Tarımda toprak analizine göre gübre uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacak ve laboratuvar hizmetleri gelişmiş ülkeler seviyesine getirilecektir.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Laboratuvar hizmetlerinin, tarıma çok yönlü katkı sağlaması için gerekli olan cihaz ve kimyasal alımları gerçekleştirilecektir.	Performans tanımlaması yapılamamıştır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Çiftçilere destek kapsamında; yapılan toprak analizi sayısı (adet)	18000	27000	27000	40000	148
2	Laboratuvar cihaz alımı	Muhtelif	Muhtelif	Muhtelif	Muhtelif	-
3	Laboratuvar hizmetleri için harcanan kaynak miktarı (TL)	98,007.27	70,012.65	70,000.00	39,135.91	56

Değerlendirme:

- ✓ Laboratuvar hizmetleri kapsamında planlanan faaliyetler gerçekleştirilmiş ve planlanan ödeneğin % 56'sı düzeyinde harcama yapılmıştır.
- ✓ Harcanan ödeneğin % 77'si Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, % 23'ü ise İl Tarım Müdürlüğü tarafından kullanılmıştır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Proje Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Yem analiz laboratuvarına azot protein tayin cihazı alımı	Muhtelif	1,680.00	Tamamlandı.
2	İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne laboratuvar malzemesi, kimyasal ve cam malzeme alımı	Muhtelif	7,455.91	Tamamlandı.
TOPLAM			9,135.91	

Uygulayan Birim: : TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Çiftçilere destek kapsamında, yapılan toprak analizi sayısı (adet)	40000	30,000.00	Tamamlandı.
TOPLAM			30,000.00	

STRATEJİK HEDEF 3.2**Organik tarım ürünleri yetiştiriciliği yaygınlaştırılacaktır.****Performans Hedefi:**

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Organik tarım ürünlerinin yetiştiriciliğinin, tarımsal ürün yetiştiriciliği içerisinde payı artırılacaktır.	Performans tanımlaması yapılamamıştır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Organik tarım amacıyla alınan sertifika sayısı	0	1	2	1	50
2	Organik tarım sertifikası almak için harcanan kaynak miktarı (TL)	0.00	5,000.00	10,000.00	5000	50

Değerlendirme:

- ✓ Organik tarım ürünleri yetiştiriciliği, tarım alanında önemli fırsatlar sunmaktadır. Özellikle Tokat tarımı için çok önemli pazar imkânları sağlayacaktır. Bu konunun önemine binaen, konu, İl Özel İdaresi Stratejik Planı içerisinde desteklenen konular içerisinde yer almıştır. 2010 yılında 1 adet sertifika alınmıştır. Özellikle bu sertifikanın grup sertifikası olması çok önemlidir. Birçok çiftçiye ve komple bir yöreyi ilgilendirmektedir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Alınan organik tarım sertifikası miktarı (adet) (Niksar Serenli Organik Meyve Üreticileri Birliği)	1 (Grup Sertifikası)	5,000.00	Tamamlandı.

STRATEJİK HEDEF 3.3

Tarımda minimum girdi (gübre, su, ilaç vb.) kullanımına yönelik çiftçilerin bilgilendirilmesi artırılacak ve bu yönde olumlu gelişmeler sağlanacaktır.

2010 yılı için herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.

STRATEJİK HEDEF 3.4

Tarımsal üretim ve yatırım kararlarında verimliliği artırıcı, toprak ve su kaynakları veri tabanı çalışmaları başlatılacak ve arazi çalışmaları tamamlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Toprak su kaynakları veri tabanı hazırlama faaliyetinin gerçekleşme oranı (%)		0	10	0	- 10

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Konu ile ilgili kurumların belirlenmesi ve proje yönetimin oluşturulması	-	0	1	0	0
2	Konu ile ilgili projenin hazırlanması		0	1	0	0
3	Harcanan kaynak miktarı (TL)		0.00	5,000.00	0	0

Değerlendirme:

- ✓ Toprak ve su kaynakları veri tabanı hazırlanması, 2009–2013 İl Özel İdaresi Stratejik Planı içerisinde yer almıştır. Projenin sorumlusu Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü olarak belirlenmiştir. Proje gerek başlangıç aşamasında ve gerekse uygulama aşamasında çok fazla emeği ve farklı disiplinler arası çalışmayı gerektirmektedir. Konunun uygulamaya aktarılması için, ilk aşamada projenin ortaya konması, eylem planının hazırlanması ve maliyetinin ortaya çıkartılması gerekmektedir. Buna rağmen; bu zamana kadar konu ile ilgili olarak herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Ödenek kullanımı da gerçekleşmemiştir.

STRATEJİK AMAÇ 4

TÜM TARIM ALANLARINA YETERLİ OLABİLECEK SU KAPASİTESİ OLUŞTURULARAK; ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ SU KULLANIMI PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE, TÜM TARIM ALANLARINA SULAMA TESİSİ İNŞA EDİLECEKTİR.

STRATEJİK HEDEF 4.1

2009–2013 yılları arasında; toplam gölet su tutma kapasitesi 3 milyon m³ artırılabacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Artırılan su tutma kapasitesi miktarı (m ³)	1,416,574.00	110,000.00	1,500,000.00	0.00	-100

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	İnşaatı yapılan sulama amaçlı gölet sayısı (adet)	7	2 (1 adet onarım)	3	1 (İş devam etmektedir.)	33
2	Gölet yapım ve onarımlarında harcanan kaynak miktarı (TL)	1,017,215.00	521,472.23	2,130,000.00	147,503.00	7

Değerlendirme:

- ✓ 2010 yılı için 3 adet göletin yapılması planlanmış fakat 1 göletin yapımına başlanabilmiştir. Yapımına başlanan Çevreli Göleti, uzun yıllardır yapılması planlanan ve yaklaşık 1.5 milyon m³ su tutma kapasitesine sahip yüksek kapasiteli bir yatırımdır. Göletin yapımının, 2012 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
- ✓ Stratejik hedef olarak 2009–2013 yılları içerisinde, toplam 3 milyon m³ hedefi belirlenmiştir. 2009 yılında yapılan göletlerin kapasitesi çok küçüktür. Çevreli göleti ile birlikte önemli bir su tutma kapasitesi artışı sağlanabilecek olsa da hedefin yakalanabilmesi için gölet yatırımlarının devam etmesi gerekmektedir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Su Tutma Kapasitesi (m ³) ve Planlanan Sulama Alanı (ha)	Kaynak	İşin durumu
1	Almus Çevreli Göleti	-	112,503.00	İş devam ediyor.

Uygulayan Birim: : KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Proje Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Gölet temizlenmesi yapılması • <u>Erbaa</u> : Karaağaç, Kozlu	2	35,000.00	Tamamlandı.

STRATEJİK HEDEF 4.2

2009–2013 yılları arasında; yapılacak yer altı sulama başvuruları DSİ ile ortak çalışma ile sonuçlandırılarak, ekstra 750 m³/h su kapasitesi elde edilecektir.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefften Sapma (%)
Artırılan sulama suyu kapasitesi miktarı (m ³ /h)	432	324	150	72	- 52

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Su dağıtım veya terfi hattı yapılarak faaliyete geçirilen yer altı suyu kuyusu sayısı	6	4	2	2	100

Değerlendirme:

Yer altı suyu ile sulama faaliyetleri DSİ ile birlikte sürdürülmektedir. İşletmeye açılan kuyulardan, 2 adedi bu sene içerisinde faaliyete geçirilmiştir. Faaliyete geçirilen kuyu sayısı planlanan hedefler ile uyumlu olmasına rağmen, kuyu kapasitelerinin düşük olması sebebiyle, alınan su debisi açısından istenilen seviyeye ulaşamamıştır. 2008 ve 2009 yıllarındaki yapılan yatırımlar ile sulama tesisi yapılmayı bekleyen yer altı kuyusu sayısı azaltılmıştır. Bu sebepten dolayı, önümüzdeki dönemde sulama tesisi yapılan kuyu sayısının azalması normaldir. Konu ile ilgili olarak belirlenen performans hedefi; beş yıllık stratejik plan dönemi için 750 m³/h'dir. 2009 ve 2010 yıllarında yapılan faaliyetler ile bu hedefin % 53'üne ulaşılmıştır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktar	Kaynak	İşin durumu
1	Merkez/Kabatepe 1 adet yer altı sulama kuyusu kapasitesi (m ³ /h)	36	DSİ	Pompa montajı yapılacak.
2	Zile/Hacılar 1 adet yer altı sulama kuyusu kapasitesi (m ³ /h)	36	DSİ	Pompa montajı yapılacak.

STRATEJİK HEDEF 4.3

2009–2013 yılları arasında; toplam 6500 ha alana hitap edebilecek sulama tesisi inşa edilecektir.

Performans Hedefi:



Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedeffen Sapma (%)
Yapılan tesisler ile sulanan alan (ha)	1087	1105	1100	1556	+ 42

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Açık kanal sulama suyu tesisi inşaatı sayısı (Su kaynağı cazibe veya pompa) (adet) (Malzeme yardımı dahil)	67	40	51	54	106
2	Kapalı sistem (yağmurlama, damla, basınçsız) sulama suyu tesisi inşaatı sayısı (Su kaynağı cazibe veya pompa) (adet)	3	9	8	12	150
3	Su kaynağı pompa ile sağlanan açık kanal sulama suyu tesisi sayısı (adet)	5	2	3	4	133
4	Su kaynağı pompa ile sağlanan kapalı sistem sulama suyu tesisi sayısı (adet)	2	7	3	5	167
5	Sulama tesislerinin onarımlarının yapılması için malzeme yardımı yapılan köy sayısı	15	11	10	4	40
6	Drenaj tesisi sayısı (adet)	-	-	-	1	-
7	Sulama suyu tesisi yapımına yönelik yapılan harcama tutarı (TL)	2,582,500.74	2,798,166.36	5,000,000.00	4,177,829.67	84


Değerlendirme:

- ✓ 2010 yılında yapılması planlanan sulama alanının, % 42 üzerine çıkmıştır. Son iki yılda 5 yıllık dönemde yapılması planlanan 6500 ha alanın yaklaşık % 41'i yapılmıştır. Bu performans devam ettirilebildiği takdirde, 5 yıl içerisinde hedeflenen rakama çok rahatlıkla ulaşılabilecektir. Esasında çok daha büyük sulama alanlarına ulaşmak mümkündür. Fakat sulama projelerinin birçoğu küçük çaplı projelerdir ve eski sulama tesislerinin onarımını veya tamamlamasını içermektedir.
- ✓ 2010 yılı içerisinde tüm sulama projelerinde hedefin üzerine çıkmıştır. Esas artış ise kapalı sistem sulama tesislerinde meydana gelmiştir. Planlananın % 50 üzerinde proje gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında malzeme yardımı ile yapılan proje sayısı azalmıştır. Planlananın % 40'ı düzeyinde gerçekleşmiştir.
- ✓ 2010 yılı içerisinde yapılan sulama projelerinin % 82'sini açık kanal sulama tesisleri oluşturmuş fakat harcanan ödeneğin % 45'ini kullanmıştır. Bu durum açık kanal sulama tesisi yapımının terke edilmeye başlandığını, büyük çaplı projelerin kapalı sistemlere kaydığının göstergesidir. Bununla birlikte kapalı sistemde yer alan ödeneğin % 38'i hibe programı kapsamında sağlanan kaynaktır.

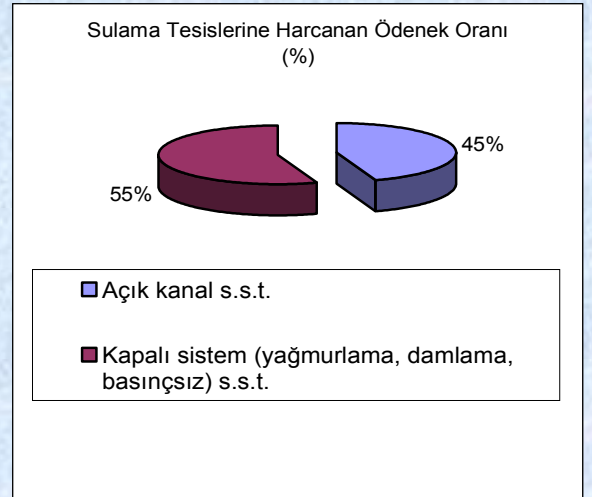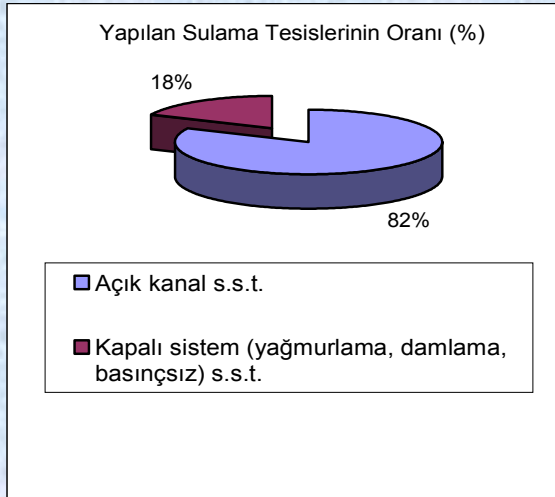

Değerlendirme (devamı):

- ✓ Pompa tesisi ile su kaynağı temin edilen proje oranı açık tesislerde % 7, kapalı tesislerde ise % 42 olarak 2010 yılı içerisinde gerçekleşmiştir. Bu durum pompaj tesislerinin genel olarak kapalı sistem yapıldığını göstermektedir. Esasında bu durum, Mülga KHGM ile DSİ arasında yapılan protokolün gereği olarak devam etmektedir. Çok doğru bir yaklaşımdır. Bir maliyet sonucu elde edilen suyun, verimli bir tesisi ile nakledilmesi en uygun yaklaşımdır. Toplam sulama tesisleri içerisinde pompaj tesislerinin oranı ise % 14'dür.
- ✓ 2010 yılı içerisinde yapılan sulama tesisleri ile sulanan alanların % 71'i kapalı sistem sulama tesisleri ile sağlanmıştır. Bunun sebebi açık sistem sulama projelerinin küçük ölçekli olması ve birçoğunun tamamlama projesi niteliği taşımasından ileri gelmektedir. Bununla birlikte kapalı sistem sulama tesislerinin, açık kanal sulama tesislerine göre daha verimli olması da bu oranın kapalı sistem sulama tesisleri lehine olmasında etkili olmuştur.
- ✓ 2010 yılı içerisinde yapılan sulama tesislerine göre kapalı sistem sulama tesislerinin alana maliyeti, açık kanal sulama tesislerine göre yaklaşık yarı maliyetindedir. Bu miktarın çıkmasında yukarıda da bahsetmiş olduğumuz sebeplerin etkisi bulunmaktadır. Bu miktar yıllara göre değişiklik göstermektedir. 2008 ve 2010 yıllarında bu miktar kapalı sistem lehine iken 2009 yılında açık kanal lehine olmuştur. Bununla birlikte kapalı sistemlerin etkinliği ve daha uzun ömürlü olması, kapalı sistemlerin, uygulanabilecek alanlarda mutlaka tercih edilmesi gerektiğini göstermektedir.

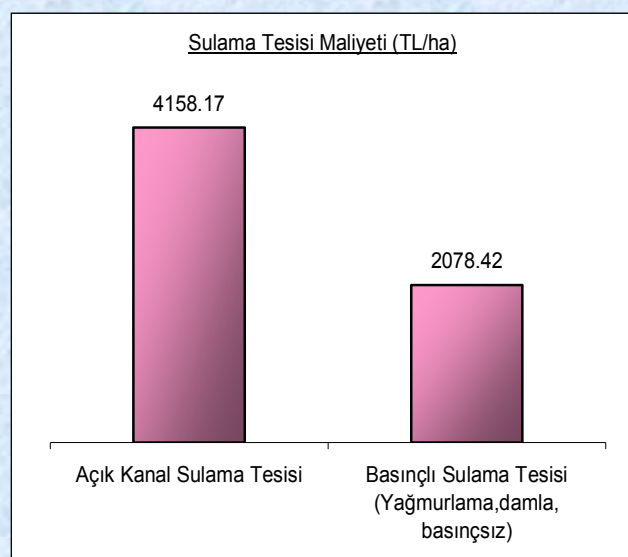

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Su Kaynağı Tipi	Sulama Tesisi Tipi	Sulama Alanı (ha)	Kaynak	İşin durumu
1	Merkez/Fırındere S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	82,239.00	Tamamlandı.
2	Merkez/Semerci S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	13		Tamamlandı.
3	Merkez/Çördük S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	48	124,299.00	Tamamlandı.
4	Merkez/Daylıhacı S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-		Tamamlandı.
5	Merkez/İhsaniye S.S.T. Yapımı (Derivasyon)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-		Tamamlandı.
6	Merkez/Kadıvakfı S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	76,988.00	Tamamlandı.
7	Merkez/Çamdere S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	21		Tamamlandı.
8	Merkez/Keşlik Göletten Yağmurlama S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Kapalı Sistem	-	215,000.00	İş devam ediyor.
9	Merkez/Yayladalı Kapalı Sistem S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Kapalı Sistem	42	189,418.00	Tamamlandı.
10	Merkez/Gözova Pompa Kanalları S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Pompa	Açık Kanal	-		Tamamlandı.
11	Merkez/Yelpe S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	8	18,418.00	Tamamlandı.
12	Erbaa/Çerkezfındıcak S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	34,900.00	Tamamlandı.
13	Niksar/Arıpınarı S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	101,623.00	Tamamlandı.
14	Niksar/Işıklı S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	26		Tamamlandı.
15	Reşadiye/Yolüstü S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	20	64,667.00	Tamamlandı.
16	Sulusaray/Alanyurt S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	22	64,223.00	Tamamlandı.
17	Turhal/Hamidiye S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	45	190,729.00	Tamamlandı.
18	Turhal/Yazitepe S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	8	83,986.00	Tamamlandı.
19	Turhal/Kat S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	8		Tamamlandı.
20	Turhal/Gümüstop S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	91,126.00	Tamamlandı.
21	Turhal/Koruluk S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-		Tamamlandı.
22	Yeşilyurt/Kuşçu S.S.T. Yapımı	Yerüstü Pompa	Açık Kanal	40	78,141.00	Tamamlandı.
23	Merkez/Söngüt S.S.T. Yapımı (Tamamlama) (Mal. Yar.)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	130,000.00	Tamamlandı.
24	Merkez/Günevi S.S.T. Yapımı (Mal. Yar.)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	100		Tamamlandı.

25	Reşadiye/Bozcalı S.S.T. Yapımı (Malzeme Yardımı)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-		Tamamlandı.
26	Merkez/Yenice S.S.T. Yapımı (Mal. Yar.)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	8	20,000.00	Tamamlandı.
TOPLAM				409	1,565,757.00	

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ – KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Su Kaynağı Tipi	Sulama Tesisi Tipi	Sulama Alanı (ha)	Kaynak	İşin durumu
1	Merkez/Uğrak S.S.T. Sulama Havuz Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	30,000.00	Tamamlandı.
2	Merkez/Bedirkale S.S.T. Yap. (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	25,000.00	Tamamlandı.
3	Merkez/Kızılköy Kapalı Sistem S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Kapalı Sistem	50	20,000.00	Tamamlandı.
4	Artova/Iğdır S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	30,000.00	Tamamlandı.
5	Artova/Salur S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	20,000.00	Tamamlandı.
6	Erbaa/Ezebağı S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	10	35,000.00	Tamamlandı.
7	Erbaa/Gümüşalan S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	12,000.00	Tamamlandı.
8	Erbaa/Pınarbeyli S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	5,000.00	Tamamlandı.
9	Erbaa/Küplüce S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	5,000.00	Tamamlandı.
10	Erbaa/Doğanyurt S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	5,000.00	Tamamlandı.
11	Erbaa/Salkımören S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	5,000.00	Tamamlandı.
12	Erbaa/İverönü S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	5,000.00	Tamamlandı.
13	Erbaa/Güveçli S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	5,000.00	Tamamlandı.
14	Erbaa/Kuzköy S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	5,000.00	Tamamlandı.
15	Erbaa/Balıbağ S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	5,000.00	Tamamlandı.
16	Erbaa/Ermejdani S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	5,000.00	Tamamlandı.
17	Niksar/Arpaören S.S.T. Havuz Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	30,000.00	Tamamlandı.
18	Niksar/Hacılı Kapalı Sistem S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Kapalı Sistem	-	30,000.00	Tamamlandı.
19	Niksar/Sulugöl S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	12	30,000.00	Tamamlandı.
20	Reşadiye/Hasanşeyh S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	8	30,000.00	Tamamlandı.
21	Reşadiye/Kışlaoğlu S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	21	30,000.00	Tamamlandı.

22	Reşadiye/Darıderesi S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	10,000.00	Tamamlandı.
23	Turhal/Necip S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	20,000.00	Tamamlandı.
24	Turhal/Yenisu S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	15	20,000.00	Tamamlandı.
25	Yeşilyurt/Çırdak Drenaj Yapımı	Drenaj		-	10,000.00	Tamamlandı.
26	Zile/Akdoğan S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	20,000.00	Tamamlandı.
27	Zile/Olukman S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	8	30,000.00	Tamamlandı.
28	Zile/Eskidağcı S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	25,000.00	Tamamlandı.
29	Zile/Üçköy S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	8	30,000.00	Tamamlandı.
30	Zile/Akgüller S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	20,000.00	Tamamlandı.
31	Zile/Kazıklı S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Cazibe	Açık Kanal	-	30,000.00	Tamamlandı.
TOPLAM				132	582,000.00	

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ						
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Su Kaynağı Tipi	Sulama Tesisi Tipi	Sulama Alanı (ha)	Harcanan Kaynak Miktarı (TL)	İşin durumu
1	Merkez/Kabatepe Köyü Yağmurlama Sulama Suyu Tesisi Ana Hat Yapımı	Yer altı pompa ve Yerüstü Cazibe	Kapalı Sistem	100	182,212.92	Tamamlandı.
2	Niksar/Camidere Köyü Yağmurlama Sulama Suyu Tesisi Yapımı	Yerüstü Cazibe	Kapalı Sistem	100	225,300.37	Tamamlandı.
3	Turhal/Kızkayası Köyü Elektromotopomp Tesisi Kapalı Sistem S.S.T. Yapımı (Pompaj Tamamlama)	Yerüstü Pompa	Kapalı Sistem	-	91,556.01	Tamamlandı.
4	Niksar/Yakınca Yağmurlama S.S.T. Yapımı	Yerüstü Cazibe	Kapalı Sistem	-	0.00	İş devam ediyor.
TOPLAM				200	499,069.30	

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ – KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ						
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Su Kaynağı Tipi	Sulama Tesisi Tipi	Sulama Alanı (ha)	Harcanan Kaynak Miktarı (TL)	İşin durumu
1	Merkez/Çubuklu Köyü Yağmurlama Sulama Suyu Tesisi Yapımı (Hibe Programı)	Yerüstü Cazibe	Kapalı Sistem	300	553,446.09 (Özel İdare Katkısı: 201,679.51 TL)	Tamamlandı.
2	Başçiftlik-Karacaören Göletten Yağmurlama Sulama Suyu Tesisi Yapımı (Hibe Programı)	Yerüstü Cazibe	Kapalı Sistem	180	445,924.27 (Özel İdare Katkısı: 162,497.83 TL)	Tamamlandı.
3	Yeşilyurt/Büget Köyü Göletten Yağmurlama Sulama Suyu Tesisi Yapımı (Hibe Programı)	Yerüstü Cazibe	Kapalı Sistem	310	393,183.01 (Özel İdare Katkısı: 143,278.55 TL)	Tamamlandı.
4	Yeşilyurt/Çıkrık YAS Pompaj Tesisi Terfi Hattı Yenileme (Malzeme Yardımı)	Yer altı Pompa	Açık Kanal	-	32,450.00	Tamamlandı.
5	Zile/Hacılar Köyü YAS Yağmurlama Sulama Suyu Tesisi Terfi Hattı Yapımı	Yer altı Pompa	Kapalı Sistem	-	30,000.00	Tamamlandı.
6	Zile/B.Özlü Köyü Yağmurlama Sulama Suyu Tesisi Yer altı Suyu Sondaj Yapımı	Yer altı Pompa	Kapalı Sistem	-	26,000.00	Tamamlandı.
7	Zile/Yapalak Elektromotopomp Tesisi Açık Kanal S.S.T. Yapımı (Tamamlama)	Yerüstü Pompa	Açık Kanal	-	30,000.00	Tamamlandı.
8	Zile/Emirdolu YAS Yağmurlama Sulama Suyu Tesisi Yapımı (Tamamlama)	Yer altı Pompa	Kapalı Sistem	25	20,000.00	Tamamlandı.
TOPLAM				815	1,531,003.37	

STRATEJİK AMAÇ 5

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA YATIRIMLARINDA, DEVAM ETMEKTE OLAN PROJELER KURUMUMUZ TARAFINDAN 2010 YILI SONUNA KADAR, BÜTÇESİ TARIM BAKANLIĞINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE TAMAMLANACAK OLUP; BUNDAN SONRA YAPILACAK ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI TARIM BAKANLIĞI İLE KOORDİNELİ OLARAK, TARIM BAKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

STRATEJİK HEDEF 5.1

2010 yılı sonuna kadar, Niksar ovasında toplulaştırma yapılabilir arazilerin % 30'unun toplulaştırması tamamlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Niksar ovasında toplulaştırma tamamlanma oranı (%)	4.50	4.50	30.00	6.00	- 80

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Tokat/Niksar-Hacı, Çengelli, Korulu ve Ormancık köyleri toplulaştırma projesi tamamlanma oranı (%)	70	70	100	75	75
2	Uygulanan toplulaştırma projelerine harcanan kaynak miktarı (TL)	370,927.53	0.00	3,025,000.00	881,348.00	29

STRATEJİK HEDEF 5.2

2010 yılı sonuna kadar, Erbaa ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 92'sinin toplulaştırması tamamlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Erbaa ovasında toplulaştırma tamamlanma oranı (%)	83.19	83.19	92.00	86.00	- 6

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Tokat/Erbaa - Değirmenli, Hacıpazar, Aş.Yk. Çandır, Evyaba 2.Kısım toplulaştırma projesinin tamamlanma oranı (%)	83	83	100	85	85
2	Tokat/Erbaa – Karayaka toplulaştırma projesinin yapımının tamamlanma oranı (%)	61	61	100	65	65
3	Uygulanan toplulaştırma projelerine harcanan kaynak miktarı (TL)	0.00	0.00	9,848,000.00	2,805,932.00	28

STRATEJİK HEDEF 5.3

2010 yılı sonuna kadar, Zile ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin % 26'sının toplulaştırması tamamlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Zile ovasında toplulaştırma tamamlanma oranı (%)	22.90	22.90	26.00	23.00	- 11

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Tokat/Zile - Özyurt toplulaştırma projesinin tamamlanma oranı (%)	62	62	100	62	62
2	Tokat/Zile – Güzelbeyli (Temecik) 2. Kısım toplulaştırma projesinin tamamlanma oranı (%)	97	97	100	100	100
3	Uygulanan toplulaştırma projelerine harcanan kaynak miktarı (TL)	0.00	0.00	1,603,000.00	140,630.00	9

Değerlendirme:

- ✓ Tarımsal faaliyetlerin ve alt yapı yatırımlarının etkinliğinin artırılmasında, en önemli yatırım projeleri olarak yer alan toplulaştırma faaliyetleri, yörenizde uzun bir süredir yapılmamaktaydı. Tokat İli Türkiye’de toplulaştırma yatırımlarının en iyi olduğu birkaç ilden bir tanesidir. Tamamlanmayı bekleyen birçok yatırımı bulunmaktadır. Tarım Bakanlığı, devam eden bu projelerin ödeneğini sağlamaktadır. 2010 yılı içerisinde beklenen kadar olmasa da önemli bir miktar yatırım gerçekleşmiştir. Bu durum önümüzdeki yıllar için umut verici bir gelişmedir. 2010 yılı içerisinde toplam 3,827,910 TL ödenek harcanmıştır. En yüksek yatırım ise Erbaa Ovasında gerçekleşmiştir.

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2010 YILI
FAALİYET RAPORU**

**RUHSAT VE DENETİM
HİZMETLERİ**



STRATEJİK AMAÇ 1

İLİMİZ YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARINDAN ELDE EDİLEN ÜRETİMİ, KAYNAKLARINI GELECEK NESİLLERE TAŞIMA VE ÇEVREYE DUYARLI BİR ANLAYIŞ İÇERİSİNDE ARTIRMAK.

STRATEJİK HEDEF 1.1

İl genelinde, Kurum görev alanı içerisinde kalan gayri sıhhi ve sıhhi müesseselerin, ruhsatlı ve yasal sınırlar içerisinde çalışmalarını temin edilecektir.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Ruhsatlı gayri sıhhi ve sıhhi müessese oranı (%)	Ruhsat verilmesi talebe göre gerçekleştiğinden dolayı, herhangi bir performans tanımlaması yapılmamıştır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	GSM ve sıhhi müessese ruhsatı verilen işletme sayısı	36	32	Talebe göre	52	-
2	GSM ve Sıhhi müesseselere verilen tatil günü çalışma belgesi sayısı	36	7	Talebe göre	8	-
3	Verilen yapı ruhsatı sayısı	3	3	Talebe göre	7	-
4	Verilen yapı kullanım izin belgesi sayısı	3	5	Talebe göre	2	-

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Müesses e Miktarı (adet)	Kaynak	İşin durumu
1	1.Sınıf GSM Ruhsatı Verilmesi Aytaç Akyudum Gıda San.Tic.A.Ş.	1	İdari Giderler	Tamamlandı.
2	2.Sınıf GSM Ruhsatı Verilmesi - Karayolları 16.Bölge Müd. (Kalker Ocağı) - Mer-Mera Mermer Mad.San.Tic.Ltd.Şti. - As Mermer San.Tic.Ltd.Şti. - Antek Madencilik San.Tic.Ltd.Şti. - Günebakan Motorlu Taşıtlar San.Tic.Ltd.Şti. - Ataç Tarım Ltd.Şti. (Akaryakıt) - Ataç Tarım Ltd.Şti. (Tuğla-Kiremit) - Çanbensan - Murat Okkan - Karayolları 16.Bölge Müd. (2.Grup Kalker Ocağı) - Aryıl Mad. San.Tic.Ltd.Şti. - Solmazlar Petrol - Pınarlı Petrol - Akpınar Tar.Ürü.Nak.İnş. San.Tic.Ltd.Şti. - Aslan Dalgıç - ADOÇİM (Hazır Beton) - Turkon MNG - Yağmur Petrol - Uğur Çağlayan - Gökdere Acar Petrol San.Tic.Ltd.Şti. - ÖSAK İnş. İth.San.Tic.Ltd.Şti. - Tok Tem Tar. Oto. Petr.İnş.Tur. San.Tic.Ltd.Şti. - Sadık Solmaz - Yağmur Petrol Ürü.Nak. San.Tic.Ltd.Şti.	29	İdari Giderler	Tamamlandı.

	• Keşkekler Petrol Ürü. San.Tic.Ltd.Şti. • Ataç Tarım Ltd.Şti. • IC İçtaş İnş. San.Tic.Ltd.Şti. • ADOÇİM (Çimento) • ADOÇİM (Kil)			
3	3.Sınıf GSM Ruhsatı Verilmesi • Almer Madencilik • Almer Madencilik • Almer Madencilik • Gökner Mermer • Birdal Mermer • Paslıoğlu Petrol	6	İdari Giderler	Tamamlandı.
4	3.Sınıf Sıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi • Ali ALP • İbrahim YALÇIN • İsmail TUTGUN (Kahvehane) • İsmail TUTGUN (Bakkal) • Emre AYGÜNLÜER • Mustafa BİLGAN • Gazi BİŞGİN • Eraslan ÇELİK (Kahvehane) • Eraslan ÇELİK (Büfe) • Fatih YALÇIN • Ömer DURMUŞ • İbrahim BAYIN • Zülal EKİNCİ • Mustafa GENÇAY • Duran DURAN • Yeni Asya Canlı Alabalık	16	İdari Giderler	Tamamlandı.
5	1. Sınıf GSM Tatil günü çalışma belgesi verilmesi	4	İdari Giderler	Tamamlandı.
6	2. Sınıf GSM Tatil günü çalışma belgesi verilmesi	0	İdari Giderler	Tamamlandı.
7	3. Sınıf GSM Tatil günü çalışma belgesi verilmesi	0	İdari Giderler	Tamamlandı.
8	3. Sınıf Sıhhi Müessese Tatil günü çalışma belgesi verilmesi	4	İdari Giderler	Tamamlandı.
9	Yapı Ruhsatları	7	İdari Giderler	Tamamlandı.

	• Mehmet SOLMAZ-Artova • Erdem Maden İnş.Gıda Teks.San.Tic.Ltd.Şti. – Niksar • Yakup AKPINAR – Zile • TOKİ – Pazar • Hasan TEPESU – Merkez • Dursun DARAKÇI – Turhal • İçtaş İnş.A.Ş.			
10	Yapı Kullanma İzin Belgesi • Turkan MNG Elektrik Üretim - Reşadiye • Mehmet SOLMAZ – Artova	2	İdari Giderler	Tamamlandı.

STRATEJİK HEDEF 1.2

Ruhsatsız ve yasal sınırlar içerisinde çalışmayan 1/A Grubu Maden (kum, çakıl) işletmesi ile su ürünleri işletmesi bırakılmayacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Ruhsatlı işletme oranı (%)	Ruhsat verilmesi talebe göre gerçekleştiğinden dolayı, herhangi bir performans tanımlaması yapılmamıştır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	İl genelindeki maden ocağı sayısı (işletme ve arama)	215	253	Talebe göre	222	-
2	İl genelindeki kum ocağı sayısı	25	14	Talebe göre	13	-
3	Yıl içerisinde verilen kum ocağı ruhsat sayısı	3	1	Talebe göre	5	-
4	Verilen su kiralama sayısı	23	24	Talebe göre	28	-
5	Verilen su kaynağı kiralama sayısı	-	-	Talebe göre	4	-

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	İl geneli maden ocağı ruhsatı - Arama: 174 adet - İşletme: 48 adet	222	İdari Giderler	Tamamlandı.
2	Su kiralaması (Alabalık Üretim Tesisleri) yapan firma veya şahıslar: - Ali Yılmaz-Tahtoba/Merkez - Osman Çalaş: Almus Baraj gölü/Almus - Satılmış Leylek: Tanoba/Erbaa - Akbal İnşaat: Akbelen/Tokat - Hayri Gönültaş: Almus Baraj Gölü/Almus - İbrahim Oktar: Almus Baraj Gölü/Almus - Yılmaz Alpoğlu: Uzunburun/Tokat - Mustafa Koç: Gözpınar Boğama/Niksar - Halil Eryılmaz: Yeşilkaya/Niksar - Kazım Engin: Çöreğibüyük/Tokat - Ümit Balcı: Daylihacı Kızılınış/Tokat - Emine Demirci: Sanayi Sitesi/Niksar - Talip Zaralı: Almus Baraj Gölü/Almus - Tokel Balık: Almus Baraj Gölü/Almus - Burhan Özbarutçu: Almus Baraj Gölü/Almus - Almus Balıkçılık Koop.: Almus Baraj Gölü/Almus - Üzümlören Belediyesi: Üzümlören/Pazar - Mustafa Ögüd: Kavlağanlık Mevkii/Niksar - Gölada Su Ürünleri: Almus Baraj Gölü/Almus - Mustafa Altınok: Akbelen/Tokat - Ersu Su Ürünleri – Almus Baraj Gölü/Almus - Mustafa Kürşat Alpoğlu-Almus Barajı - Yayla Gündoğan-Almus Baraj Gölü - Kenan Demir-Almus Baraj Gölü - Tokel Balık Çev.Gıda. Tur.İnş.Tic.San.Ltd.Şti. – Almus Baraj Gölü	28	İdari Giderler	Tamamlandı.

	• Kürşat Alpoğlu – Almus Baraj Gölü • Ali Yılmaz – Tahtoba • Tokel Balık Çev.Gıda. Tur.İnş.Tic.San.Ltd.Şti. – Almus Baraj Gölü Hasankalesi Mevkii			
3	Su kaynağı kiralaması yapan firma veya şahıslar: • Erbaa Gökal Kasabası Kaynak Suyu • Niksar Akıncı Köyü Kaynak Suyu • Almus Çevreli Belediyesi • Bensu Kaynak suları	4	İdari Giderler	Tamamlandı.

STRATEJİK AMAÇ 2

KURUM GÖREV ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN HARİTA İMAR HİZMETLERİNİ MODERN BİR HİZMET ANLAYIŞI ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK.

STRATEJİK HEDEF 3.1

Görev alanı içerisindeki harita imar hizmetleri karşılanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Köy yerleşik alan sınırı tespit edilen köy oranı (%)	43	49	55	57	+ 2

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Yapılan ifraz (bölme) işlemi sayısı (adet)	13	13	Talebe göre	14	-
2	Yapılan tevhid (birleştirme) işlemi sayısı (adet)	1	4	Talebe göre	4	-
3	Hazırlanan hâlihazır haritalar ve mevzi imar planı sayısı (adet)	7	3	Talebe göre	6	-
4	Köy yerleşik alan plan sınırı tespiti miktarı (adet)	21	26	35	45	129

Değerlendirme:

- ✓ İl genelinde köy yerleşik alan sınırları belirlenen köy sayısı, toplam köy sayısının yaklaşık yarısına ulaşmış vaziyettedir. Köy yerleşik alan sınırının tespit edilmesinde, öncelikle talepler karşılanmakta olup, bunun dışında ise belli bir sıra dahilinde devam edilmektedir. 2010 yılında belirlenen hedefin % 30 üzerinde bir performans gösterilmiştir. Bu performans önümüzdeki yıllarda gösterilebildiği takdirde, köylerin tümünün yerleşik alan plan sınırları çok kısa bir içerisinde tamamlanacaktır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Yapılan ifraz (bölme) işlemi : • Zile Kurşunlu Köyü • Erbaa İverönü Köyü • Zile Saraç – Fırtıman • Reşadiye Taşlıca Köyü • Zile Yeniköy • Merkez Ortaören Köyü • Merkez Dağlacık Köyü • Turhal Kalaycık Köyü • Merkez Kömeç Köyü • Erbaa Tepekışla Köyü • Turhal Kuşoturağı Köyü • Reşadiye Darıdere Köyü • Merkez Taşlıçiftlik Köyü • Zile Alihoca Köyü	14	İdari Giderler	Tamamlandı.
2	Yapılan tevhid (birleştirme) işlemi : • Merkez Derekışla • Merkez Ortaören • Merkez Gökdere • Merkez Küçükbağlar	4	İdari Giderler	Tamamlandı.
3	Hazırlanan hâlihazır haritalar ve mevzi imar planı : • Kutay HES – Reşadiye • Çamlıca HES • Rüzgar Enerji Santrali – Killik • Niksar HES İÇTAŞ • Merkez Batmantaş Şişeleme Tesisi • Zile Yeniköy	6	İdari Giderler	Tamamlandı.
4	Köy yerleşik alan plan sınırı tespiti : • <u>Merkez:</u> Kadıvakfı, Yenice, Bedirkale, Dodurga, Karkın, Karkıncık, Kızılkaya, Sevindik, Küçükbağlar • <u>Almus:</u> Çamdalı	45	İdari Giderler	Tamamlandı.

	• <u>Artova</u>: Gürardıç, İğdir, Poyrazalan, Devecikarkın • <u>Erbaa</u>: Yoldere, Benli • <u>Niksar</u>: Hüseyingazi, Yarbaşı, Eyneağzı, Çalca, Özdemir, Derindere • <u>Reşadiye</u>: Karaağaç, Çambalı, Kabalı • <u>Turhal</u>: Ağcaşar, Eriklietekke, Y.Eriklietekke, Akbuğday • <u>Yeşilyurt</u>: Doğanca, Ekinli, Karacaören • <u>Zile</u>: Boldacı, Kurupınar, Olukman, Salur, Üçköy, Yaylayolu, Alihoca, Güblüce, Akkılıç, Kireçli, Eskidağıcı, Turgutalp, Aluçözü			
--	--	--	--	--

T.C. TOKAT İL ÖZEL İDARESİ



2010 YILI FAALİYET RAPORU

SAĞLIK HİZMETLERİ



STRATEJİK AMAÇ 1	TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİNDE YAŞAYAN İNSANLARA İLK SAĞLIK MÜDAHELESİNİN YAPILABİLECEĞİ VE RAHATLIKLA ULAŞILABİLECEK, SAĞLIK TESİSLERİ İNŞAA EDİLECEK VE DÜZENLİ ÇALIŞMALARI SAĞLANACAKTIR.
-------------------------	--

STRATEJİK HEDEF 1.1	İl genelinde ihtiyaç bildirilen sağlık ocağı ve sağlık merkezi ihtiyacı karşılanacak olup, mevcut sağlık tesislerinin etkin çalışabilmesi amacıyla gerekli bakım-onarım ve ekipman ihtiyacına yönelik gerekli destek sağlanacaktır.
----------------------------	--

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2007 Gerçekleşme	2008 Gerçekleşme	2009 Hedef	2009 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
İlimiz ihtiyacı olan sağlık altyapısına yönelik yatırımlar devam ettirilecektir.	Performans tanımlaması yapılamamıştır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Yapılan hastane sayısı (adet) (Ek bina ve entegre bina dahil)	2 (1 ad. devam eden iş)	3 (2 adet devam eden iş)	-	1 adet devam eden iş	-
2	Yapılan sağlık ocağı veya evi sayısı (adet)	1	1	3	2	67
3	Bakım-onarım yapılan sağlık ocağı veya evi sayısı (adet)	5	3	15	15	100
4	Sağlık altyapısına yönelik harcanan kaynak miktarı (TL)	33,761,773.03	13,500,258.58	923,000.00	8,219,654.85	890
5	Her türlü çeşitli cihaz, malzeme ve idari giderler için yapılan harcama miktarı (TL)	970,406.71	1,801,344.02			

Değerlendirme:

- ✓ 2010 Yılı içerisinde, Tokat İli Sağlık Altyapısına yönelik olarak önemli bir yatırımın başlangıcı yapılmıştır. 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastane binasının yapımına başlanmıştır. İnşaat halen devam etmektedir.
- ✓ 2010 Yılı Tokat İlının aile hekimliğine geçiş yılı olmuştur. Bu sebepten dolayı, 2010 yılında sağlık ocaklarında düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bakım onarımlar açısından belirlenen hedeflere ulaşılmıştır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak (TL)	İşin durumu
1	Tokat 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Yapım İşİ	1	7,699,806.84	İş devam ediyor.
2	Tokat Devlet Hastanesi Hepa Filtre Alımı	1	140,000.00	Tamamlandı
3	Tokat Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesi Projesi İhale İşlemleri	1	125,000.00	Tamamlandı.
TOPLAM			7,964,806.84	

Uygulayan Birim: : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Yeni Yapım - Turhal/Yenisu Sağlık Evi - Zile/Ayvalı Sağlık Evi	2	254,848.01	Tamamlandı.
1	Bakım-onarım yapım işi - Merkez/Beşören Sağlık Evi - Almus/Bağtaşlı Sağlık Evi - Almus/Görümlü Sağlık Evi - Erbaa/1, 2, 3, 4 Nolu Sağlık Evleri - Pazar/Ovayurt Sağlık Evi - Reşadiye/Aile Toplum Sağlığı Merkezi - Turhal/Necip Sağlık Evi - Turhal/Sarıkaya Sağlık Evi - Zile/Boldacı, B.Kozluca, Yıldıztepe, Dinçerler 2 Nolu Sağlık Evi	15		
TOPLAM			254,848.01	

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2010 YILI
FAALİYET RAPORU**

**KÜLTÜR VE TURİZM
HİZMETLERİ**



STRATEJİK AMAÇ 1

TOKAT İLİNDEKİ TARİHİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK MEKÂNLARI KORUMAK, GELİŞTİRMEK VE TANITIMINI YAPARAK TURİZME KAZANDIRMAK.

STRATEJİK HEDEF 1.1

İl genelindeki kültürel ve turistik merkezleri geliştirmek ve korumak.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Kültür ve Turizm Müdürlüğü programı kapsamında faaliyetlere destek sağlanacaktır.	Performans tanımlaması yapılamamıştır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Turistik merkezlere restorasyon ve bakım-onarım faaliyetleri sayısı	3	4	Muhtelif	5	-
2	Yürütülen kazı faaliyetleri sayısı	0	1	Muhtelif	1	-
3	Şehir içi çeşitli düzenleme yapılan yerleşim yeri sayısı (adet)	-	-	Muhtelif	8	-
4	Turizm alt yapısını iyileştirme, restorasyon,, kazı, sokak sağlıklılaştırması, şehir içi düzenleme vb. faaliyetlere harcanan kaynak miktarı (TL)	184,370.89	1,995,800.19	465,000.00	4,173,293.52	897

Değerlendirme:

- ✓ Turizm altyapısını geliştirmeye yönelik olarak 2010 yılında yapılan faaliyetler, genel olarak 4 başlık altında toplanmıştır. Bunlar: kazı, kale restorasyonları, şehir içi düzenlemeler ve sokak sağlıklılaştırmasıdır. Oldukça yüksek düzeyde ödenek kullanımı gerçekleşmiştir. Harcanan ödeneğin planlanandan çok fazla olması; Bakanlıktan gelecek ödeneğinin dahil edilmemesinden ileri gelmektedir. Turizm ve tarihi zenginlikleri yüksek olan ilimizde bu tür yatırımların artması; ilimizin turizm potansiyelinin artışına ve dolayısıyla da turizm gelirlerinin artışına sebep olacaktır.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Tokat Sokak sağlıklılaştırması ve çevre düzenlemesi işi	1	387,851.10	İş devam ediyor.
2	Tokat Plevne Müzesi Onarım, Çevre Düzenleme ve Teşhir Tanzimi İş	1	414,607.83	İş devam ediyor.
3	Tokat Kalesi Restorasyonu	1	107,008.30	Tamamlandı.
4	Niksar Kalesi Restorasyonu	1	2,398,974.54	İş devam ediyor.
5	Zile Kalesi Restorasyonu	1	480,650.82	İş devam ediyor.
6	Niksar Merkez Cahit KULEBİ Anıt Mezar Yapımı	1	23,541.00	Tamamlandı.
7	Komana Antik Kent Kazısı	1	50,827.76	Tamamlandı
8	Yerleşim merkezlerinde, park ve çevre düzenleme faaliyetleri • <u>Merkez</u>: Çat, Güryıldız • <u>Almus</u>: Merkez • <u>Erbaa</u>: Üzümlü • <u>Niksar</u>: Günebakan • <u>Turhal</u>: Kat, Merkez • <u>Zile</u>: Merkez	8 adet yerleşim yeri	309,832.17	Tamamlandı.
TOPLAM			4,173,293.52	

STRATEJİK HEDEF 2.1**Tokat ilini, kültürel ve turizm açısından Türkiye ve dünya genelinde tanınan, bir il haline getirmek.****Performans Hedefi:**

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tanıtım ve idari faaliyetlerine katkı sağlanacaktır.	Performans tanımlaması yapılamamıştır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	İli tanıtım amaçlı hazırlanan tanıtım materyali sayısı	-	40000 Broşür, 20000 CD, 300 Envanter	Muhtelif	5	-
2	İli tanıtım amaçlı düzenlenen sergi, sempozyum, konferans sayısı	-	2	Muhtelif	3	-
3	İli tanıtım amaçlı katılım sağlanan fuar sayısı	-	2	Muhtelif	1	-
4	İl tanıtımı ve İdarenin çeşitli giderlerine harcanan kaynak miktarı (TL)	74,802.62	235,657.03	282,000.00	284,940.09	101

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Temsil, tanıtım vb. hizmetler <u>Baskılı Tanıtım hizmetleri:</u> Tanıtıcı broşür basımı, baskılı bez çanta, kültür envanteri basımı, Tokat'ta Turizm-Balıca Mağarası kitabı basımı, 800 adımda 800 yıl broşürü basımı <u>Temsil, tanıtım, fuar faaliyetleri:</u> Halk Oyunları Kostümü yaptırılması, Kafkas Halk Oyunları Kostümü yaptırılması, İzmir Travel Turkey Fuarına katılım, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Kurultay organizasyonu, AKM Fuar organizasyonu, Turizm Haftası organizasyonu	Muhtelif	95,942.04	Tamamlandı.
2	Müze ve ören yerlerine temizlik hizmeti alınması	Muhtelif	38,387.76	Tamamlandı.
3	İdarenin çeşitli giderleri (tüketim malzemesi, mamul mal alımı, gören giderleri, çeşitli hizmet alımı, yolluk gideri vb.)	Muhtelif	150,610.29	Tamamlandı.
TOPLAM			284,940.09	

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2010 YILI
FAALİYET RAPORU**

**ÇEVRE KORUMA VE DİNLENME
HİZMETLERİ**



STRATEJİK AMAÇ 1**İNSANLARA TEMİZ, YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK.****STRATEJİK HEDEF 1.1****2013 yılı sonuna kadar kanalizasyonu tamamlanmış köylerin % 10'una doğal arıtma tesisleri yapılacaktır.****Performans Hedefi:**

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Doğal arıtma tesisi yapılan kanalizasyon tesisi oranı (Kümülatif Toplam) (%)	9	9	10	9	- 1
Toplam Doğal Arıtma Tesis Sayısı (Kümülatif Toplam)	43	44	49	46	- 6

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Yapılan doğal arıtma tesisi sayısı	3	1	5	2	40
2	Doğal arıtma tesisine yönelik harcanan kaynak miktarı (TL)	İller Bankası	6,500.00	100,000.00	65,500.00	66

Değerlendirme:

- ✓ Doğal arıtma tesisleri, kanalizasyon tesislerinin yapımı ile birlikte, çevre açısından yapılması zaruri tesislerdir. Fakat konu ile ilgili yatırımlar istenilen düzeyde gerçekleşmemektedir. Belirlenen hedef çok rahatlıkla yakalanabilecek düzeydedir ve 2010 yılı içerisinde yapımına başlanan 4 adet doğal arıtma tesisinin 2 adedi yapılabilmektedir. Diğer 2 tesisin yapımı devam etmektedir. Bununla birlikte, hedefin daha yüksek düzeylerde belirlenmesi gerekmektedir. İlimiz kırsalında yaklaşık 500 adet kanalizasyon tesisi vardır ve yıllık yapılan birkaç adet doğal arıtma tesisi ile bunların arıtmalarının tamamlanması mümkün değildir. Konunun çevre ile ilgili önemi çerçevesinde, doğal arıtma tesislerinin hızla tamamlanabilmesi için gerekli kaynağın sağlanması yönünde gayret sarf edilmelidir.

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Turhal / Sarıkaya, Gümüştop	2	65,500.00 (İller Bankası)	Tamamlandı.
1	Erbaa / Doğanyurt, Bağpına	2	0.00	İş devam ediyor.
TOPLAM			65,500.00	

STRATEJİK HEDEF 1.2

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve beklentileri tam olarak karşılayamayan, “Tokat İli Çevre Düzeni Planı”, yeniden değerlendirilecek ve detaylandırılmış olarak 2013 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.

2010 Yılı için herhangi bir faaliyet ön görülmemiştir.

STRATEJİK AMAÇ 2

İLİMİZDE EKOLOJİK DENGİNİN BOZULMASI İLE EROZYONU ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINACAK VE ORMAN ZENGİNLİĞİ ARTIRILACAKTIR.

STRATEJİK HEDEF 2.1

Ağaçlandırma ve orman bakım ve koruma faaliyetlerine katkı sağlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Çevre ve orman yatırımlarının geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.	Performans tanımlaması yapılmamıştır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün faaliyetlerine katkı amaçlı harcanan kaynak miktarı (TL)	0	0	35,000.00	0.00	0

Değerlendirme:

- ✓ Çevreye yönelik olarak, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte 2010 yılı içerisinde, herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir.

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2010 YILI
FAALİYET RAPORU**

SOSYAL HİZMETLER



STRATEJİK AMAÇ 1	SOSYAL HİZMETLERDE AB STANDARTLARINDA BİR HİZMET ANLAYIŞI İÇERİSİNDE, SOSYAL YARDIMA İHTİYAÇ HİSSEDEN HERKESİN YANINDA YER ALINACAKTIR. TOPLUMUN HER KESİMİNİN ÜRETİME KATILIMI SAĞLANACAKTIR.
-------------------------	---

STRATEJİK HEDEF 1.1	Sosyal hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.
----------------------------	---



Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün bakım- onarım ve ekipman alımına destek sağlanacaktır.	Performans tanımlaması yapılmamıştır.				

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne harcanan kaynak miktarı (TL)	888,926.77	214,112.22	100,000.00	195,695.70	196
2	Türkiye Grameen Mikro Kredisı kapsamında yardım yapılan üye sayısı	295	615	750	1546	206
3	Türkiye Grameen Mikro Kredisı kapsamında üyelere verilen kredi miktarı	194,500.00	675,794.00	800,000.00	1,321,752.00	165
4	Türkiye Grameen Mikro Kredisine kapsamında İl Özel İdaresince ayrılan kaynak miktarı (TL)	25,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	100

Değerlendirme:

- ✓ İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün hizmet binası onarımı ve tefrişat alımlarında kullanması için 2010 yılı için belirlenen ödeneğin 2 katı bir harcama yapılmıştır. Bu durum Bakanlık ödeneği ile ilgilidir.
- ✓ Kurumumuz bünyesinde yürütülen, Türkiye Grameen Mikro Kredisi Programı başarılı çalışmalar yürütmektedir. İstihdam artışına katkı sağlamak amacıyla, küçük çaplı fakat etkin faaliyetler yürütmektedir. Faaliyetlerinin başarısı, yıllar içerisinde ulaştıkları kapasite ile görülmektedir. Kurumumuzdan aldıkları yardım çok fazla olmamasına karşın, kredi verdikleri üye sayısında üç yılda 5.2 kat, verdikleri kredi miktarında ise 6.8 kat artış sağlanmıştır. Burada önemli nokta, insanlara iş kurması için verilen kaynağın, bir hibe olmamasıdır. Bir kredi programı olmasına rağmen, üye sayısında artış sağlanmakta ve kredi dönüşünde bir sıkıntı yaşanmamaktadır.



Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Hizmet Binası 1.Katında Özürlü Bürosu yapımı	1	32,075.96	Tamamlandı.
2	Turhal Cumhuriyet Çocuk Yuvası Pimapen Yapımı	1	25,766.80	Tamamlandı.
3	Turhal Cumhuriyet Çocuk Yuvası Doğalgaz Dönüşümü	1	100,003.00	Tamamlandı.
4	Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Bahçesinde Halı Saha Yapımı	-	1,975.00	İş devam ediyor.
5	Tefrişat alımı • Turhal Cumhuriyet Çocuk Yuvası	1	35,874.91	Tamamlandı.
TOPLAM		4	195,695.70	

Uygulayan Birim: : İL ÖZEL İDARESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Türkiye Grameen Mikro Kredisı Programı	1	125,000.00	Tamamlandı.

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2010 YILI
FAALİYET RAPORU**

**GÜVENLİK VE SİVİL
SAVUNMA
HİZMETLERİ**



STRATEJİK AMAÇ 1

GÜVENLİK VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ; ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ, MODERN BİR YAPIYA KAVUŞTURULACAKTIR.

STRATEJİK HEDEF 1.1

Güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin güçlenmesine yönelik olarak, ilgili kurum ihtiyaçları doğrultusunda gerekli katkı sağlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	Yıllar				
	2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik gerekli katkı sağlanacaktır.	Performans tanımlaması yapılmamıştır.				

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	Yıllar				
		2008 Gerçekleşme	2009 Gerçekleşme	2010 Hedef	2010 Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma (%)
1	Sivil savunma hizmetleri için harcanan kaynak miktarı (TL)	42,171.90	46,552.99	100,000.00	97,587.00	98
2	Güvenlik hizmetleri için harcanan kaynak miktarı (TL)	258,007.09	1,402,089.57	421,000.00	530,659.54	126

Değerlendirme:

- ✓ Genel olarak güvenlik ve sivil savunma hizmetlerine yönelik yapılan yatırımlar; hizmet binalarının bakım-onarım ve düzenleme çalışmaları ile tüketim harcamaları üzerinedir. Sivil savunma hizmetlerine sağlanan ödenek, 2010 yılı için belirlenen ödenek ayrımı kadar olmuştur. Emniyet Müdürlüğünün kaynak kullanımı ise belirlenen ödenek miktarının üzerinde gerçekleşmiştir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: : İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	Muhtelif	56,950.00	Tamamlandı.
2	Hizmet Alımları	Muhtelif	17,509.00	Tamamlandı
3	Bakım Onarım Giderleri	Muhtelif	19,883.00	Tamamlandı
4	Diğer giderler (Yolluk, Sigorta, Muayene)	Muhtelif	3,245.00	Tamamlandı
TOPLAM			97,587.00	

Uygulayan Birim: : İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Özel Harekat Şube Müdürlüğü Duş-WC Onarımı	1	12,555.67	Tamamlandı.
2	Çocuk Şube Müdürlüğü Yer Değişikliği Tadilatları	1	3,744.78	Tamamlandı.
3	Uzunburun Müteferrika Nezarethanesi Pencere Demiri Yapılması	1	2,360.00	Tamamlandı.
4	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün Oda Sistemine Dönüştürülmesi	1	4,312.41	Tamamlandı.
5	2 Nolu Ek Hizmet Binası Arka Cephe Pencerelerinin PVC Yapılması	1	10,659.65	Tamamlandı.
6	Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka ve Niksar Yolu Polis Lojmanları PVC Kapı ve Pencere Onarımları	1	152,102.00	Tamamlandı.
7	Uzunburun Hizmet Binaları Sıvı Yakıtlı Kalorifer Kazanı Değişikliği	1	7,280.60	Tamamlandı.
8	Karşıyaka Hizmet Binası Nöbetçi Kulübesi ve PVC Bölme Yapılması	1	6,490.00	Tamamlandı.
9	Yeşilyurt İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası İnşaatı	-	294,054.43	İş devam ediyor.
TOPLAM		8	493,559.54	

Uygulayan Birim: : ALMUS İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Emniyet Amirliği Nezarethane ve İfade Alma Odalarının Standartlaştırılması	1	12,000.00	Tamamlandı.
TOPLAM			12,000.00	

Uygulayan Birim: : ARTOVA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Emniyet Amirliği Hizmet Binası Bakım-Onarımı ve Nezarethanelerin Düzenlenmesi	1	25,100.00	Tamamlandı.
TOPLAM			25,100.00	

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2010 YILI
FAALİYET RAPORU**

İDARİ FAALİYETLER



1. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ:

S.No	İsmi	Katılan Personel Sayısı (adet)	Süresi (gün)
1	Müdürler Eğitim Semineri	2	5
2	Kamu İhale Mevzuatı	2	6
3	İmar Hizmetleri	1	5
4	e-içişleri	3	6
5	Muhasebe Yet. Eğitimi	2	16
6	KUDEP	5	92
TOPLAM		15	130

PERSONEL HARCAMALARI:

S.No	İsmi	Sayısı (adet)	Harcanan Kaynak (TL)
ÖZEL İDARE PERSONEL GİDER BÜTÇESİ			
1	Memur harcamaları	45	1,459,379.28
2	İşçi harcamaları	39	1,857,596.34
3	Sözleşmeli harcamaları	8	118,417.41
4	Geçici işçi harcamaları	2	29,394.50
TOPLAM		94	3,464,787.53
MÜLGA KHGM PERSONEL GİDER BÜTÇESİ			
1	Memur harcamaları	52	1,946,983.23
2	İşçi harcamaları	290	16,515,441.09
TOPLAM		342	18,462,424.32
GENEL TOPLAM			21,927,211.85

Not: Personel sayısı, 31.Aralık.2010 tarihindeki miktardır. Geçici işçiler 5 ay 29 gün çalışmaktadır.




2. ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Cinsi	Miktar (adet)
1	İl genel Meclisi Karar sayısı	263
2	İl Encümeni Karar sayısı	365

3. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SATIN ALIMLAR:

S.No	Cinsi	Miktar	Harcanan Ödenek (TL)
1	Alınan araç yakıtı miktarı	580000 lt	1,980,885.50
2	Alınan kalorifer yakıtı miktarı	217000 lt	
3	Alınan madeni yağ (antifriz, muhtelif yağ vb.	16164 lt	
4	Yedek parça ve servis ücreti işçiliği alımı	Muhtelif	1,120,000.00
5	Araç kiralama	12 adet	223,659.21
6	Araç satın alımı • Greyder 6 adet • Yükleyici kepçe 3 adet • Pick-up 1 adet • Binek araç 1 adet	11 adet	2,259,623.00
7	Diğer alımlar (mefruşat, haberleşme, büro malzemeleri, katı yakacak, temizlik malzemesi, sigorta, ilan vb.)	Muhtelif	1,538,782.12
TOPLAM			7,122,949.83

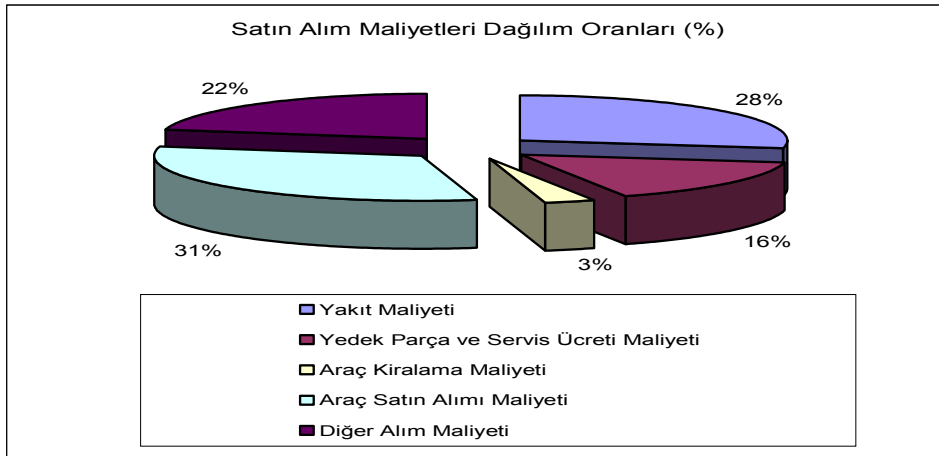

ATÖLYE FAALİYETLERİ:

S.No	Cinsi	Miktar (adet)
1	İş makineleri için açılan iş emri sayısı	163
2	Binek araçları için açılan iş emri sayısı	60
3	Kamyonlar için açılan iş emri sayısı	268
TOPLAM		491
4	Arazide tamir yapılan araç (iş makinesi ve kamyon) sayısı	557

KİRALIK MAKİNE ÇALIŞTIRMA

S.No	Cinsi	Miktar	Alınan Kira Bedeli (TL)
1	İş Makinesi (Dozer, Greyder, Silindir, Motoscraper, Trayler)	24 adet	23,938.38
TOPLAM			23,938.38

İHALE FAALİYETLERİ:

S.No	Cinsi	Miktar (adet)
1	Mal alım ihalesi - Akaryakıt ürünleri ve madeni yağ alımı (9 adet) - Trafik işaret ve levhası alımı (1 adet) - PVC, HDPE, Korige boru ve yardımcı malzeme alımı (2 adet) - Beton parke tesisi (1 adet) - Yedek parça alımı (1 adet) - Fren test cihazı ve ekipmanları alımı (1 adet) - Yoğuşmalı kazan alımı ve montajı (1 adet) - Güvenlik kamera sistemi (1 adet) - Kömür ve tutuşturucu odun alımı (1 adet) - Kalyak (Fuel oil) alımı (1 adet) - Sıra masa tablası alımı (1 adet)	20
2	Hizmet alım ihalesi - Araç kiralama (Minibüs ve kazıcı kepçe) (1 adet) - Diğer hizmet alım (Zorunlu sigorta yaptırılması) (1 adet) - Milli Eğitim öğrenci taşıma ihalesi (1 adet)	3
3	Doğrudan temin (Küçük ölçekli yedek parça, işçilik, inşaat, elektrik, temizlik malzemesi vb. alımlardır.)	315
TOPLAM		338

4. İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Cinsi	Miktar (TL)
1	Lojman Kira Geliri (TL)	117,271.14
2	Diğer taşınmaz kira geliri (TL)	424,051.43
TOPLAM		541,322.57

5. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Cinsi	Miktarı (adet)	Harcanan Kaynak (TL)
1	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon	129	192,417.45

S.No	Cinsi	Toplantı Sayısı (adet)	Elde Edilen Gelir Miktarı (TL)
1	26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Süleyman DEMİREL Salonu Kiraya verilmesi	90	14,250.00

6. YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Cinsi	Harcanan Kaynak (TL)	İşin Durumu
1	Merkez İlçe idari binalar, atölye binaları, sosyal tesisler, ilçe kaymakamlık sosyal tesisleri, bakım evleri ve Vali Konağı bakım-onarım	359,197.24	Tamamlandı.

7. PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

PLANLAMA FAALİYETLERİ:

S.No	İsmi
1	Tokat İl Özel İdaresi 2009 Yılı Faaliyet raporu
2	Tokat İl Özel İdaresi 2011 – 2015 Yılı Stratejik Planı
3	Tokat İl Özel İdaresi 2011 Yılı Performans Programı

İHALE FAALİYETLERİ:

S.No	Cinsi	Miktar (adet)
1	YAPIM İHALESİ (Onarım, Güçlendirme, Tamamlama) • Tokat Merkez Sağlık Meslek Lisesi Onarım İnşaatı işi • Artova Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım İşİ • Artova ilçesi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Yatakhane Tadilat ve Onarım İşİ • Niksar Albayrak İ.Ö.O Güçlendirme İnşaatı İşİ • Tokat Merkez Yetiştirme Yurdu Hizmet Binası Onarım İnşaatı • Turhal İlçesi Kazım Karabekir İ.Ö.O Onarımı İşİ • Reşadiye Bozçalı GOP İ.Ö.O, Bereketli İ.Ö.O-Başçiftlik Hatıpli İÖO Onarım İşİ • Niksar Ulvi Saime YİBO ve Kaya İsmet Özden İlköğretim Okulu Onarım İşİ • Başçiftlik İlköğretim Okulu Çevre Düzenleme İşİ ve Karacaören İlköğretim Okulu Onarım İşİ • Almus İlçesi Babaköy İ.Ö.Okulu Onarımı - Çevreli Kasabası Şehit Abdullah Eymür İ.Ö.O. Onarım İnşaatı • Yeşilyurt Kuşçu Pompa Kanalları Tamamlama Tesisi • Niksar Çalca, Günebakan ve Mahmudiye Köyleri İÖO Bakım Onarım • Reşadiye Bereketli, Taşlıca ve Kızılcaören İ.Ö.O. Onarım İşİ • Merkez Çökelikkışla, Ormanbeyli, Gözova ve Kadıvakfı Köyleri İÖO Onarım İnşaatı	46

	• Zile Melikgazi ve Hüseyin Gazi İ.Ö.O. Onarım İşi • Tokat Bozatalan Köyü Kalorifer ve Onarım İşi • Tokat Rehberlik Araştırma Merkezi, Yavuzselim İ.Ö.O. ve İş Okulu Onarım İşi • Çat Kasabası, Beşören Köyü ve Kızılöz Köyü İ.Ö.O. Onarım • Tokat, Turhal ve Zile Kız Meslek Liseleri Onarım İşi • Tokat Mesleki Eğitim Merkezi, Pazar Halk Eğitim Merkezi ve Almus Halk Eğitim Merkezi Onarım İşi • Turhal Merkez Hürriyet Şeker İ.Ö.O. ve Mehmet Akif İ.Ö.O. Onarım İşi • Zile-Turhal Eğitim Uygulama ve İş Eğitim Merkezi Onarım İşi • Zile İlçesi Anaokulu İlave Mutfak Yapım İşi • Tokat Merkez Atatürk, Cumhuriyet, GOP, Anadolu ve Artova Lisesi Onarım İşi • Tokat Merkez Çamağzı, Kızılköy ve Bedestenlioğlu İ.Ö.O. Onarım İşi • Tokat Sulusaray Cumhuriyet İ.Ö.O. Çevre Düzenleme ve Yeşilyurt İMKB YİBO Onarım İşi • Tokat Turhal Kızkayası Köyü Elektromotopompaj SST Tamamlama İnşaatı İşi • Erbaa Keçeci ve Doğanıyurt Köyleri İ.Ö.O. Onarım İşi • Tokat Merkez Akın-Çubuklu-Ortaören ve Kervansaray Köyleri İlköğretim Okulları Onarım İşi • Almus İlçesi Çok Programlı Lisesi ve Zile Endüstri Meslek Lisesi Onarım İnşaatı İşi • Niksar Danişmentgazi Lisesi ve Reşadiye Lisesi Onarım İnşaatı İşi • Tokat Merkez Söngüt, Taşlıçiftlik, Ulaş, K.Bağlar ve B.Bağlar Köyleri İ.Ö.O. Onarım İşi • Turhal İlçesi Atatürk İ.Ö.O., Alparslan İ.Ö.O.,Cengiz TOPEL İ.Ö.O. ve Yazıtepe Köyü İ.Ö.O. Onarım İşi • Tokat Geyras Mahallesi Öğ. Rukiye SARIER BUMİN An. Ek Yapım İşi	
--	---	--

	• Reşadiye Bereketli ÇPL Reşadiye EML Onarım İşi • Tokat Merkez 26 Haziran ve Dedeli İ.Ö.Okulları Onarım İşi • Tokat Merkez Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Özürlü Müracaat Bürosu Onarım işi • Artova İlçesi YİBO (2.Kısım) Genel Onarım İnşaatı • Tokat Anadolu İ.H.L ve Reşadiye İ.H.L. Onarım İşi • Tokat Bağbaşı ve Çerçi İ.Ö.O. Onarım İşi • Tokat-Erbaa-Reşadiye Ticaret Meslek Liseleri Onarım İşi • Almus Akarçay YİBO Oda Tipine Dönüştürme ve Merkez Atatürk İ.Ö.O. Onarımı • Turhal Yenisu, Necip, Tatlıcak ve Hacılar Köyleri İ.Ö.O. Onarım İşi • Tokat Merkez Yavuz Selim İlköğretim Okulu ve İş Okulu Onarım İşi • Erbaa İlçesi Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Onarım İnşaatı • Tokat Vali Konuk Evi Dış Cephe Onarım İşi	
2	YAPIM İHALESİ (Yeni Yapım) • Erbaa İlçesi Hacı Fatma Uslu İlköğretim Okulu Ek Bina Kalorifer Tesisatı Yapım İşi • Tokat ili Sulusaray İlçesi Ballıkaya Köyü 4 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi • Tokat Merkez Topçubağı Mahallesi 18 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi • Niksar İlçesi Yolkonak Kasabası 2 Derslikli İ.Ö.O. İnşaatı Yapım İşi • Tokat Turhal Koruluk ve Gümüştop Köyleri SST Yapım İşi • Niksar Arıpınarı ve Işıklı Köyleri SST Yapım İşi • Merkez Yayladalı ve Gözova Köyleri SST Yapım İşi • Tokat Merkez Çördük, Daylıhacı ve İhsaniye Köyleri SST Yapım İşi • Tokat Turhal Hamidiye Köyü SST Yapım İşi • Sulusaray Alanyurt Köyü SST Yapım İşi • Yeşilyurt Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve Lojman Binası Yapım İşi	35

	• Tokat Niksar Camidere Yağmurlama Sulama Tesisi 1. Kısım Yapım İşi • Tokat Merkez Aşağıfındere ve Semerci Köyleri SST Yapım İşi • Tokat Merkez Kadıvakfı ve Çamdere Köyleri SST Yapım İşi • Tokat Merkez Kabatepe köyü YAS ve Göletten Yağmurlama SST Yapım İşi • Tokat Reşadiye Yolüstü Kasabası SST Yapım İşi • Tokat Merkez Yelpe Köyü SST Yapım İşi • Tokat Erbaa Çerkezfindıcak Köyü SST Yapım İşi • Tokat Turhal Yazıtepe ve Kat Kasabaları Sulama Suyu İnşaatı İşi • Tokat Almus Çevreli Kasabası Gölet Yapım İşi • Tokat Niksar Yakınca Köyü Yağmurlama SST Yapım İşi • Tokat Merkez Keşlik SST Yapım İşi • Erbaa Karayaka Başaralar YİBO Spor Salonu İnşaatı • Tokat Merkez Halilalan Köyü ve Erbaa Karaağaç Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi • Tokat Merkez Yayladalı Ana Okulu İnşaatı • Niksar Gürçeşme Ek 4 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi • Erbaa Doğanyurt ve Bağpınarı Köyleri Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi • Turhal İlçesi Sarıkaya Köyü 1000 kişilik ve Gümüştop Köyü 750 Kişilik Doğal Arıtma Tesisleri Yapım İşi • Tokat Pazar Tatar Köyü 75 tonluk İçme Suyu Deposu, İçme Suyu Hattı ve Turhal Dökmetepe Köyü 50 tonluk İçme Suyu Deposu Tamirâtı, İçme Suyu Hattı Yapım İşi • Erbaa Hacıpazar Köyü İlköğretim Okulu Yapım İşi • Pazar Ocaklı Köyü 2 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi • Turhal İlçesi Cumhuriyet Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Doğalgaza Dönüşüm İşi • İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Beton Parke Üretim Tesisine Çelik Çatı Yapım İşi • Tokat E.M.L. Doğalgaz Dönüşüm İşi	
--	---	--

	Tokat Vali Konuk Evi Onarımı ve 3 Araçlık Kapalı Garaj Yapım İşi	
3	HİZMET ALIM İHALESİ 2 Kalem Mühendislik Hizmetleri Alım İşi - Zile Huzurevi Binası Güçlendirme Projesi Müh. Hizmetleri Alım işi	2
TOPLAM		83

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2010 YILI
FAALİYET RAPORU**

**IV - KURUMSAL KABİLİYET VE
KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ**

A – ÜSTÜNLÜKLER

Kuvvetli Yönler	Düşünceler
1) Kurumun kendi idari yapısında ve görev alanındaki hizmetlerde; karar alma ve uygulama, serbestliğine ve yetkiye sahip olması.	İl Özel İdaresi 5302 Sayılı Kanunla birlikte, görev alanı içerisinde yatırımların kararlarını alabilme, bütçelendirme ve uygulama yetkisine ve serbestliğine sahip olmuştur. Bu durum birçok olumlu gelişmeyi beraberinde getirmiştir. Bunlar; • Yerel problemlerin çözümünde ve yatırım kararlarında daha hızlı karar alma süreci ve uygulamanın daha hızlı gerçekleştirilmesi. • Yatırım kararı alma süreçlerinde, yörenin problemlerine vakıf kişi ve kurumların yer almasından dolayı, yatırımların etkinliğinin artması. • Kurumlar arası işbirliğinin daha yüksek düzeyde gerçekleştirilebilmesi.
2) Kurum idari ve teknik personelinin, hizmetlerini yapar iken kullandığı makine ve ekipmanın, günümüz bilgi ve iletişim çağıyla uyumlu olması.	Kurum personeli yeniliklere açık ve yenililere adapte olabilen bir yapıya sahiptir. Özellikle teknik birimlerde proje yapım ve uygulamaları, daha yenilikçi bir yapıda olmayı gerektirmiştir. Kurum bu yönde her türlü katkıyı personeline sağlamıştır. Tüm personel, haberleşme ve iletişim imkânına sahiptir. Özellikle teknik birimler, proje ve uygulama aşamasında kullanabilecekleri ekipman ve bilgisayar programları ile desteklenmiştir. Bununla birlikte, teknolojik gelişim devamlı takip edilerek, gelişimlerden uzak kalınmamalıdır.
3) Hedef kitlenin gelişmeye açık olması, yatırımların uygulamaya aktarılmasında gösterdikleri uyum ve katılımcılık.	Kurum hedef kitlesi genel olarak, kırsalda yer almaktadır. Burada yaşayan insanların, genel olarak temel ihtiyaçları olan yol ve içme suyu problemleri halledilmiş olmakla birlikte, daha kaliteli bir altyapı ve ekonomik güçlerini artıracak hizmetlerin gerçekleşmesini istemektedirler. Hedef kitle, hizmetin gerçekleştirilmesinde, kamuya her türlü kolaylığı sağlamaktadırlar. Böylece kurum faaliyetlerinin hızı ve etkinliği artmaktadır.

4) Kurumun bu zamana kadarki uygulamaları neticesinde, halkta ve diğer kurumlarda oluşturulan güven duygusu.	İl Özel idaresi; yaptığı yatırımların yüksek düzeyde hedefe ulaşma oranı, idarenin kurum faaliyetlerine vakıf olması ve mali saydamlığı ön planda tutması, yatırımların ve mal alımlarının finansmanından dolayı herhangi bir kuruluşun sıkıntıya düşürülmemesi, yatırımların gerçekleştirilmesinde diğer kamu kurumları ile işbirliğinin sağlanması gibi sebeplerden dolayı toplumda güven tesis etmiştir. Kurum bu güvenin vermiş olduğu rahatlıkla, yatırımlarını daha yüksek bir kararlılıkta gerçekleştirebilmektedir.
---	--

B – ZAYIF YÖNLER

Zayıf Yönler	Düşünceler
1) Yatırımlarda, öncelik kriterlerinin ve uzun dönem stratejilerinin belirlendiği kurum master (kalkınma) planının olmayışından dolayı, projelendirmelerde hizmetin gerekliliği ile ilgili uzun vadeli planlamaların yapılamayışı.	Kurumun görevleri ile ilgili uzun vadeli planlamalarda faydalanılacak ve yatırımların etkinliğini artırmaya yarayacak bir master plan yapılamamıştır. Bununla birlikte, yol yapım faaliyetleri ile ilgili bir uzun dönem planlamaya yönelik bir master plan çalışması bulunmakta ve faydalanılmaktadır. Bu çalışmanın tüm faaliyetler için (inşaat-iskan, tarım, eğitim, sağlık vb.) bulunması, yapılan yatırımların etkinliğini artıracaktır. Bununla birlikte, stratejik planlama yaklaşımının gelmesi, bu konudaki bazı açıkları kapatmaya yönelik bir adımdır. Esas olarak, hazırlanan stratejik planların, master plan ile uyumlu olması ve master planın gösterdiği amaçlara yönelmesi gerekmektedir.
2) Yatırımların sürdürülebilirliğinin artırılmasına yönelik olarak, yatırım sonrası izleme değerlendirme sürecinin tam olarak yapılamaması ve yatırımların kurumsal bir işletme yapısına teslim edilemeyişi.	Yatırımların sürdürülebilir olmasında iki temel husus vardır. Bunlar yatırım sonrası izleme ve yatırımların işletilmesi hususudur. Özellikle, bu konuda sıkıntı çekilen yatırımlar kırsala yönelik içme suyu, sulama tesisi gibi yatırımlardır. Bu tesisler köy tüzel kişiliğine teslim edilmektedir. Köylerde yatırımlar için profesyonel bir işletme anlayışının olmayışı, tesislerin etkin bir şekilde kullanılamama problemlerini getirmektedir. Sürdürülebilirlik ile ilgili birinci problem olan yatırım sonrası izleme ve değerlendirme, kurumun sorumluluğundadır. Kurumun bu zamana kadar, bu tür bir çalışma stratejisi olmamıştır. Bununla birlikte, bu tür çalışmaya yönelik önem gittikçe anlaşılmakta ve çalışma başlatma eğilimi bulunmaktadır. Çok kısa bir süre içerisinde bu yöndeki eksikliklerini giderecektir. Böylece yapılacak yeni yatırımlarda, olabilecek hatalarını düzeltebilme ve yatırım etkinliğini artırabilme şansını yakalayacaktır. Yatırımların sürdürülebilirliğini etkileyen bir diğer problem ise yatırım sonrası işletme problemidir. Bu problem daha

	çok sulama ve içme suyu tesislerinde kendini göstermektedir. Sulama tesislerinde, yeraltı suyu ile sulama tesislerinde işletim için sulama kooperatifi kurdurulma zorunluluğu bulunmaktadır. Diğer sulama tesislerinde de aynı yaklaşım veya muhtarlık içerisinde bir idareci bulundurulma zorunluluğu gibi bir yaklaşım getirilebilir. İçme suyu tesislerinde ise su saati kullanımının yaygınlaştırılmasıyla düzenli bir su kullanımı sağlanacaktır.
3) Kurum iş makineleri ile ulaşım araçlarının genel olarak ekonomik ömrünü doldurmuş olması.	İl Özel İdaresinin genel araç yapısını, Mülga Köy Hizmetlerinin araçları oluşturmaktadır. Bu araç yapısını, ulaşım ve iş makineleri olarak ayırabiliriz. Her iki yapıdaki araçlarda genel olarak ekonomik ömrünü doldurmuş durumdadır. Bu durum, Kurumun yatırım etkinliğini zayıflatmakta ve yatırım maliyetini artırmaktadır. Bu konuda çözüme yönelik çalışmalar ve stratejiler bulunmaktadır. Ulaşım araçlarına yönelik strateji, çekirdek bir araç parkının oluşturulması ve geriye kalan araç ihtiyacının kiralama ile karşılanmasıdır. Bu yönde yapılacak bir yaklaşım ile hem ulaşım aracı ihtiyacı karşılanacak ve hem de idari giderlerde (yakıt, yağ, yedek parça) önemli tasarruflar sağlanacaktır. Kurumun bir diğer araç grubunu ise iş makineleri oluşturmaktadır. Kurum iş makineleri genel olarak yol yapımı ile ilgilidir. Kurum, diğer yatırımlarını (sulama tesisleri, kanalizasyon, içme suyu, okul yapımı, sağlık tesisi yapımı vb.) müteahhitlik hizmetleri ile karşılamakta olup, yol yapımı ve bakım hizmetlerinde de müteahhitlik hizmetlerine geçme eğilimindedir. Bununla birlikte bu konudaki müteahhitlik hizmetlerinin tam olarak oluşmaması, Kurum makine parkının ve mevcut işçilerin kısa bir süre içerisinde atıl bir duruma getirilmesinin oluşturacağı iş gücü ve maddi kayıp, bu konuda daha temkinli bir geçiş yapmayı gerektirmektedir.

4) Kurum bilgi işleme, veri değerlendirme ve arşivleme sisteminin istenilen seviyeye ulaştırılamaması.	Günümüz modern dünyasında; kurumlar yaptıkları hizmetleri ve müşteri ile olan ile olan ilişkilerini bir bilgisayar tuşu ile görebilme şansına sahiptir. Tokat İl Özel İdaresi bu konularda yaklaşık bir yıl içerisinde önemli mesafe kaydetmiş ve e-devlet sistemine geçerek, yazışmalarını elektronik ortamda gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu önemli bir adımdır. Bununla birlikte bu konuda diğer adımlarında atılması gerekmektedir. Özellikle yapılan yatırımların, her an izlenmesini mümkün kılacak bir elektronik ortamın oluşturulması gerekmektedir. Bilgiye anında ulaşılabilmelidir. Geçmişe yönelik bütün yatırımların yeri, amacı ve durumu elektronik ortama aktarılmalı ve takip edilebilmelidir. Arşivleme özellikle yatırımlar bazında, hem normal dosyalama ile hem de bilgisayar ortamında yapılmalıdır. Böylece yatırımları takip edebilmemiz mümkün olabilecektir. Bu konuda da Müdürlükler bazında bazı çalışmalar başlatılmaktadır. Özellikle, yeni uygulanmaya başlanan, performans programı ve faaliyet raporu yaklaşımı, bu tür bir çalışmayı zorunlu hale getirmektedir.
---	---

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2010 YILI
FAALİYET RAPORU**

V - ÖNERİ VE TEDBİRLER

Tokat İl Özel İdaresi, gelişmiş ülkeler seviyesinde kurum ve hizmet anlayışına kavuşmayı ve sorumlu olduğu insanların yaşam düzeyini artırmayı hedeflemiştir. Ülkemiz insanlarını, hak ettikleri hizmete kavuşturmak için, daha hızlı bir gelişme düzeyini yakalamamız gerekmektedir. Ancak bu yapılabildiği takdirde, gelişmiş ülkelerin standartları yakalanabilecektir. Bunu yapabilmek ise, problemleri günlük çözme yaklaşımı yerine, problemleri daha geniş perspektiflerde değerlendirmek ve çözümleri bu süreç içerisinde geliştirmek ile mümkündür. Bu yapılabildiği takdirde, çözümler daha kolay olacak, yeni problemler oluşturmayacak ve kaynak tasarrufu sağlanacaktır. Master plan, Stratejik plan ve performans programları, bu amaca hizmet etmek amacıyla geliştirilmiştir. Stratejik plandan istenilen faydanın sağlanması; stratejik planın sahiplenilmesi, performans programları ile titizlikle uygulanması ve master plan ile desteklenmesi ile mümkündür.

Kurum, son yapılan kanuni düzenlemeler ile birlikte çok önemli bir değişim sürecinden geçmektedir. Bu değişim süreci, aynı zamanda yenilenme için bir fırsattır. Kurum, geçmişinden gelen çok önemli idari ve teknik kapasiteye sahiptir. Bu kapasite modern yönetim ve teknoloji ile desteklendiği ve yatırım kararları alınırken bu teknik kapasite kullanılabildiği takdirde, hizmetlere olumlu olarak yansıtacak ve kurum performansı artacaktır. Ayrıca, Kurum kendi personelini, modern yönetim anlayışı içerisinde organize etmek ve de modern iletişim ve bilgi sistemleri ile donatmak durumundadır. Bununla birlikte, Kurum insana verdiği değeri üst düzeye taşıyarak, kurum – müşteri ilişkilerinde elektronik ortamı kullanmaya yönelik çalışmalara başlamalıdır. e-devlet uygulamasını yaklaşık üç yıl gibi bir sürede bütün kuruma yayması ve etkin olarak kullanmaya başlaması ve e-imza uygulamasına geçilmesi, elektronik ortamda çok daha fazla gelişimlere ulaşacağının önemli bir göstergesidir.

Kurum kendi bünyesi içerisinde ürettiği ve desteklediği projelerde, projelerin sosyal ve ekonomik faydasını ortaya koyan, etkin değerlendirme sistemlerine geçmek durumundadır. Projeler sadece teknik detaylardan oluşturulmamalı ve etkin gerekçelendirmelerle desteklenmelidir. Bu yapılabildiği takdirde, projelerin etkinliği artacaktır.

Tokat İl Özel İdaresi, yatırımlarını çok geniş bir alanda sürdürmekte ve birçok farklı kurum ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmektedir. Yatırımların etkinliğinin artırabilmesi için yatırım sonrası izleme ve değerlendirme sürecini başlatmak durumundadır. Bunun için yapılması gereken, yatırım bilgi ve izleme süreci için sistemler geliştirilmelidir. Her an izlenmesini mümkün kılacak, elektronik yazılım ve formatlardan istifade edilmelidir. Bu yapılabildiği takdirde, yatırımların daha etkin bir şekilde yönlendirilmesi ve planlanması yapılabilecektir.

Sonuç olarak, Stratejik Planda yer alan hedeflere ulaşmak, tüm vatandaşlara yerinde ve adil bir şekilde hizmetleri ulaştırabilmek için özel idarenin gelirlerinin artırılması önem arz etmektedir.
