


T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ



2012
FAALİYET RAPORU

[2013]

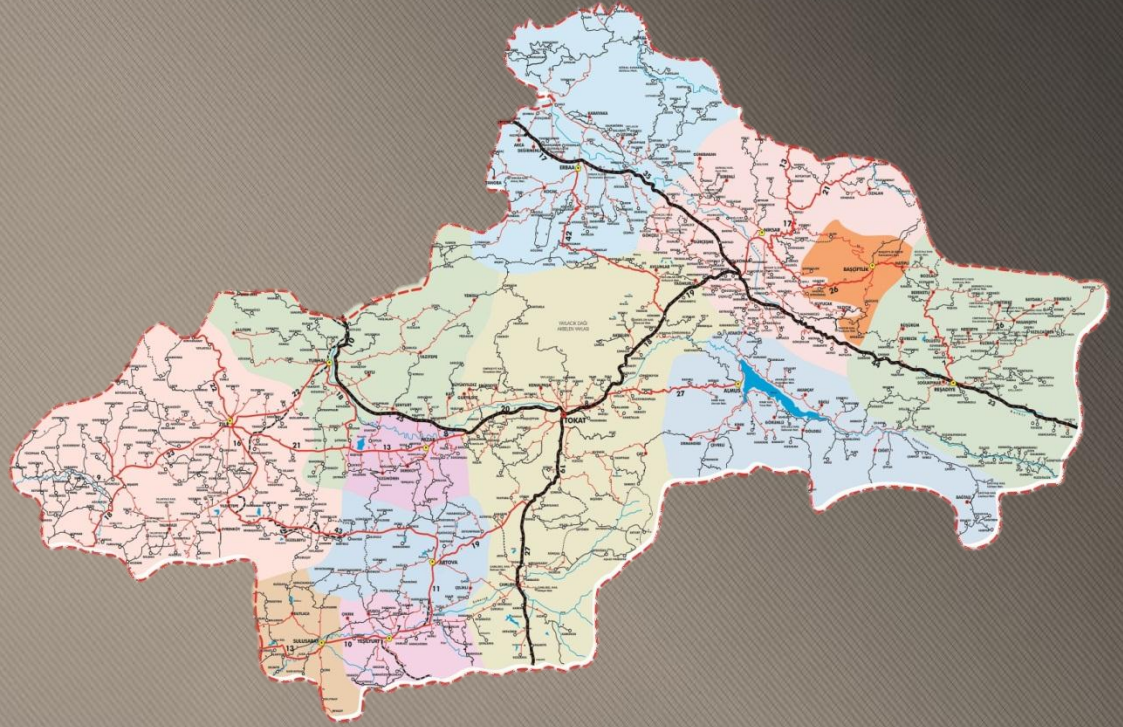

**Türk Milletinin istidadı ve
kesin kararı medeniyet
yolunda, durmadan,
yılmadan ilerlemektir.**

K. Atatürk

SUNUŞ

Mahalli İdareler, halkın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetler üreten, katılımcı demokrasi ilkelerinin müşahhas olarak hayata geçtiği, idari ve mali bakımdan özerk demokratik yönetim birimleridir.

Bu bakımdan mahalli idareler reformunda temel mantık ve felsefe; mahalli müşterek hizmetlerin yürütülmesi sırasında halka hesap veren, demokratik, şeffaf, öngörülebilir ve iyi yönetim ilkelerinin hâkim olduğu bir mahalli idare yapısının kurulması, bir işi en iyi orada yaşayanların anlayıp / bilebileceği, en süratli ve isabetli kararların da mahallinde alınabileceği fikridir.

Bu demokratikleşmenin gerçekleşmesinde önemli bir safhadır. Mahalli İdarelerimizde kamu görevlisi olarak çalışanlarla, mahallinden seçilmiş temsilcilerin müştereken çalışması sonucu işler daha iyi gerçekleştirilmiş olacak, böylece toplumsal huzur ve refah da artacaktır.

İl Özel İdarelerimizce, kanunlara uygun, çağın gereklerini dikkate alan ve işleri ehline veren anlayışla hareket edilmiştir. Meclisimiz ve Encümenimiz daha faal hale gelmiştir. Bu yeni süreçte, yerinde, zamanında, süratli ve isabetli kararlar alınmak suretiyle kamu hizmetleri hızlandırılmıştır.

2012 yılında, kırsal alanda altyapı, imar ve ruhsat faaliyetleri ile bütün yerleşim birimlerini çağın gereklerine uyumlu hale getirmek; tarımsal altyapı çalışmaları yaparak insanları üretken hale getirmek; eğitim, sağlık ve spor altyapısını geliştirmeye yönelik faaliyetler ile eğitilmiş ve sağlıklı bir toplumun oluşturulmasına katkı sağlamak; kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve tanıtımına destek sağlayarak, İlimizin tanıtımına ve toplumun kültürel gelişimine katkı sağlamak amaçlı pek çok faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

2012 yılı faaliyet raporunu hazırlayan ilgili yönetici arkadaşlarımı hem bu rapor, hem de yıl içinde gösterdikleri başarılı çalışmaları nedeniyle kutluyor ve bundan sonraki yıllarda kendilerine daha ileri hedefler için üstün başarılar diliyorum.



Mustafa TAŞKESEN
Vali

Üst Yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsisi edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim

Mustafa TAŞKESEN

Tokat Valisi

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim

Recep GÖKÇE
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun “III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Gürsel YILDIZ
Mali Hizmetler Müdürü

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER	1
A – Misyon ve Vizyon	2
B – Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
C – İdareye İlişkin Bilgiler	4
1. Fiziksel Yapı	4
2. Örgüt Yapısı	6
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	10
4. İnsan Kaynakları	12
5. Sunulan Hizmetler	17
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	18
II – AMAÇ VE HEDEFLER	20
A – İdarenin Amaç ve Hedefleri	21
B – Temel Politikalar ve Öncelikler	31
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	36
A – Mali Bilgiler	37
1. Bütçe Uygulama Sonuçları	37
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	42
B – Performans Bilgileri	45
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri	45
2. Performans Sonuçları Tablosu ve Değerlendirilmesi	56
• İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	57
• Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri	93
• Tarımsal Hizmetler	104
• Sanayi ve Ticaret Hizmetleri	124
• Ruhsat ve Denetim Hizmetleri	127
• Sağlık Hizmetleri	140
• Kültür ve Turizm Hizmetleri	142
• Çevre Koruma ve Dinlenme Hizmetleri	151
• Sosyal Hizmetler	154
• Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri	157
• İdari Faaliyetler	160
IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN GEĞERLENDİRİLMESİ	171
V – ÖNERİ VE TEDBİRLER	176

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2012 YILI
FAALİYET RAPORU**

I - GENEL BİLGİLER

A – MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz:

Adil, şeffaf, hızlı ve etkin, kaynak israfına müsaade etmeyen, hizmet ve yatırımlarda vatandaş memnuniyetini esas alan temel ilkeler ışığında ve yasalarla belirlenen görev sınırları içerisinde yaşayan yöre halkına; eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, gençlik ve spor, güvenlik, acil yardım ve kurtarma alanlarında hizmet vermektir.

Vizyonumuz:

Çağdaş beklentilere yakışır bir kalite ve hizmetin tüm topluma sunulduğu; bulunduğu ortamda mutlu, huzurlu ve geleceğe ümitle bakan insanlara sahip bir Tokat.

B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İl Özel İdaresisinin görev ve sorumlulukları; 5302 sayılı kanunun 6. maddesinde şu şekilde belirlenmiştir.

- a) Sağlık, Gençlik ve spor, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,
- b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ... ; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. FİZİKSEL YAPI

Bina Durumu:

Çizelge 1. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait bulunan binalar ve kullanım amacına göre dağılımı.

BULUNDUĞU YER	VALİLİK KONUTU	HİZMET BİNASI	KAYMAKAM EVİ	MEMUR LOJMANI	OKUL	SAĞLIK OCAĞI	İŞYERİ
MERKEZ	1	4		62	20	1	1
ALMUS			1		5		14
ARTOVA		1	1	2	1		
BAŞÇİFLİK			1			1	
ERBAA		2	1	2	5	1	
NİKSAR		2	1	6	18	2	
PAZAR			1		2		
REŞADİYE		2	1	1	16		
SULUSARAY			1		1		1
TURHAL		1	1	1	11	2	
YEŞİLYURT			1		2		
ZİLE		2	1	1	10	2	4
TOPLAM	1	14	11	75	91	9	20

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan binalar Çizelge 1 ile verilmiştir. Toplam bina sayısı 186'dır. Bu binaların içerisinde işyeri olarak, Sulusaray Kaplıcası da yer almaktadır. Ayrıca İl Özel İdaresine ait merkez ve ilçelerde arsalar bulunmaktadır. Bu arsalar; eğitim, sağlık binaları, çeşitli kamu hizmetleri binaları ve rekreasyon alanları olarak kullanılmaktadır.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan binalar Çizelge 1 ile verilmiştir. Toplam bina sayısı 186'dır. Bu binaların içerisinde işyeri olarak, Sulusaray Kaplıcası ile Merkez Gıj Gıj tesisleri de yer almaktadır. Ayrıca İl Özel İdaresine ait merkez ve ilçelerde arsalar bulunmaktadır. Bu arsalar; eğitim, sağlık binaları, çeşitli kamu hizmetleri binaları ve rekreasyon alanları olarak kullanılmaktadır.

Araç ve Ekipman Durumu:

Çizelge 2. İl Özel İdaresi araç – makine park durumu.


S.No	Cinsi	Miktarı (Adet)	S.No	Cinsi	Miktarı (Adet)	S.No	Cinsi	Miktarı (Adet)
1	Otomobil	25	12	Yıkama cihazı	2	23	Roly tank	1
2	Pick-up	14	13	Paletli yükleyici	1	24	Kar püskürtme makinesi	1
3	Midibüs	5	14	Lastik tekerlekli yükleyici	9	25	Treyler Salı	5
4	Damperli kamyon	40	15	Kanal kazıyıcı	12	26	Kamp trayler	37
5	Sabit kasalı kamyon	1	16	Motor scrayper	2	27	Lastik tekerlekli silindir	2
6	Çekici	2	17	Trancher	1	28	Vibrasyonlu silindir	5
7	Forklift	2	18	Kompresör	5	29	Bakım (yama) silindiri	2
8	Mazot Roly tank	1	19	Paletli kaya delici	2	30	Seyyar kaynak makinesi	1
9	Yapım grayder	20	20	Asfalt yapım distribitörü	3	31	Jeneratör	1
10	Dozer	13	21	Asfalt bakım distribitörü	1	32	Damper Dorse	2
11	Lastik tekerlekli traktör	2	22	Kamyona monteli roly tank	2	33	Eskavatör	1
TOPLAM								223

Kurumun hizmetini gerçekleştirmesinde en önemli kaynağını iş makineleri ile ulaşım araçları oluşturmaktadır. İl Özel İdaresinin sahip olduğu makine park durumu çizelge 2’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Buna göre; kurumun çeşitli tipte 44 adet ulaşım aracı ile 179 adet iş makinesi bulunmaktadır.

2 - ÖRGÜT YAPISI

Organizasyon Şeması:

Tokat İl Özel İdaresi, 5302 sayılı kanunun 36.maddesine norm kadro ilke ve esaslarına göre yeniden 2007 yılı sonu itibariyle yeniden oluşturulmuştur. 2013 yılı Mart ayı itibariyle mevcut teşkilat yapısı aşağıda liste halinde verilmiştir.

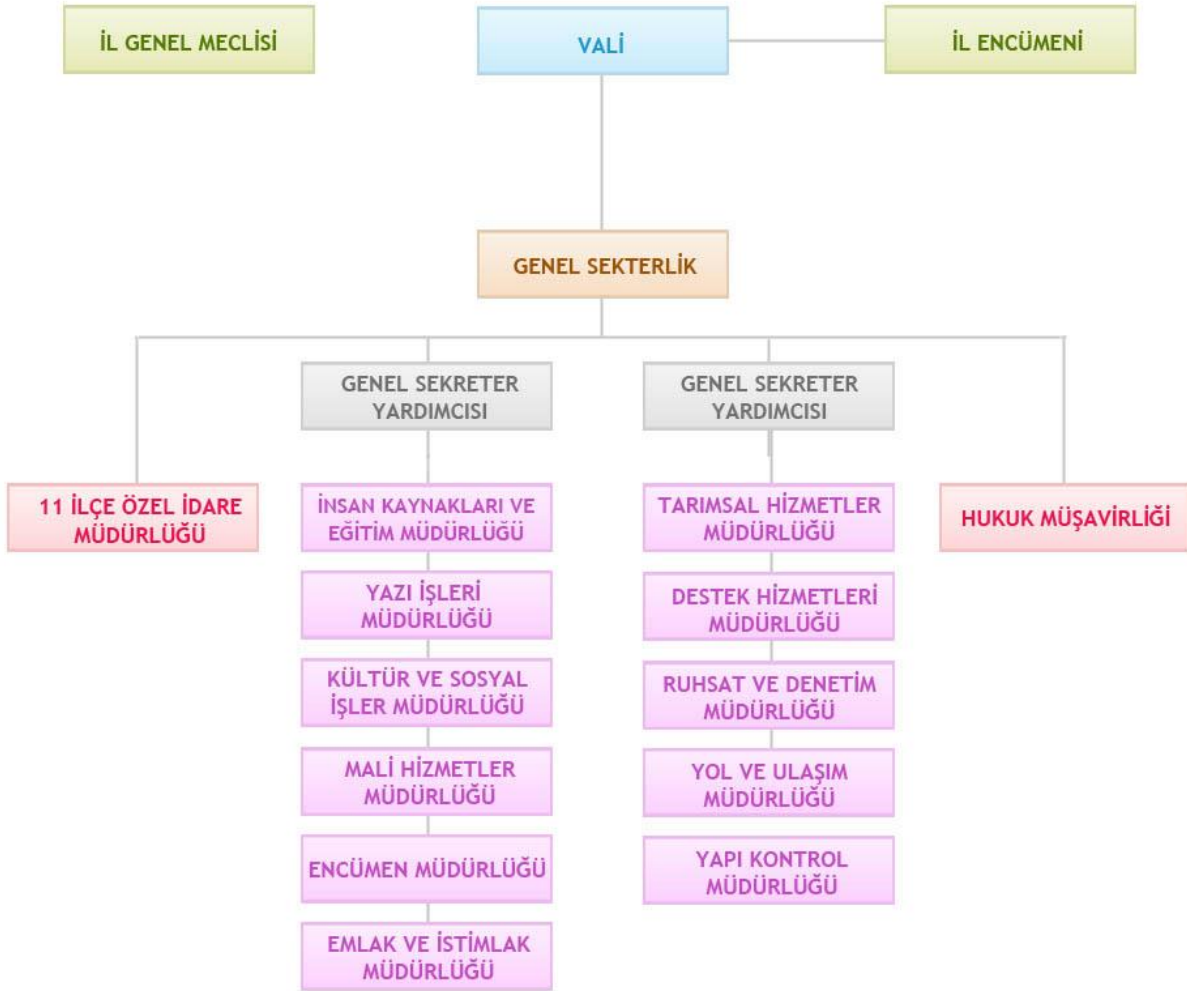

İl Özel İdaresi Organları:

- **İl Genel Meclisi:**

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl genel meclisine kanunla özel yetkiler verilmiştir. Örneğin, meclis, il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar verebilmektedir. İl genel meclisi, üyeleri arasından gizli oyla seçilen bir başkan tarafından yönetilir. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Gündem, meclis başkanı tarafından belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Valinin önerdiği hususlar gündeme alınır. İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde valiye gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez. Vali tarafından itiraz edilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de il genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Fakat valinin, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurma yetkisi vardır. Kanuna göre il genel meclisi, il özel idaresini periyodik olarak denetler. Bunun için il genel meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Komisyon, çalışmasını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, mart ayının on beşine kadar meclis başkanlığına sunar.

- **İl Encümeni:**

Kanuna göre il encümeni, valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Böylece encümenin toplam 11 kişiden oluşması öngörülmüştür. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. İl encümeni, Yönetim Komitesi veya İcra Komitesi gibi vazife görür. Encümenin en önemli görevi stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmektir. Encümenin, haftada en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanması öngörülmüştür. İl encümeni ile vali arasındaki ilişkiler de önemli olan bir konudur. Kanuna göre vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü

encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen, eğer kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, vali, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. Bu uygulamayla bir taraftan kararların uygulanmasına sürat getirilmek istenmiş, diğer taraftan ise valinin de her halükarda gücü ve vesayet yetkisi korunmuştur.

- **Vali:**

Kanuna göre vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu niteliği ile aynı zamanda il encümenin başkanıdır. Vali, il özel idaresinin en üst amiri olarak kurumu yönetmek, hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Kanun, valiye, il özel idaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak, faaliyetlerin ve personelin performans ölçütlerini belirlemek, uygulatmak, izlemek ve bunlarla ilgili raporları meclise sunmak görevini vermiştir. Valinin stratejik planla ilgili belirli yükümlülükleri vardır. Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde stratejik planı hazırlamak zorundadır. Stratejik plan; kalkınma plan ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak hazırlanır. Stratejik plan ve ayrıca ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans planı vali tarafından il genel meclisine sunulur. Stratejik plan, varsa üniversiteler, meslek odaları ve konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plan ve performans planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve il genel meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Ortaklıklar:



3 – BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

İl Özel İdaresi bilgiye ulaşma ve veri işleme sistemlerinin çağdaş normlara ulaştırılması amacıyla, İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından genel faaliyetler yürütülmekle birlikte, her birim kendi sistemine daha etkin hale getirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda İl özel İdaresinin bilgi ve teknolojik yapısını şu şekilde özetlenebilir:

- **Evrak Kayıt:**

Kurumumuz tarafından, e-devlet projesi uygulamaya konulmuş ve bu doğrultuda yapılanmaya gidilmiştir. Bu kapsamda Sayın Valilimizin önemle üzerinde durduğu ve bizzat katıldığı eğitim seminerleri düzenlenmiş ve gerekli eğitim ve altyapı çalışmaları sonrasında, 2008 yılının Nisan ayı itibariyle e-devlet uygulamasına fiilen başlanılmıştır. 2008 – 2010 yılları arasında, Kurum personelinin e-devlet uygulamalarına tam olarak adaptasyonunu sağlamıştır. 2010 yılı sonu itibariyle e-imza uygulamasına geçilmiştir. e-imza uygulamasına, Türkiye’deki tüm kurumların geçişi ile birlikte, evrakların iletimindeki etkinlik artacaktır.

- **Bilgi işlem:**

Bilgi işlem büromuzda idaremizin resmi web sayfasının mizanpaj, dizayn ve güncelleme hizmetleri yapılmaktadır. Hizmet sorunsuz olarak yürütülmektedir. Bununla birlikte, müşteri memnuniyeti ve saydamlık prensipleri ışığı altında, hizmetlerimizin daha iyi takip edilebilir hale getirilebilmesi amaçlarımız arasındadır. Bu bağlamda e-devlet uygulamaları ile web hizmetleri arasında bağlantının kurulabilmesi gerekmektedir.

- **Arşiv Hizmetleri:**

Arşiv hizmetleri, verilerin değerlendirilmesi ve kurumun yatırımlarına yön vermesi açısından, çok önemli faaliyetler arasındadır. Bütün arşiv hizmetlerinin günümüz teknolojisine uygun olarak elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. Bu konuda idarenin tüm birimlerine gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu konuda bazı çalışmalar yapılmakla birlikte henüz istenilen seviyeye gelmemiştir.

- **Teknolojik altyapı:**

Teknolojik altyapı açısından güçlü olunması, kurum etkinliğinin de üst düzeyde olmasını sağlayan en önemli araçlardandır. Teknolojik altyapı denildiğinde, elektronik ortam ve bu ortamda kullanılacak cihaz ve programlar akla gelmektedir. Kurum olarak son yıllarda, teknolojik altyapının güçlendirilmesi için önemli imkânlar sağlanmıştır.

Bu bağlamda kurum bilgisayar kapasitesi personelin kullanımına müsait hale getirilmiştir. Kurum teknik ve idari personelinin, internete ulaşmaları sağlanmıştır. Bununla birlikte, bilgisayarın etkin kullanımı cihaz ve programlar ile desteklenmelidir. Özellikle coğrafi bilgi sistemleri üzerine temin edilecek cihaz ve programlar, kurum için hayati önem taşımaktadır. Kurum etkinliğini artırmak ve kurumsal hizmetlerde maksimum tasarrufu sağlamak, bu konuya yapılacak yatırımlar ile mümkün olabilecektir. Bu konuda çeşitli bilgisayar programı ve cihaz alımları son yıllarda gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili dünyada meydana gelen tüm gelişmeler takip edilmelidir.

4 - İNSAN KAYNAKLARI

Tokat İl Özel İdaresinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi 108 adet memur, 3 adet Şahsa Bağlı Kadrolu memur, 4857 Sayılı İş Kanununa tabi 245 adet daimi işçi statülü personel istihdam edilmektedir. Kurumumuza norm kadro ile tahsis edilen 231 memur kadrosunun, 170'i İl Genel Meclisince ihdas edilmiştir. 170 adet memur kadrosundan 108 adedi dolu olup, 62 adet boş memur kadrosu bulunmaktadır. Bununla birlikte norm kadro ile tahsis edilen 116 adet daimi işçi personele karşılık 245 adet daimi işçi bulunmakta olup, 129 adet daimi işçi fazlası bulunmaktadır. 2 adet geçici işçi kadrosu bulunmakta 5620 sayılı kanun gereği 5 ay 29 gün istihdam edilmektedir.

Tokat İl Özel İdaresi mevcut personel durumuna ilişkin bilgiler aşağıda çizelgeler halinde sunulmuştur.



Personel Statü ve Görev Yeri Tanımı:

Çizelge 3. Personel statü cetveli (dolu – boş).

PERSONEL		NORM KADRO	DOLU	BOŞ
MEMUR	Genel İdari Hizmetler	94	49	45
	Teknik Hizmetler	63	55	8
	Yardımcı Hizmetler	11	4	7
	Diğer Hizmetler	2	0	2
	TOPLAM	170	108	62
	Şahsa Bağlı Kadro		3	
İŞÇİ	Daimi	116	245	-129
	Geçici	2		2

Çizelge 4. Personel görev yerleri durumu.


PERSONEL	G.İ.H.	MEMUR T.H.	Y.H.	Ş.B.K.	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
Merkez	24	55	1	3	8	238	329
Almus	1					1	2
Artova	1					1	2
Başçiftlik	1						1
Erbaa	2	1				1	4
Niksar	1		1			1	3
Pazar	1					1	2
Reşadiye	2		1			1	4
Sulusaray	3						3
Turhal	2		1				3
Yeşilyurt	1						1
Zile	1					1	2
TOPLAM	40	56	4	3	8	245	356



Personel Eğitim Durumu:


Çizelge 5. Memur personel eğitim durumu.

Eğitim Durumu	Sayısı (Adet)
Lisans	55
Ön Lisans	25
Lise	19
Ortaokul	3
İlkokul	1
TOPLAM	103




Çizelge 6. Sözleşmeli personel eğitim durumu.

Eğitim Durumu	Sayısı (Adet)
Lisans	6
Ön Lisans	2
Lise	
Ortaokul	
İlkokul	
TOPLAM	8



Çizelge 7. İşçi personel eğitim durumu.


Eğitim Durumu	Sayısı (Adet)
Lisans	10
Ön Lisans	16
Lise	80
Ortaokul	32
İlkokul	107
TOPLAM	245



Çizelge 8. Toplam personel eğitim durumu.

Eğitim Durumu	Sayısı (Adet)
Lisans	71
Ön Lisans	43
Lise	99
Ortaokul	35
İlkokul	108
TOPLAM	356


Toplam Personel Eğitim Durumu (%)



Çizelge 9. Memur personel yaş durumu.

Eğitim Durumu	Sayısı (Adet)
20-29	3
30-39	26
40-49	56
50+	18
TOPLAM	103


Memur Personel Yaş Dağılımı (%)



Çizelge 10. Sözleşmeli personel yaş durumu.


Eğitim Durumu	Sayısı (Adet)
20-29	3
30-39	5
40-49	
50+	
TOPLAM	8

Sözleşmeli Personel Yaş Dağılımı (%)




Çizelge 11. İşçi personel yaş durumu.

Eğitim Durumu	Sayısı (Adet)
20-29	3
30-39	35
40-49	122
50+	85
TOPLAM	245



Çizelge 12. Toplam personel yaş durumu.

Eğitim Durumu	Sayısı (Adet)
20-29	9
30-39	66
40-49	178
50+	103
TOPLAM	356



5. SUNULAN HİZMETLER


Tokat İl Özel İdaresi, 5302 sayılı kanun ile verilen görevleri gereği; İl sınırları içerisinde yaşayan yöre halkına; Eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, gençlik ve spor, acil yardım ve kurtarma alanlarında hizmet vermektedir. Bu hizmet alanlarında; İlin çevre düzeni ve planı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, küçük işletmelere yönelik mikro krediler verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binaların yapım, bakım onarımı ile diğer ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içerisinde; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi yapımı ile ilişkin hizmetleri ise belediye sınırları dışında yapmaktadır.

Tokat İl Özel İdaresi, kanunla belirlenmiş görevlerine katkı sağlayacak, her türlü projeye destek sağlamakta ve sahiplenmektedir. Bu kapsamda, son zamanlarda kırsala hizmet sağlayan KÖYDES adı altında yer alan projenin içerisinde yer almıştır. Bu kapsamda önemli hizmetleri gerçekleştirmiştir. Bunun dışında, dış kaynaklı projelerinin (AB, Dünya Bankası vb.) hayata geçirilmesi amacıyla; eş finansman sağlanmasında, proje hazırlığında ve proje sahibi olarak katkı sağlamaktadır. Bu zamana kadar bu kapsamda birçok projenin gerçekleştirilmesini sağlamıştır.

6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Tokat İl Özel İdaresi, 5302 sayılı kanunun 36.maddesine norm kadro ilke ve esaslarına göre yeniden oluşturulmuş ve 2007 yılı Ağustos ayı itibariyle yönetim birimleri belirlenmiştir. Bu birimler ve görevleri aşağıdaki listede verilmiştir. Ayrıca Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcısı ve birim müdürlüklerinin yöneticilerine ait özgeçmişler, rapor ekinde sunulmuştur.

İl Özel İdarelerinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre iç ve dış denetim yapılır. Alınan kararların temel ilke, politika, öncelikler ve belirlenen stratejik hedeflere uygunluğu; yetkili makamlarca ve İl Genel Meclisi tarafından oluşturulan Denetim Komisyonunca iç denetimlere, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığınca da dış denetimlere tabi tutulmaktadır. İl genel Meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında, İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından; gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin İl genel Meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, Vali tarafından İl Özel İdaresi binası içerisinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi Valinin onayıyla, kamu kuruluşları personelinin de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenilen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur. Komisyon, çalışmalarını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, izleyen ayın 15'ine kadar Meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak, Meclis Başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.



**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2012 YILI
FAALİYET RAPORU**

**II - AMAÇ
VE
HEDEFLER**

A – İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

İdarenin 2011-2015 Stratejik Planına göre belirlediği amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir.

İSKÂN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	TÜM KIRSAL YERLEŞİM BİRİMLERİNE; SAĞLIKLI VE YETERLİ İÇME SUYU SAĞLANACAKTIR.	1.1 Mevcut İçme suyu tesislerinde, zamanla tıkanmalar, boru kırılmaları ve nüfus artışı sebebiyle; tesislerin iyileştirme, ilave ve bakım onarımlarının yapılması gerektiğinden dolayı, yeterli ve devamlı içme suyu sağlamak için 2011–2015 Yılları içerisinde toplam 375 Köyde İçme suyu tesisi bakım onarım ve ilave çalışması yapılacaktır. Köylerde içme suyu sayacı kullanım oranı artırılması yönünde, teşvik ve yönlendirmeler yapılarak; 2011-2015 yılları içerisinde, toplam 250 köyde su sayacı kullanımı sağlanarak, köylerin % 67'sinde su sayacı kullanımına geçilmesi sağlanacaktır. 1.2 Yapılmış olan İçme suyu tesislerinde yer alan içme suyu depolarında, dış ve mevsimsel etkenler sebebiyle oluşan çatlak ve dökülmeler, içme suyu depolarında kaçak ve sızıntılara sebep olmaktadır. İçme suyu depolarından yeterli ve düzenli içme suyu sağlayabilmek amacıyla, 2011–2015 yılları içerisinde toplam 500 adet içme suyu deposunda bakım onarım çalışması yapılacaktır. 1.3 Tüm kırsal yerleşim birimlerine sağlıklı bir içme suyu sağlayabilmek amacıyla, 2011–2015 yılları içerisinde, toplam 350 depoda klorlama ünitesi kurularak, mevcut su depolarının % 35'ine klorlama makinesi tesis edilecektir.
2	GÖREV ALANI İÇERİSİNDEKİ TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİNE, ÇALIŞIR DURUMDA KANALİZASYON HİZMETİNİ SUNMAK.	2.1. Kanalizasyon tesisi bulunmayan yerleşim birimlerine, daha temiz ve sağlıklı çevre şartları sağlamak amacıyla; 2011–2015 yılları içerisinde toplam 50 köyde kanalizasyon tesisi yapılarak, Tokat İli Köylerinin %93'ünün kanalizasyonu tamamlanacaktır. 2.2 Mevcut kanalizasyon tesislerinde, zamanla tıkanmalar ve nüfus artışı sebebiyle fosseptik yapımı, iyileştirme, ilave ve bakım onarımlarının yapılması gerektiğinden dolayı; 2011–2015 yılları içerisinde toplam 300 köyde kanalizasyon tesisi bakım-onarım ve ilave çalışması yapılacaktır.

3	ULAŞIMIN HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLANABİLMESİ İÇİN BÜTÜN KIRSAL YERLEŞİM BİRİMİ YOLLARI ÇAĞDAŞ STANDARTLARA KAVUŞTURULACAKTIR.	3.1 2011–2015 dönemi içerisinde, toplam 375 km grup yolunun standardı yükseltilecektir. 3.2. Grup yollarından başlamak üzere tüm köy ve mahalle yollarının trafik ikaz ve işaret levhaları tamamlanacaktır. 3.3 Asfalt kaplamalı köy yollarının, grup yollarından başlamak üzere tümünün II. kat asfalt kaplaması yapılacaktır. 3.4 Stabilize kaplamalı veya asfalt niteliğini kaybetmiş köy yollarının, I. kat asfalt kaplaması yapılacaktır. 3.5 Asfalt kaplamalı köy yollarının, asfalt bakımları (Yama) yapılacaktır. 3.6 Grup yollarının sıcak asfalt kaplama yapılabilmesi için, “Sıcak Asfalt Plenti”nin kurulması gerçekleştirilecektir.
4	HALKIMIZA GELİŞMİŞ ÜLKE STANDARTLARINDA BAYINDIRLIK VE İMAR HİZMETLERİ SAĞLANACAKTIR.	4.1 İdare bünyesinde inşa edilen “Parke Yapım Tesisinde” üretilen Kilitli Beton Parke kullanılarak; 2011–2015 yılları içerisinde toplam 250 köyde, Kilitli Beton Parke çalışması yapılacaktır. Böylece köylerimizin daha temiz, daha güzel ve daha yaşanılır olmasına katkı sağlanacaktır. 4.2 Kırsal yerleşim alanlarında, olabilecek yangınlara daha kısa sürede müdahale edilebilmesi amacıyla; 2011–2015 yılları içerisinde toplam 150 köye, traktörle çekilir kendinden motorlu yangın söndürme makinesi sağlanacaktır. 4.3 İl bayındırlık ve imar hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır. 4.4 Köy içi imar ve bayındırlık hizmetlerinin daha iyi standartlara kavuşturulmasına katkı sağlanacaktır.

EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	EĞİTİM KURUMLARINDA, GELİŞMİŞ ÜLKELER DÜZEYİNDE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENİ OLUŞTURMAK.	1.1 Okul öncesinde tüm öğrencilerin okullaşabilmesi için, il genelinde 5 yıl içerisinde toplam 15 adet anaokulu yapılacaktır. 1.2 İlköğretim tüm okullarında sınıf bazında azami 30 öğrenci standardını yakalamak. 1.3 Ortaöğretimde tüm okullarda sınıf bazında azami 30 öğrenci standardını devam ettirmek. 1.4 Kırsal kesimdeki öğrencilerin eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri amacıyla, 2011–2015 yılları içerisinde 6 adet yeni yurt faaliyete geçirilecektir. 1.5 Okullarımız engelli öğrencilerin eğitimlerini rahatlıkla devam ettireceği ortamlara dönüştürülebilmesi amacıyla; 2011–2015 yılları içerisinde, il genelindeki okulların % 20’inde gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 1.6 Okul ve kurumlarımızın ders ve laboratuvar araç-gereçleri, akıllı tahta ve diğer donanım malzemesi ihtiyaçlarını, öğretim programlarına ve teknolojik gelişmelere uygun olarak karşılanmasına yönelik olarak; 2011-2015 yılları içerisinde, il genelindeki sınıfların % 60’ının teknolojik düzeyi artırılacaktır. 1.7 İlk ve ortaöğretim kurumlarının bakım-onarım ihtiyaçları her yıl belirlenen duruma göre yapılacaktır. 1.8 Kırsal alanda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılabilmesi amacıyla; kapalı olan köy okul binalarının, köy konağı, okuma odası, sosyal tesis olarak düzenlenmesi, okul bahçelerinin ise gençlerin spor yapabileceği alanlara dönüştürülmesi sağlanacaktır. Bu amaçla 2011-2015 yılları içerisinde toplam 50 adet tesiste gerekli düzenleme çalışmaları yapılacaktır.
2	EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİLERİN SPOR YAPABİLECEĞİ OKUL SPOR TESİSLERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER SEVİYESİNE ÇIKARTILACAKTIR.	2.1 Eğitim kurumlarına ve öğrenci yurtlarına yakın bölgelerde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak amacıyla; 2011–2015 yılları içerisinde toplam 10 adet spor salonu hizmete açılacaktır.

3	TÜM TOKAT HALKINA HİZMET SUNABİLECEK SPOR TESİSLERİNİ İNŞAA ETMEK VE İŞLERLİĞİNİ SAĞLAMAK.	3.1 2011-2015 yılları içerisinde, İlimize 12 adet yeni spor tesisi yapılması sağlanacak; İlimizdeki lisanslı sporcu sayısı 20000'e, tescilli spor kulübü sayısı 75'e, milli sporcu sayısı ise 35'e çıkartılacaktır.
4	GENÇLERİMİZİ SPORTİF EĞİTİM VE FAALİYETLERE YÖNLENDİREREK, DAHA SAĞLIKLI VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK BİR NESİL YETİŞTİRİLMESİNE KATKIDA BULUNMAK.	4.1 Tokat Merkez ve İlçelerimiz Gençlik Merkezlerine katkı sağlanarak İlimiz gençliğinin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımının artırılması sağlanacaktır.

TARIMSAL HİZMETLER

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	TARIMSAL ÜRETİM VE HAYVANCILIK GELİRİNİ ARTIRMAK.	1.1 Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 1.2 Örtü altı tarımının geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. 1.3 Yem bitkileri yetiştiriciliğinde (Macar fiği, yonca, korunga, silajlık mısır), sertifikalı tohumluk kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacaktır. 1.4 Tokat ilinde tüplü fidan üretimini gerçekleştirilerek, yeni bir üretim modeli olarak yeni bağ tesislerinde tüplü fidanlar kullanılacaktır. 1.5 Tokat İlinde sebze tarımının geliştirilmesi kapsamında, bazı sebzelerde araştırma ve survey çalışmaları yürütülecektir. 1.6 Tokat ilinde Bafra koyun ırkının yaygınlaştırılması amacıyla araştırma yürütülecektir. 1.7 2011-2015 yılları arasında Tokat ili merkez ve ilçelerinde, en az 20 gıda işletmesine, hijyen ve işletme sanitasyonu hakkında eğitim verilecektir. 1.8 2011-2015 yılları arasında, tarımsal ve hayvansal üretimi geliştirmeye yönelik olarak, yetiştirici ve üreticilere ait 250 adet projenin hayata geçirilmesine katkı sağlanacak.
2	İNSAN, HAYVAN VE BİTKİ SAĞLIĞINI KORUMAK.	2.1 Boş ilaç kutu ve ambalajlarının toplatılma projesi kapsamında; yılda 30 adet yayım projesi uygulanacaktır. 2.2 Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında, yılda 30 adet yayım projesi yapılacaktır. 2.3 Yabani domuzlarla mücadele programı kapsamında, yılda 40 köyde faaliyet yürütülerek, domuz zararını % 80 oranında azaltmak.
3	TARIMSAL ÜRETİMDE TOPRAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRICI VE MİNİMUM GİRDİ (GÜBRE, SU, İLAÇ VB) KULLANIMINI SAĞLAYICI YÖNTEMLERİ	3.1 Tokat yöresi arazilerinin detaylı etüt ve haritalanması yapılacaktır. 3.2. Aşırı ve yetersiz gübre uygulamalarının önlenmesi sonucunda, topraktaki mevcut besin elementleri

	ARTIRMAK.	arasındaki dengenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, toprak analizlerine dayalı olarak gübre kullanımının artırılmasına yönelik olarak; 2011-2015 dönemi içerisinde toplam 32500 adet toprak numunesinin analizini gerçekleştirilecektir. 3.3 Tokat İli sulanır tarım alanlarında damla sulama sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla, 2011-2015 dönemi içerisinde, toplam 27 adet köyde, 1350 adet çiftçiye, damla sulama eğitimi verilecektir.
4	TÜM TARIM ALANLARINA YETERLİ OLABİLECEK SU KAPASİTESİ OLUŞTURULARAK; ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ SU KULLANIMI PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE, TÜM TARIM ALANLARINA SULAMA TESİSİ İNŞA EDİLECEKTİR.	4.1 Sulama suyu kapasitesinin artırılması amacıyla her yıl 2 adet sulama göleti yapımı gerçekleştirilecektir. 4.2 Sulama suyu ihtiyacı, yüzey suyu ile karşılanamayan yörelerde, yapılacak yer altı suyu sulama kuyuları ile yılda 150 m³/h ekstra sulama suyu kapasitesi elde edilecektir. 4.3 2011-2015 yılları arasında, toplam 5500 ha alana hitap edebilecek sulama tesisi inşa edilecektir.
5	ARAZİ TOPLULAŞTIRMA YATIRIMLARINDA, DEVAM ETMEKTE OLAN PROJELER KURUMUMUZ TARAFINDAN 2010 YILI SONUNA KADAR, BÜTÇESİ TARIM BAKANLIĞINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE TAMAMLANACAK OLUP; BUNDAN SONRA YAPILACAK ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI TARIM BAKANLIĞI İLE KOORDİNELİ OLARAK, TARIM BAKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.	5.1 Niksar ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin, % 20 sinin toplulaştırması tamamlanacaktır. 5.2 Erbaa ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin, % 100'ünün toplulaştırması tamamlanacaktır. 5.3 Zile ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin, % 26' sının toplulaştırması tamamlanacaktır

SANAYİ VE TİCARET HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	TOKAT İLİNİ, EKONOMİK KAYNAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİREBİLEN, DIŞ DÜNYA İLE ENTEGRE OLMUŞ BİR SANAYİ VE TİCARET YAPISINA KAVUŞTURMAK	1.1 İl sanayi ve ticari faaliyetlerine yönelik olarak; çeşitli bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine destek sağlanacaktır. 1.2 . İl sanayi ve ticari faaliyetlerine yönelik olarak; çeşitli fuar, etkinlik ve organizasyonlara destek sağlanacaktır. 1.3 Tüketici bilinçlendirme faaliyetlerine destek sağlanacaktır. 1.4 Tokat İli ile özdeşleşen, coğrafi işaret ve yöresel ürünlerin tescilin yapılması sağlanacaktır.

RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	İLİMİZ YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARINDAN ELDE EDİLEN ÜRETİMİ, KAYNAKLARINI GELECEK NESİLLERE TAŞIMA VE ÇEVREYE DUYARLI BİR ANLAYIŞ İÇERİSİNDE ARTIRMAK.	1.1 Kum-çakıl ve taş ocaklarının tamamının yıl içerisinde denetimi yapılacaktır. Ruhsatlandırmalar; çevre, imar, tarihi ve kültürel değerler açısından gerekli şartların sağlanmasına yönelik projelendirmeler ve nakliye güzergahlarının korunmasına yönelik alınacak tedbirler doğrultusunda yapılacaktır.
2	KURUM GÖREV ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN HARİTA İMAR HİZMETLERİNİ, MODERN BİR HİZMET ANLAYIŞI İÇERİSİNDE ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK.	2.1 2015 yılı sonuna kadar köy yerleşik alan sınır tespiti yapılmayan köy kalmayacaktır. 2.2 Köy içi imar ve ruhsatlandırma faaliyetlerinin, daha düzenli ve etkin hale getirilebilmesi amacıyla; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili olarak, tüm köy muhtarlığının bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 2.3 Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, “Tokat İli Çevre Düzeni Planı” yeniden değerlendirilerek 2015 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.

SAĞLIK HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİNDE YAŞAYAN İNSANLARA İLK SAĞLIK MÜDAHELESİNİN YAPILABİLECEĞİ VE RAHATLIKLA ULAŞILABİLECEK, SAĞLIK TESİSLERİ İNŞAA EDİLECEK VE DÜZENLİ ÇALIŞMALARI SAĞLANACAKTIR.	1.1 Sağlık hizmetin etkin bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla, yılda 2 adet yeni sağlık tesisi yapımı ile 11 adet sağlık tesisinin bakım-onarımı yapılacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	TOKAT İLİNDEKİ TARİHİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK MEKÂNLARI KORUMAK, GELİŞTİRMEK VE TANITIMINI YAPARAK TURİZME KAZANDIRMAK.	1.1 2011 yılının sonuna kadar, somut olmayan kültürel mirasların envanteri çıkarılacak ve koruma amaçlı imar planı hazırlanacaktır. 1.2 Tokat genelinde 5 adet kazı çalışması yapılacaktır. 1.3 İl genelinde muhtelif tarihi yapıların; bakım, onarım, restorasyon ve rekonstrüksiyonu yapılacaktır. 1.4 Niksar Talazan Köprüsünün onarımı yapılacaktır. 1.5 2013 yılına kadar 112 adet sivil mimari örneği evlerin bulunduğu Bey hamam sokağı ve Sulusokak, sokak sağlıklaştırmaları ve cephe giydirmeleri yapılacaktır. 1.6 Şehrin turizm ve kültür hayatına katkısını artırmaya yönelik olarak; iyileştirme ve düzenleme çalışmalarını içeren muhtelif projeler hayata geçirilecektir. 1.7 2012 yılı sonuna kadar, İldeki kaplıcaların geliştirilerek sağlık turizmine katkısını artırmaya yönelik olarak 2 adet proje hayata geçirilecektir. 1.8 Kültür ve turizm varlıklarımızın daha bilinçli tanıtılması için sektördeki yönetici ve çalışanların geliştirilmesine yönelik turizm ile ilgili konularda il genelinde yılda en az 5 adet eğitim programı düzenlenecektir. 1.9 İldeki göl, gölet, dere, ırmak, nehir, baraj çevreleri ve turizme uygun yaylaların değerlendirilerek turizme kazandırılması amacıyla muhtelif projeler hayata geçirilecektir. 1.10 2013 yılı sonuna kadar, Şehir genelinde bir gezi parkuru oluşturulacak ve ziyaret edilmesi gereken tüm kültürel ve turistik yerlere asılması için tanıtım levhaları

		hazırlanacaktır. 1.11 Tokat İli'nin yöresel kültürünü yansıtan zanaat ve ürünlerin yaşatılmasına yönelik 4 adet proje hayata geçirilecektir. 1.12 2011 yılı içerisinde, Tarih, Kültür ve Doğa şehri Tokat'ı marka kimliğinin oluşturulması ve konumlandırılması çalışmaları yapılacaktır. 1.13 Tokat ilinin kültürel geçmişi üzerine geniş bir bilgi kaynağı oluşturmaya yönelik 11 adet yayın ve tanıtım materyali hazırlanacaktır. 1.14 Tokat İli'nin tanıtımına ve kültürel birikimlerin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak her yıl, etkinlik ve organizasyon düzenlenecek ve çeşitli organizasyonlara etkinlik ile katılım sağlanacaktır.
--	--	---

ÇEVRE KORUMA VE DİNLENME HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	İNSANLARA TEMİZ, YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK.	1.1 Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğal kaynakların korunması çevre ve insan sağlığı için; yapılmış olan kanalizasyon sistemine, 2011-2015 yılları içerisinde toplam 100 adet köyde doğal arıtma tesisi inşa edilerek, 2015 yılı sonuna kadar kanalizasyon tesislerinin % 28'ine doğal arıtma tesisi inşa edilecektir. 1.2 Kırsal yerleşim birimlerinde, sosyal yaşamın geliştirilmesine yönelik olarak, çocuk oyun alanları inşa edilecektir. 1.3 Kırsal yerleşim birimlerinde, daha temiz bir çevre oluşturulması amacıyla; çöp konteynırları alınacaktır.

SOSYAL HİZMETLER

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	SOSYAL HİZMETLERDE AB STANDARTLARINDA BİR HİZMET ANLAYIŞI İÇERİSİNDE, SOSYAL YARDIMA İHTİYAÇ HİSSEDEN HERKESİN YANINDA YER ALINACAKTIR. TOPLUMUN HER KESİMİNİN ÜRETİME KATILIMI SAĞLANACAKTIR.	1.1 . Sosyal Hizmetler hizmet binalarının bakım-onarımı ile Kuruluşun ihtiyaçlarının teminine katkı sağlanacaktır.

GÜVENLİK VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ

S.No	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1	GÜVENLİK VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ; ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ, MODERN BİR YAPIYA KAVUŞTURULACAKTIR.	1.1 Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları ve lojmanlarının 2015 yılı sonuna kadar bakım onarım işlerinin yapılması sağlanacaktır. 1.2 Sivil Savunma hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.

B – TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Kurumsal Alanda:

Vizyonumuz, idari ve teknik açıdan modern ve etkin bir kurumsal yapıyı oluşturmaktır. Bunu başarmak için izlenecek temel politika, ulaşılmak istenen resmi belirlemek ve bu resmin oluşturulması için gerekli adımları atmaktan geçmektedir. Bunu yapabilmenin yolu, Kurum olarak uluslararası standartları yakalamaktır. Uluslararası standartları izlemek, Kurumu, istenilen kaliteye, kaynak israfına yol açmadan ulaştıracaktır. Bu konudaki önceliklerimiz;

- 5302 Sayılı Kanun ile oluşturulan yeni yapılanmanın üst çerçevesi belirlenmiş olmakla birlikte, yeni yapılanmanın işlevlerini yerine getirici ve hizmet etkinliğini artırıcı kurum içi çalışmalar ve düzenlemeler gerektiği anlarda yapılacaktır.
- Kurum personelinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla; çalışma ortamını geliştirici düzenlemeler yaparak, personel ihtiyacı olan teknolojik ekipman ihtiyacı karşılanacaktır.
- Kurum tarafından sahip olunması gerekliliği olmayan ve genel olarak Kuruma maddi külfet getiren gayrimenkuller, özelleştirilerek, Kurumun esas görevlerine odaklanmasına katkı sağlanacaktır.
- Kurum istatistik, yatırımların izlenmesi ve arşivleme sisteminin etkin hale getirilerek, bilgiye ulaşımının kolaylaştırılması ve yatırım kararlarının etkinliğinin artırılması sağlanacaktır.

Önceliklerimiz, 9.Kalkınma Planının (2007-2013) Gelişme Eksenleri Başlığı altında şu eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar:

Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması

- Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve işlevleri gözden geçirilerek bu alandaki mükerrerlikler giderilecek, kurum ve kuruluşların politika oluşturma, maliyetlendirme ve uygulama kapasiteleri artırılacak, insan kaynakları geliştirilecek, kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanılacak, adalet ve güvenlik hizmetlerinin etkili bir biçimde sunulması sağlanacaktır.

Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

- Kamu personelinin bilgi ve iletişim teknolojileri farkındalığı ve yetkinliği geliştirilecektir.

Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması

- Başta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecektir.

e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi

- Kamu hizmetleri; iş süreçleri, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlanarak ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanılarak, etkin, şeffaf, sürekli, güvenilir, tek kapıdan ve farklı platformlardan bütünleşik şekilde sunulacaktır.

Yatırım Hizmetleri Alanında:

Vizyonumuz, görev alanımız içindeki insanlarımızın sosyal ve ekonomik hayatlarını gelişmiş ülkeler standartlarına ulaştırmaktır. Bunu yapabilmek için ise, kurumsal olarak; imar hizmetlerinde, tarım, eğitim, sağlık ve spor altyapı, çevre alanlarında birçok yatırım gerçekleştirmektedir. Yapılan bu yatırım hizmetlerinde temel politikamız; insanlarımızın temel ihtiyaçları olan eğitim, sağlık, imar alanlarındaki ihtiyaçlarını birinci derecede karşılamak ve geliştirmektir. Bununla birlikte toplumun ekonomik düzeyini yükseltme amacıyla görev alanımız içerisinde yer alan tarımsal altyapıyı geliştirmek ve tarımsal üretimi artırıcı hizmetlerde bulunmaktadır. Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesindeki temel politikamız, modern kamu yatırım stratejisini yakalamaktır. Modern kamu stratejisi yatırımların belirleme aşamasından, gerçekleştirme aşamasına kadar bilimsel ve kurumsal etkinliği gerektirmektedir. Kurum yatırımların gerçekleştirmesinde; yatırımların belirlenmesinde bilimsel ve sosyal metotların kullanıldığı etkin bir yapı oluşturulacak, işler özel sektör tarafından yapılarak kamunun ağırlığı bertaraf edilecek ve etkin bir kontrol sistemi oluşturacaktır. Şu halde Kurum, vizyonu doğrultusunda strateji belirleyen ve bu stratejiler için projeler ortaya koyan ve bu projelerin yapımı için kontrolörlük hizmeti veren bir yapıya kavuşturulacaktır. Bütün bu değerlendirmeler ışığında yatırım hizmetlerinde önümüzdeki dönem için önceliklerimiz;

- Çalışma alanımızda, temel hak olan hizmetlerden (eğitim, sağlık, yol, su, kanalizasyon vb) faydalanamayan insan bırakılmayacaktır.
- Eğitim, sağlık ve imar hizmetlerinde kaliteyi artırıcı, gelişmiş ülke standartlarına yaklaştıracı faaliyetlerde bulunulacaktır.
- Mevcut su kullanım kapasitesinin artırılması için gölet vb su depolama yatırımlarına önem verilecektir.
- Sulanabilir alanlarda öncelikle kapalı sulama tesisleri olmak üzere, yeni sulama tesisleri inşa edilecektir.
- Toplulaştırma çalışmalarında devam eden işler tamamlanacaktır.
- İlimiz ekonomisine en önemli katkıyı sağlayan, meyve ve sebze tarımını geliştirmeye yönelik, yayım ve AR-Ge faaliyetleri Kurumumuz tarafından desteklenecektir.
- Projelerin değerlendirilmesinde, modern sosyal ve ekonomik değerlendirme metotları ortaya konmasına ve tüm projelerde bu metotların kullanımına geçilmesi yönünde çalışmalar başlatılacaktır.

Yatırım Hizmetleri Alanında:

Önceliklerimiz, 9.Kalkınma Planının (2007-2013) Gelişme Eksenleri Başlığı altında şu eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar:

Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması

- Kırsal kesimde merkezi yerleşim birimleri öncelikli olmak üzere, temel altyapı ihtiyaçları karşılanacaktır. Ekonomik ve sosyal gelişmeye yönelik proje ve destekler ile eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunumunda bu merkezi birimlere öncelik verilecektir.

Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi

- Su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların, öncelikle havza temelinde bütüncül bir yaklaşımla ve değişen tüketim taleplerini karşılamakta esneklik sağlayan bir şekilde planlamasını mümkün kılacak, ilgili kurumlar arasında güçlü ve yapısal bir eşgüdüm sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş kapsamlı bir mekanizma çerçevesinde ve suyun tasarruflu kullanımı sayesinde su kaynaklarının etkin kullanımına önem ve öncelik verilecektir.
- Tarımsal üretimin rekabet gücüne doğrudan katkıda bulunacak şekilde; yüksek üretim değeri bulunan tarım ürünleri üretiminin artırılması amacıyla maliyet etkin bir biçimde sulama yatırımları ve tarım işletmelerinde gözlenen arazi parçalılığı sorununun hafifletilmesine yönelik olarak toplulaştırma yatırımları yaygınlaştırılacaktır.
- Tarım sektöründe, kamu kurumlarınca yapılan Ar-Ge çalışmalarının ilgili kurumların faaliyetlerini destekleyici olması sağlanacaktır.

Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi

- Kalabalık sınıf mevcutları düşürülecek, ikili eğitim uygulaması azaltılacaktır. Her kademedeki eğitim tesislerinin etkin kullanılabilmesi için standartlar ve ortak kullanım imkanları geliştirilecektir. Okulların bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı, eğitim yazılımları öncelikli olmak üzere güçlendirilecek, yenilenen müfredatın gerektirdiği ortamlar ve donanım sağlanacaktır.

Çevre Hizmetleri Alanında:

Vizyonumuz, insanlarımıza doğal kaynakların korunup, geliştirildiği bir ortamı oluşturmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu konudaki politikamız, yapılacak yatırımlarda çevre faktörünü en önemli unsur haline getirmektir. Çünkü çevre ile ilgili yapılacak bir hatanın, telafisi güç olmakta ve problem gelecek nesilleri de etkilemektedir. Kurumumuz bu bağlamda, yapacağı tüm projelerde küresel ısınma, erozyon, çevre sağlığı ve doğal hayatın korunması konularında aktif bir yaklaşım sergileyecektir. Bu konudaki önceliklerimiz:

- Yapılacak tarımsal altyapı hizmetlerinde, küresel ısınma ve susuzluk tehlikesine duyarlı olarak, mümkün olan her yerde maksimum su tasarrufunun sağlanacağı damla sulama sistemleri tesis edilecektir.
- Su tasarrufu sağlamak amacıyla, açık sulama sistemleri yerine, toprak altı borulu sistemler tercih edilecektir.
- Erozyon tehlikesi dikkate alınarak, yapılacak sulama yatırımlarında, arazilerin eğimi 1.derecede önem arz edecektir. Erozyona sebep olacak eğimlerde, alternatif tarım sistemlerine yönelik uygulamalar teşvik edilecek ve damla sulama sistemi tesisi edilecektir.
- Yapılacak kanalizasyon yatırımlarında mutlaka doğal arıtma sistemi inşa edilecektir.

Yapılacak imar ve yol yatırımlarında, doğal çevrenin korunması dikkate alınacak ve bu amaçla yapılacak projelendirmelerde, doğal çevre konusu mutlaka irdelenecektir.

Önceliklerimiz, 9.Kalkınma Planının (2007-2013) Gelişme Eksenleri Başlığı altında şu eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar:

Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi

- Su, atık su, katı atık gibi çevre korumaya yönelik altyapı tesislerinin yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde ülke şartlarına en uygun sistem ve teknolojiler tercih edilecektir.
- Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması sağlanacak ve atık suların arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması teşvik edilecektir.
- Mevcut su sağlama tesislerinde kayıp ve kaçaklar azaltılarak ülke su kaynaklarının etkin kullanılması sağlanacaktır.

Sosyal Hizmetler Alanında:

Politikamız; ekonomik düzeyi yeterli olmayan insanları üretici konumuna getirmeye katkıda bulunmak ve onların ekonomik faaliyetlerini desteklemektir. Ayrıca, sosyal hizmetlere yönelik olarak, gençlerimizi sportif faaliyetlerinde desteklemek ve onları zararlı alışkanlıklardan korumak temel politikamızı oluşturmaktadır. Bu politikadaki önceliklerimiz:

- Ekonomik durumu yeterli olmayan insanların, üretime katılmalarını sağlamak amacıyla çeşitli finansal sistemler (mikro kredi, yardım vb) ile destek sağlanacaktır.
- İlimizde amatör spor yapılacak altyapının geliştirilmesi için katkıda bulunulacaktır.
- Amatör sporcularımızın başarısının artırılması ve gençleri spora yönlendirmek amaçlı olarak, her türlü destek sağlanacaktır.

Önceliklerimiz, 9.Kalkınma Planının (2007-2013) Gelişme Eksenleri Başlığı altında şu eylem planları ile uyum sağlamıştır. Bunlar:

Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması

- Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetleri desteklenecektir.

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2012 YILI
FAALİYET RAPORU**


**III - FAALİYETLERE
İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER**

A – MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ (Ekonomik 4.Düzey Sınıflandırma)						
KOD				AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ	
01				VERGİ GELİRLERİ	250.001,00	
	6	9	51	Bina İnşaat Harcı İzni	1,00	
	6	9	60	Yapı Kullanma İzin Harcı	200.000,00	
	6	9	99	Diğer Harçlar	50.000,00	
03				TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.489.932,00	
	1	1	01	Şartname, Basılı Kağıt, Form Satış Gel.	739.896,00	
	6	1	01	Lojman Kira Gelirleri	500.000,00	
	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	50.000,00	
	9	9	99	Diğer, Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	200.000,00	
04				ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.000.031,00	
	2	2	51	Alt Yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan	2.000.000,00	
05				DİĞER GELİRLER	40.210.022,00	
	1	9	03	Mevduat Faizleri	2.500.000,00	
	2	1	03	Madenlerden Devlet Hakkı	500.000,00	
	2	2	51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	36.150.000,00	
	2	8	51	Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	15.000,00	
	2	9	99	Diğer Paylar	750.000,00	
	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	100.000,00	
	3	4	01	Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	20.000,00	
	9	1	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	50.000,00	
	9	1	03	İrat Kaydedilecek Teminat Maketupları	100.000,00	
	9	1	06	Kişilerden Alacaklar	25.000,00	
06				SERMAYE GELİRLERİ	50.013,00	
	2	2	01	Taşıt Satış Gelirleri	50.000,00	
08				ALACAKLARDAN TAHSİLAT	1,00	
TOPLAM					44.000.000,00	

2012 YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ (Ekonomik 4.Düzey Sınıflandırma) DAĞILIMI (%)




- VERGİ GELİRLERİ
- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
- DİĞER GELİRLER
- SERMAYE GELİRLERİ
- ALACAKLARDAN TAHSİLAT

2012 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ (I. Düzey Ekonomik Sınıflandırma)

KOD	AÇIKLAMA	2012 TAHMİN
01	Personel Giderleri	4.899.749,00
02	S.G.K. Devlet Prim Giderleri	817.205,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.675.770,00
04	Faiz Giderleri	2.100.000,00
05	Cari Transferler	4.422.998,00
06	Sermaye Giderleri	17.875.161,00
07	Sermaye Transferleri	749.114,00
08	Borç Verme	1,00
09	Yedek Ödenekler	460.002,00
TOPLAM		44.000.000,00


2012 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ (I. Düzey Ekonomik Sınıflandırma)

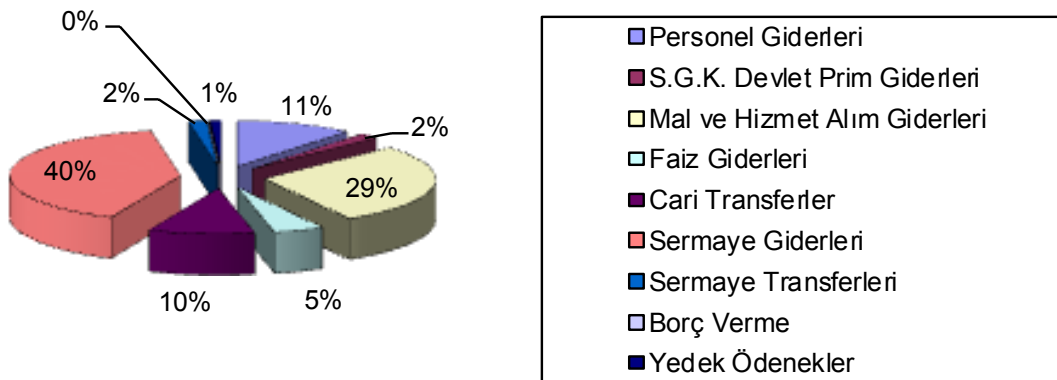

2012 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİRİ (Karşılaştırmalı) (1.Düzye)


KOD	AÇIKLAMA	2011 GERÇEKLEŞEN	2012 TAHMİNİ	2012 GERÇEKLEŞEN
01	Vergi Gelirleri	78.456,70	250.001,00	135.808,20
02	Sosyal Güvenlik Geliri		-	-
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.798.938,50	1.489.932,00	1.632.677,76
04	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gel.	85.860.976,67	2.000.031,00	66.753.427,79
05	Diğer Gelirler	36.493.529,16	40.210.022,00	42.223.184,71
06	Sermaye Gelirleri	31.000,00	50.013,00	11.680,00
08	Alacaklardan Tahsilat	-	1,00	-
09	Red ve İadeler	-	-	31.888,00
TOPLAM		124.262.901,03	44.000.000,00	110.724.890,46
ÖZGELİR TOPLAMI		38.401.924,36	44.000.000,00	43.971.462,67

2012 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİRİ (%)



- Vergi Gelirleri
- Sosyal Güvenlik Geliri
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gel.
- Diğer Gelirler
- Sermaye Gelirleri

2012 YILI KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE GELİRİ




- Tahmini
- Gerçekleşen


2012 YILI KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE GİDERİ

KOD	AÇIKLAMA	TAHMINİ	GERÇEKLEŞEN
01	Personel Giderleri	4.899.749,00	7.174.259,63
02	S.G.K. Devlet Prim Gideri	817.205,00	1.048.924,12
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	12.675.770,00	12.871.543,78
04	Faiz Giderleri	2.100.000,00	1.186.425,20
05	Cari Transferler	4.422.998,00	3.155.701,87
06	Sermaye Giderleri	17.875.161,00	19.478.605,69
07	Sermaye Transferleri	749.114,00	749.113,00
08	Borç Verme	1,00	-
09	Yedek Ödenekler	460.002,00	-
	TOPLAM ÖDENEK	44.000.000,00	45.664.573,29

2012 YILI GERÇEKLEŞENİ BÜTÇE GİDERİ (%)

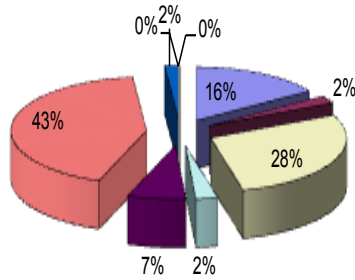

2012 YILI KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE GİDERİ

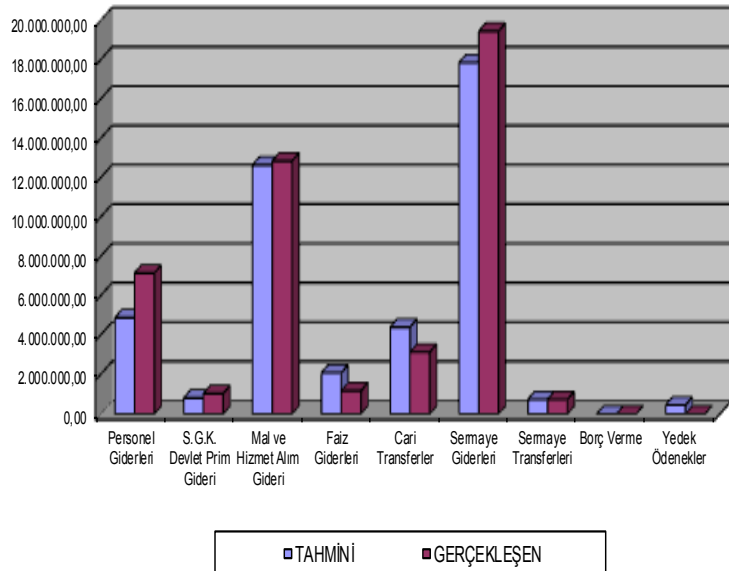

2011 YILI TOPLAM ÖDENEK İÇMALI						
KURUM	2011 Yılı Giderleri	2011 Yılı Devreden	2012 Yılı Bütçesi Tahmini	2012 Yılı Giderleri	2012 Yılı İptal	2012 Yılı Devreden
Yazı İşleri Md.	17.468,74		30.000,00	15.989,75	14.010,25	-
Kültür ve Sosyal İşler Md.	224.784,69		747.011,00	254.334,85	262.871,37	33.189,18
Mali Hizmetler Md.	21.734.386,07	36.439.154,76	13.791.156,00	35.296.230,87	357.777,19	39.810.176,59
İnsan Kaynakları Md.	23.185.849,13	14.989,25	4.995.750,00	23.970.617,39	8.773,61	-
Özel Kalem Md.	-	-	994.000,00	1.027.625,79	-	-
Tarımsal Hiz. Md.	7.212.210,51	2.899.909,07	2.920.001,00	6.864.277,93	502,93	3.000.000,00
Yapı Kontrol Md.	2.677.610,99	245.854,90	5.395.405,00	4.863.945,68	2.590,54	22.702,42
Destek Hiz.Md.	11.551.171,06	-	6.965.004,00	8.517.039,02	-	6.823,32
Yol Ulaşım Hiz.Md.	13.155.882,55	-	3.110.003,00	4.734.351,08	5.177,28	-
İşletme ve İştirak. Md.	2.061.129,65	90.000,00	2.600.351,00	1.658.441,63	2,00	90.000,00
Plan Prj.Yat.ve İş.Md.	9.277.575,27	341.814,77	930.001,00	1.331.424,34	958,13	428.933,30
Encümen Md.	882.446,98	-	6.002,00	3.935,98	2.066,02	-
Ruhsat ve Den.Md.	850,00	-	568.002,00	24.616,50	277,72	-
Hukuk İşleri	74.583,59	-	150.000,00	142.014,71	-	-
Almus İ.Ö.Md.	708.099,65	84.252,27	77.003,00	1.126.908,09	12.356,90	81.987,49
Artova İ.Ö.Md.	458.589,39	35.918,21	76.003,00	639.054,05	33.661,67	29.694,79
Başçiftlik İ.Ö.Md.	246.405,43	18.897,88	65.203,00	260.666,73	34.173,46	27.689,44
Erbaa İ.Ö.Md.	1.923.340,08	27.115,23	79.183,00	3.103.221,88	18.169,95	153.087,66
Niksar İ.Ö.Md.	1.838.944,43	88.618,52	75.703,00	2.801.795,64	24.406,16	91.799,70
Pazar İ.Ö.Md.	573.672,36	15.516,25	52.003,00	935.859,93	8.398,88	24.417,41
Reşadiye İ.Ö.Md.	1.588.777,21	73.166,79	72.603,00	1.941.091,29	25.927,11	100.997,05
Sulusaray İ.Ö.Md.	429.112,95	32.748,57	68.503,00	598.076,73	36.246,33	96.631,62
Turhal İ.Ö.Md.	1.462.016,25	66.158,42	91.504,00	2.597.848,49	21.013,68	93.867,41
Yeşilyurt İ.Ö.Md.	350.953,26	29.047,18	69.503,00	570.161,60	46.986,93	48.339,26
Zile İ.Ö.Md.	2.142.138,80	123.634,30	70.103,00	3.660.153,44	23.056,43	157.307,58
TOPLAM	103.777.999,04	40.626.796,37	44.000.000,00	106.939.683,39	939.404,54	44.297.644,22

2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

GİDER BÜTÇESİ

2012 Yılı tahmini bütçesi 44,000,000.00.-TL. olup, devlet Yardımları tahmin edilemediğinden 2012 Yılı tahmini bütçesinde finansman tipi 8 (sekiz) olan gider tahmin edilememiştir.

2012 Mali Yılı Sonu itibariyle;

01 Personel Giderleri	27.385.780,48 TL
02 S.G.K. Devlet Primi Giderleri	4.140.819,02 TL
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.203.385,59 TL
04 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.186.425,20 TL
05 Cari Transferler	3.155.701,87 TL
06 Sermaye Giderleri	39.223.871,04 TL
07 Sermaye Transferleri	749.113,00 TL
08 Borç Verme	-

olmak üzere toplam 106.939.683,39 TL gider gerçekleşmiştir. Bu giderin 45.664.573,29 TL' si Öz Gelirlerden, 61.275.110,10 TL' si ise Devlet Yardımlarından karşılanmış olup, toplam giderler içerisindeki oranı %42.70' ye tekabül etmektedir.

Personel Giderleri;

2012 Mali yılında Personel gideri olarak 27.385.780,48 TL gider gerçekleşmiştir. Bu giderin 7.174.259,63 TL Öz Gelirlerden, 20.211.520,85 TL' si ise Devlet Yardımlarından karşılanmış olup, toplam giderler içerisindeki oranı %25.61' ye tekabül etmektedir.

S.G.K. Devlet Primi Gideri;

2012 Mali Yılı S.G.K. Devlet Primi Giderleri 4.140.819,02 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu giderin 1.048.924,12 TL' si Öz Gelirlerden, 3.091.894,90 TL' si ise Devlet Yardımlarından karşılanmış olup, toplam giderler içerisindeki oranı %3.87 ' ye tekabül etmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri;

2012 Mali Yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 31.203.385,59 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu giderin 12.871.543,78 TL' si Öz Gelirlerden, 18.331.841,81 TL' si ise Devlet Yardımlarından karşılanmış olup toplam giderler içerisindeki oranı %29.18' a tekabül etmektedir.

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri aşağıda gösterilmiştir.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.070.206,64 TL
Yolluklar	480.756,24 TL
Görev Giderleri	202.355,24 TL
Hizmet Alımları	12.907.130,87 TL
Temsil ve Tanıtma Giderleri	206.528,33 TL
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gideri	2.122.600,07 TL
Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Gideri	4.213.808,20 TL
Tedavi ve Cenaze Gideri	-

Diğer İç Borç Faiz Giderleri;

2012 Mali Yılında, Halk Bankasından kullanılan krediye ait borçlanma gideri 1.186.425,20 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu giderin tamamı Öz Gelirlerden karşılanmıştır.

Cari Transferler;

2012 Mali Yılı Transferleri 3.155.701,87 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu giderin 3.155.701,87 TL' si Öz Gelirlerden karşılanmış olup, toplam giderler içerisindeki oranı % 2.95' e tekabül etmektedir. Cari Transferler aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

FONKSİYONEL KOD	FİNANS KODU	EKONOMİK	AÇIKLAMA	TUTAR
01.6	5	05.1.2.05	Sosyal Güvenlik Kurumuna	46.200,00
01.6	5	05.2.5.03	Köylere	1.059.950,00
01.6	5	05.2.5.04	Mahalli İdare Birliklerine	915.000,00
01.6	5	05.3.1.01	Dernek, Birlik, Kur., Kuruluş	259.924,25
01.6	5	05.3.1.05	Memurların Öğle Yemeğine Yrd.	120.750,00
02.2	5	05.3.1.05	Memurların Öğle Yemeğine Yrd.	40.000,00
01.6	5	05.3.1.90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	10.000,00
01.6	5	05.8.9.51	İller Bankasına Verilen paylar	703.877,62
TOPLAM				3.155.701,87

Sermaye Giderleri;

2012 Mali Yılı Sermaye Giderleri 39.223.871,04 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu giderin 19.478.605,69 TL' si Öz Gelirlerden, 19.745.265,35 TL' si Bakanlık Yardımlarından karşılanmış olup, toplam giderler içerisindeki oranı %36.68 'e tekabül etmektedir. Sermaye Giderleri aşağıda gösterilmiştir.

Mamul Mal Alımları	4.267.180,93 TL
Gayri Maddi Hak Alımları	27.417,40 TL
Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırması	11.160,00 TL
Menkul Malların Bakım ve Onarım Giderleri	-
Gayri Menkul Sermaye Üretim Gideri	28.261.626,68 TL
Gayri Menkul Büyük Onarım Gideri	6.464.486,03 TL
Stok Alımları (Savunma Dışında)	192.000,00 TL

Sermaye Transferleri;

2012 Mali Yılı Sermaye Transferleri 749.113,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu giderin tamamı Öz Gelirlerden Karşılanmış olup, toplam giderler içerisindeki oran % 0.70' e tekabül etmektedir. Sermaye Transferleri aşağıda gösterilmiştir.

Yurtiçi Sermaye Transferleri	749.113,00 TL
Yurtdışı Sermaye Transferleri	-

Borç Verme;

2012 Mali Yılı Bütçesinin Borç Verme Giderleri bölümüne Mikro Kredi için 1,00 TL ödenek konulması uygun görülmüştür. Ancak herhangi bir gider yapılmamıştır.

B – PERFORMANS BİLGİLERİ

1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Tokat İl Özel İdaresi faaliyetlerini, 2011–2015 Stratejik Planına göre hazırlanan 2012 Yılı Performans Programında;

- İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri
- Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri
- Tarımsal Hizmetler
- Sanayi ve Ticaret Hizmetleri
- Ruhsat ve Denetim Hizmetleri
- Sağlık Hizmetleri
- Kültür ve Turizm Hizmetleri
- Çevre Koruma ve Dinlenme Hizmetleri
- Sosyal Hizmetler
- Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri

ana başlıkları halinde belirlemiştir. Buna göre;

İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri:

İçme suyu tesislerinde iyileştirme, bakım onarım çalışmaları yapılması ve su sayacı kullanım oranının artırılması.

İlimizde içme suyu getirilmemiş köy bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı köylerimizde içme suyu yetersizliği bulunmaktadır. İçme suyu yetersizliği özellikle son yıllarda kuraklığın etkisi ile artış göstermiştir. Bununla birlikte, su kullanımında tasarruflu davranmama da önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Kurumumuz, su kullanımındaki tasarrufu da dikkate alarak, gerçekte su ihtiyacı bulunan yerlerin su ihtiyacını karşılama amaçlı olarak, sondaj yoluyla su elde etme yoluna gidecektir. Kurumun içme suyu teminindeki birinci derecede tercihi yüzey sularıdır. Bunun sağlanamadığı yerlerde, yer altı suyuna başvurulmaktadır.

Bir diğer faaliyet konusunu ise köylerdeki su şebekelerinin ve elektro motopomp tesislerinin bakım ve onarımı oluşturmaktadır. Her yıl önemli bir miktardaki köyün bu yöndeki ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu tip projelerin amacı, sulama şebekelerinin ve elektro motopomp tesislerinin genel bir bakımdan geçirilerek, düzgün çalışan ve su israfı yapmayan sulama şebekesine sahip olmaktır. Ayrıca iyi çalışmayan bir sistemde çok sayıda meydana gelebilecek ufak arızaların önüne geçerek iş, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktır.

Su tasarrufunun artırılması için önemli bir faaliyet alanı ise su sayacı kullanımının artırılmasıdır. Su sayacı kullanımı için herhangi bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, su tasarrufu amacıyla, kırsal yerleşim birimlerine tavsiyelerde bulunmaktadır. Yılda 50 adet köyün su sayacı kullanımına geçmesi beklenmektedir.

İçme suyu su depolarının bakım onarımının yapılması.

İçme suyu depolarının yenilenmesi su kalitesinin ve tasarrufunun artırılması açısından önem teşkil etmektedir. Tesislerin birçoğunun eski olması, su depolarının yenilenmesini önemli hale getirmektedir. Yılda 50 adet su deposunun yenilenmesi hedeflenmiştir.

İçme suyu kalitesinin artırılması amacıyla, içme suyu depolarına tam otomatik klorlama cihazının tesis edilmesi.

Köylerimizdeki içme suyu tesislerinde kullanılan sular, içme suyu analizi neticesinde kullanılabilir olarak tespit edildiği takdirde herhangi bir işleme tabi tutulmadan direk olarak sisteme verilmektedir. Kurum stratejisi, yerleşim birimlerine sağlıklı bir içme suyu sağlamayı hedef olarak göstermektedir. Bu hedef doğrultusunda, mevcut suların içim kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir içme suyu sağlamak amacıyla, kurumumuz tarafından klorlama cihazlarının içme suyu sistemlerine eklenmesine yönelik proje ortaya konmuştur. Klorlama cihazları tam otomatik olacak ve su depolarına monte edileceklerdir. Cihazların tam otomatik olarak tercih edilmelerinin

sebebi, cihazların kullanım kolaylığına sahip olmasıdır. Böylece etkin bir klorlama işlemi yürütülebilecektir.

✚ **Kanalizasyon tesisi bulunmayan yerleşim birimlerine yeni kanalizasyon tesisi yapılması.**

Kurum son yıllarda kanalizasyon yapımına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Kanalizasyonu toplum sağlığı ve şehirleşme açısından önemli bir unsur olarak değerlendirmektedir. Bu amaca yönelik olarak, stratejik plandaki hedefini 2015 yılı sonuna kadar, köylerin % 93'ünün kanalizasyonunu tamamlamak olarak belirlemiştir. Kurum uygulamayı gerçekleştirirken, yapım hizmeti satın almakta ve de köy halkından işgücü konusunda yardım almaktadır. Kurumun bundan sonraki uygulama stratejisi, yapım işleminde müteahhitlik hizmetlerinden faydalanma yönündedir.

✚ **Mevcut kanalizasyon tesislerinde iyileştirme ve bakım onarım çalışmaları yapılması.**

Kanalizasyon tesislerinde zamanla yıpranmalar ve yerleşim yerlerinin büyümesi ile kanalizasyon tesislerine eklemeler yapılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaçlar, her yıl belli bir program dâhilinde giderilmektedir. Bu program yılı içerisinde Kurum tarafından kanalizasyon tesislerinde iyileştirme ve bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır. Bu konudaki stratejik hedef, 2011-2015 yılları içerisinde toplam 300 köyde bakım onarım ve ilave çalışması yapmaktır. Kurum bunu gerçekleştirebilmek için, tesislerin yapımında daha kaliteli malzeme kullanımına yönelme amacındadır.

• **Yol yapım ve düzenleme çalışmaları.**

Kurum stratejimiz; bütün köy yollarımızı çağdaş standartlara getirebilmektir. Bu amaca ulaşılabilmesi için, son yıllarda KÖYDES programı ile birlikte önemli hizmetler gerçekleştirilmektedir. Yol yapım ve düzenleme çalışmaları 6 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar:

- ❖ Grup yolu standartı yükseltilmesi
- ❖ Asfalt Bakımı (yama) yapılması
- ❖ I.kat asfalt kaplama yapımı
- ❖ II.kat asfalt kaplama yapımı
- ❖ Sıcak Asfalt Plenti Kurulması
- ❖ Yol trafik işaret levhalarının yerleştirilmesi olarak yer almaktadır.

Yol yapım faaliyetleri, genel olarak KÖYDES programından en fazla katkının sağlandığı faaliyeti oluşturmaktadır. Kurum daha çok köy grup yollarının standardını artırma yönünde çalışma yapmayı planlamaktadır. Standardının yükseltilmesi ibaresi içerisinde her türlü yol yapım faaliyeti yer alabilmektedir. Yol yapım faaliyetleri genel olarak kurum iş makineleri ile karşılanmaktadır.

Kurumumuz yol yapım düzeyi açısından çok önemli ilerlemeler sağlamış olup, köylerin merkezlerinin şehirle olan bağlantı yollarını tamamlamıştır. Bu açıdan bakıldığında, yeni yol ihtiyacı kalmamıştır. Bununla birlikte, köy mahalleleri ve köyler arasında kısa yol bağlantıları talep edilmektedir. Yol ihtiyacının toplumlararası diyalogdaki önemi dikkate alınarak, bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla yeni yol yapımına gidilmektedir. Bununla birlikte yol çalışmalarında esas yatırımı, çağdaş yol standardına ulaşılması amacıyla asfaltlama oluşturmaktadır.

✚ **Yol güzergâhlarında emniyet sağlanması için trafik levhalarının yerleştirilmesi.**

Kırsal kesim yollarında, trafik levhaları çok az bulunmakta veya hiç bulunmamaktadır. Bu gelişmekte olan bir ülke için eksikliklerdir. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla köy yollarına trafik levhası konulması işlemine devam edilmekte olup, 2015 yılı sonuna kadar ihtiyacın genel olarak karşılanması hedeflenmektedir.

• **Köy içi imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, köy içi kilitli parke yapımı vb.) yapımı.**

Köylerimizin, yaşanabilir yerler haline getirilebilmesi, yapılacak köy içi imar hizmetleri ile mümkün olabilecektir. Bununla birlikte, bu tür yatırımların daha hızlı ve etkin olabilmesi, yerel kuruluşların devreye sokulması ile mümkündür. Bunun için küçük çaplı köy içi imar hizmetleri; ilçe özel idareleri, mahalli idare birlikleri ve muhtarlıklar vasıtasıyla yapılmaktadır.

2011 – 2015 Stratejik plan ile birlikte, köy içi parke yapılmasına yönelik bir irade ortaya çıkmıştır. Yılda 50 adet köyün, köy içi parkesinin tamamlanması hedeflenmektedir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için Kurum tarafından parke üretim tesisi de faaliyete geçirilmiştir.

Eğitim, Gençlik ve Spor:

✚ **İlk ve orta öğretimde derslik ihtiyacının karşılanması:**

Eğitimde okullaşma oranında önemli ilerlemeler sağlanmış ve ilk ve orta öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısında 30 hedefi yakalanmış ve hatta bu oranın altına inilmiştir. Bununla birlikte özellikle il ve ilçe merkezlerinde yoğunlaşmalar olmakta ve derslik ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu konudaki stratejik hedef şehir merkezlerinde olan bu yoğunlaşmayı da azaltarak tüm okullarda derslik başına düşen öğrenci sayısını 30'un altına düşürmektir. İlköğretim ve ortaöğretime yönelik olarak yapılacak ihtiyaçlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanmaktadır. Kurumumuz, bu plan ve programlar doğrultusunda uygulamayı gerçekleştirmektedir. Eğitimi, toplumun kalkınmasında en önemli unsur olarak gören Kurumumuz, bu konuda üzerine düşen görevi yapmakta ve önemli bir miktar kaynağı buraya ayırmaktadır. Dersliklerin yapımı hizmet alım yolu ile gerçekleştirilmektedir.

- **Okul öncesi eğitim ihtiyacına yönelik olarak derslik yapılması.**

Okul öncesi eğitimde hedef 2015 yılı sonuna kadar % 100 okullaşma oranının yakalanmasıdır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün programı doğrultusunda, Kurumumu tarafından gerekli katkı sağlanmaktadır. Dersliklerin yapımı hizmet alım yolu ile gerçekleştirilmektedir.

- **Okullara bakım onarım ve çevre düzenleme yapılması:**

Modern bir eğitim altyapısına kavuşmayı amaçlayan ilimizde, bu yöndeki çalışmalar hızla devam etmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün programı kapsamında çalışmalar devam etmekte, Kurumumuz da bu konuda gerekli katkıyı yapmaktadır.

- **Küçük tip kapalı spor salonu yapılması.**

İlk ve orta öğretimde kullanıma yönelik küçük tip kapalı spor salonu yapılması, İl Mili Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülecektir. Sporcu yetiştirmede erken yaşlarda yapılacak eğitimin önemi dikkate alındığında, yapılacak bu faaliyetin çok önemli bir işlevi olacağı görülmektedir. 2011-2015 Stratejik Planlama sürecinde yılda 2 adet olmak üzere toplamda 10 adet spor salonu yapımı planlanmıştır. Bu faaliyetin gerçekleşmesi Bakanlık Bütçesinden ayrılacak finansman ile mümkün olabilecektir.

- **Spor tesisi yapımı:**

Kurumumuz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda çeşitli spor tesisleri yapımına destek sağlamaktadır.

- **Spor tesislerin yıllık bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi:**

Spora ve amatör sporculara destek sağlama anlayışı içerisinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün belirlediği spor tesisleri bakım onarımı için gerekli destek her yıl sağlanmaktadır. Spor aktivitelerinin düzenli bir şekilde sürdürülmesi ve amatör sporcularımızın desteklenmesi amacıyla yapılan bu hizmet, Kurumumuz tarafından bu yılki program döneminde de devam ettirilmiştir.

- **Spor merkezlerin sportif malzeme ihtiyacının karşılanması.**

Amatör spora destek kapsamı içerisinde; amatör sporcuların spor malzemesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak gerekli destek kurumumuzca sağlanacaktır.

Tarımsal Hizmetler:

- **Tarımsal üretimi geliştirme amaçlı projelere destek sağlanması:**

Tokat ili tarımsal potansiyeli yüksek olan illerimizden birisidir. Özellikle meyve ve sebze üretiminde son yıllarda üretimini artırmış ve adını tüm Türkiye’de duyurmuştur. Bu yöndeki etkinliğinin artırılması ve daha çok ekonomik katkının Tokat tarımına sağlanması Kurum amaçları içerisinde yer almaktadır.

Bu amaç doğrultusunda;

- Meyve ve sebze üretim alanlarının ve verimliliğin artırılması,
- Organik tarımın geliştirilmesi,
- Örtü altı tarımın artırılması,
- Tarımsal birliklerin yapısının güçlendirilmesi ve üye sayısının artırılması

yönündeki uygulama ve AR-GE çalışmalarına destek sağlanacaktır. Bu konudaki faaliyetler İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

- **Hayvansal üretimi geliştirme amaçlı projelere destek sağlanması:**

2011-2015 Stratejik Plan ile önemli tarımsal hedeflerden birisi de hayvansal üretimin geliştirilmesine yönelik destek sağlanmasıdır.

Bu amaç doğrultusunda;

- Verimli hayvan ırklarının yaygınlaştırılması,
- Hayvan ahırlarının modernleştirilmesi,
- Hayvan sağlığının korunması,
- Hayvan kayıt ve tescil işlemleri,
- Hayvanlardan geçebilecek hastalıklara karşı mücadele,
- Yabani hayvan zararlarının azaltılması.

yönündeki uygulama ve AR-GE çalışmalarına destek sağlanacaktır. Bu konudaki faaliyetler İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

- **Tarımsal laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi:**

Laboratuvar hizmetlerine yönelik projeler şu amaçları içermektedir:

- ❖ Laboratuvar hizmetlerinde kullanılan kimyasal malzeme alımı,
- ❖ Gıda katkı-kalıntı ve pestisit analizleri yapımına yönelik cihaz alımı,

Tarımsal laboratuvar hizmetleri tarımın gelişmesinde önemli yer tutmaktadır. Tarımsal verimlilikte toprakların analizi önemlidir. Çiftçilere yapılan analizde, maliyetin tümü yansıtılmamakta, maliyet sübvansede edilmektedir.

Bir diğere önemli konu, gıda katkı – kalıntı analizleri ve pestisit analizlerinin yapılmasıdır. Tokat ili tarımda çok önemli bir safhadadır. Meyve ve sebzecilikte gün geçtikçe ilerlemektedir. Bu ilerleme ile birlikte tarımda ilaç kullanımı da artmaktadır. Bu gıda sağlığı açısından tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Bunu belirlemek ve tedbir almak, hem bizim tüketicilerimiz ve hem de ihracat için önemlidir. Üretimi bu açıdan kontrol altına alabildiğimiz takdirde hem sağlıklı ürünler yetiştirilecek, hem de ihracat artacaktır. Dolayısıyla tarımda gelişme hızla devam edecektir. Bu proje ile yukarıda bahsedilen analizleri yapabilecek cihaz alımı gerçekleştirilecektir. Böylece, sebze ve meyveler insan sağlığı açısından risk arz eden katkı kalıntı açısından kontrol edilebilecektir.

Kurumumuz yukarıda belirtilen laboratuvar hizmetlerine gerekli desteği sağlayacaktır. Laboratuvara yönelik yapılacak bu hizmetler, ilimiz tarımının gelişmesini ve tarımsal ürünlerin pazarlanma gücünün artmasını sağlayacaktır. Toprak analizine yönelik çalışma Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

- **Toprak ve su kaynakları veri tabanının hazırlanması:**

Tarımsal üretim ve yatırım kararlarında, etkinliğin sağlanması o yörenin tarım ve su kaynaklarına ilişkin altyapının bilinmesine bağlıdır. Geçmişte hazırlanan bu tür veriler bulunmakla birlikte (toprak haritaları vb) çok eski kaynaklar ve de günümüz teknolojisi ile uyumlu bulunmaktadır. Günümüzde bu tür verilerin coğrafi bilgi sistemi ile uyumlu bir şekilde elektronik ortama atılması gerekmektedir. Stratejik planda yer alan bu hedef ile çok zaman alacak bir uğraşının içerisine girilecektir. Bu konuda Kurumumuz gerekli desteği sağlayacak ve kurumlar arasında gerekli ilişkiyi düzenlemeye gayret edecektir. Konunun sorumlusu Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğüdür.

- **Küçük ölçekli sulama göleti yapımı:**

Son yıllarda meydana gelen kuraklıklar, göletlerin sulamadaki önemini ortaya çıkarmıştır. Göletler, kışın yüzey ve sızıntı sularının depolandığı ve yazın kullanıldığı su depolama tesisleridir. Kurum stratejisi, bu tesislerin mümkün olduğu kadar artırılması yönündedir. Buna yönelik olarak da her yıl gölet yapımına hızla devam etmektedir. Sulama göletlerinin, proje ve uygulamaları, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Yapım işlemi hizmet alımı olarak gerçekleştirilmektedir.

- **Sulama suyu tesisi yapımı:**

Sulama suyu temini amacıyla yapılan projeler ve uygulamaları, Kurumun iki müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir. Bunlar Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüdür. Uygulamalar dışarıdan hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilmekte olup

Kurum tarafından yapı denetim hizmetleri yürütülmektedir. Sulama suyu temini projeleri genel olarak iki kategori altında değerlendirilmiştir. Bunlar:

- ❖ Açık kanal sulama suyu tesisleri,
- ❖ Kapalı sistem sulama suyu tesisleri.

Bu zamana kadar ilimizdeki projelerin ana yapısını açık kanal sulama tesisleri oluşturmuştur. Bu durum son yıllarda değişmiştir. Kapalı sistem sulama suyu tesisleri ve sulama alanları daha fazla artış göstermiştir. Tarım Bakanlığı hibe programlarının da etkisiyle kapalı sistem sulama suyu tesisi yapımında büyük bir gelişme sağlanmıştır. Gerek yer altı suyu ve gerekse yer üstü su kaynaklarında kapalı sistem sulama tesislerinin yapımına ağırlık verilmiştir. Özellikle gölet sulama sahaları tamamen kapalı sistem sulama tesisi olarak inşa edilmektedir. Kapalı sistem sulama tesisleri sayesinde su verimliliğinde artmasına, su kullanımının kolaylaşmasına ve toprak erozyonunun azaltılmasına önemli katkı sağlanmaktadır. Kapalı sistem sulama tesislerinin projelendirilmesinde, su basıncı ve bitki münavebe yapısı dikkate alınarak damla ve yağmurlama sulama olarak yapılmaktadır.

- **Arazi toplulaştırma ve tarla İçi geliştirme hizmetleri yapımı:**

Toplulaştırma, tarımsal altyapı hizmetlerinin en önemli projesidir. Toplulaştırma çok parçalı ve düzensiz parsellerin bir araya getirilmesini kapsamaktadır. Toplulaştırma hizmetleri ile birlikte, tarla içi geliştirme hizmeti olarak isimlendirilen tesviye, drenaj, sulama gibi tarımsal altyapı hizmetleri de yerine getirilmektedir.

Tokat ili toplulaştırma hizmeti açısından, Türkiye’de en önde gelen illerden birisidir. Başarılı uygulamaları mevcuttur ve halen devam etmektedir. Fakat son yıllarda ödenek problemleri sebebiyle, sadece devam eden işlerin tamamlanmasına çalışılmaktadır. İlimizde toplulaştırmanın en yoğun yapıldığı yer Erbaa ilçesidir. % 95’e yakın tamamlanmıştır. Niksar ve Zile ovasında da toplulaştırma çalışmaları halen devam etmektedir. Kazova ve Çamlıbel ovalarında toplulaştırma henüz başlamamıştır. Bununla birlikte bu konuda hazırlanmış birçok proje beklemektedir.

Sanayi ve Ticaret Hizmetleri:

2011-2015 Yılı Stratejik Planı ile amaçlar içerine dahil olmuştur. Tokat ilinin sanayi ve ticaret hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Hedefler olarak;

- İl sanayi ve ticaret faaliyetleri hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine katkı sağlanması,
- Fuar ve organizasyonlara katkı sağlanması,
- Tüketici bilinçlendirme faaliyetlerine destek sağlanması,
- Tokat İli ile özdeşleşen, coğrafi işaret ve yöresel ürünlerin tescilin yapılmasına katkı sağlanması.

olarak belirlenmiştir. Hedeflerin gerçekleştirilmesi İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

Ruhsat ve Denetim Hizmetleri:

- **Kum-çakıl ve taş ocaklarının ruhsatlandırma ve denetimlerinin yapılması:**

Yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklarının, üretime yönelik olarak ruhsatlandırma ve denetim hizmetlerinden oluşmaktadır. Tokat ilinin çok zengin doğal kaynaklara sahip olması, bu yöndeki faaliyetlerin yoğunluğunu artırmaktadır. Özellikle kum ocağı için ruhsatlandırılabilir bölgelerde, çevresel faktörlere azami dikkat edilecektir. Bu konuda alternatif yaklaşımlar (kırma taş ocakları gibi) desteklenecektir.

- **Harita imar hizmetlerinin yapılması:**

Bu konuda faaliyeti iki kısma ayırmak gerekmektedir. Birincisi, Köy Yerleşik Planları ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt işlemlerinin yapılmasıdır. Bu faaliyetler, her türlü yatırıma destek sağlayacak bir altyapı hizmeti olacaktır. Bu faaliyetlerden Köy Yerleşik Planlarının, 2015 yılı sonuna kadar tüm köyler için hazırlanması planlanmaktadır.

- **Köy içi imar ve ruhsatlandırma hizmetlerinin yapılması:**

2011-2015 Stratejik Planı ile hedefler arasına giren konulardandır. Kırsal yerleşim birimlerindeki imarsızlık çok önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu probleme çözüm bulmak ve önümüzdeki yıllarda daha iyi bir yerleşim için çok önemli olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda köy içinde yapılacak imar hizmetlerinin ruhsatlandırma ve kaçak yapılandırma ile mücadele faaliyetleri yapılacaktır. İlk aşamada bilgilendirme faaliyetlerine önem verilecektir.

Sağlık Hizmetleri:

- **Hastane, sağlık ocağı ve evi yapımı:**

Hastane, sağlık merkezi, ocağı veya evi yapımı; İl Sağlık Müdürlüğü'nün programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kurum olarak hedefimiz, herkesin sağlık hizmetinden kolaylıkla faydalanabilmesi için gerekli sağlık tesislerini ilimize kazandırmaktır. Bu yönde her türlü katkı Sağlık İl Müdürlüğü vasıtasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır.

- **Sağlık ocaklarında ve evlerinde bakım - onarım yapımı:**

Sağlık ocaklarına yapılacak hizmetin amacı; sağlık ocaklarının ve evlerinin, personelin daha iyi şartlarda hizmet verebileceği bir şekle getirilebilmesini ve dolayısıyla halka daha iyi hizmet götürülmesini amaçlamaktadır. Bakım ve onarım hizmetinin temelini kalorifer tesisatının yapımı oluşturmaktadır. Yapılacak hizmet, Sağlık İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir.

Kültür ve Turizm Hizmetleri:

- **Tokat ili kültürel değerlerinin ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi:**

Tokat ilinin hak ettiği turizm potansiyeline ulaşılabilmesi amacıyla, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün programı çerçevesinde; il tanıtım materyallerinin hazırlanmasına, fuar katılımlarına, tarihi mekânların restorasyonuna, arkeolojik kazı faaliyetlerine, kültürel ve sportif etkinliklere destek sağlanmaktadır.

Çevre Koruma ve Dinlenme Hizmetleri:

- **Kanalizasyon yapılan köylerde çevre kirliliğini azaltmak amacıyla doğal arıtma tesisleri yapımı:**

Kanalizasyon tesisleri, toplum sağlığı açısından önemli bir görevi yerine getirmekle birlikte, ayağının başıboş bırakılması durumunda çevre problemlerine sebep olmaktadır. Bu durum göz önüne alınarak son yıllarda, kırsal birimlerde kanalizasyon tesisi ile birlikte arıtma tesislerinin yapımı gerçekleştirilmektedir. Arıtma tesislerinin yapımında, basitliği, etkinliği ve maliyeti düşünülerek doğal arıtma sistemleri tercih edilmektedir. Doğal arıtma tesisleri yapımı, Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

- **Tokat İli Çevre Düzeni Planının yeniden düzenlenmesi:**

Tokat ili için yapılan Çevre Düzeni Planı'nın yeterli görülmemesi sebebiyle, yeniden düzenlenmesi konusunda karar alınmıştır. Belediyeler ve ilgili kuruluşlarca görüş alındıktan sonra, Bakanlıkça revize yetkisi alınıp, alt ölçekli planlar hazırlanacaktır.

Sosyal Hizmetler

- **Bina bakım onarımlarına ve malzeme alımlarına katkı sağlanması.**

İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün çalışmalarına katkıda bulunulması amacıyla, bina yapımı, bakım onarımı ve malzeme alımlarına katkı sağlanacaktır.

- **Sosyal yardım ve destek sağlanması.**

Kurumumuz tarafından, asker ailelerine yardım programı yapılmakta ve ihtiyaç sahibi asker ailelerinin bütçelerine katkı sağlanmaktadır. Bir diğer sosyal program kapsamında, sokak hayvanlarının korunmasına katkı sağlanmaktadır. Kurumumuzun önemli bir programı ise; iş kurmakta zorlanan insanlara, mikro kredi desteği ile yardım sağlanmasıdır. Bu destek "Türkiye Grameen Mikro Kredi Destek Programı" kapsamında yürütülmektedir.

Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri

- **Sivil savunma hizmetlerine yönelik malzeme ve hizmet alımı yapılması.**

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün çalışmalarına katkıda bulunulması amacıyla, kurum hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli sivil savunma malzemeleri alımına destek sağlanacaktır.

- **Hizmet binası ve lojman yapım ve bakım onarımı.**

İl Emniyet Müdürlüğünün programı kapsamında yapılacak olan muhtelif inşaat faaliyetlerine destek sağlanacaktır.

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2012 YILI
FAALİYET RAPORU**

**PERFORMANS
SONUÇLARI TABLOSU
VE
DEĞERLENDİRİLMESİ**

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2012 YILI
FAALİYET RAPORU**

**İSKÂN VE TOPLUM
REFAHI
HİZMETLERİ**



STRATEJİK AMAÇ 1

TÜM KIRSAL YERLEŞİM BİRİMLERİNE; SAĞLIKLI VE YETERLİ İÇME SUYU SAĞLANACAKTIR.

STRATEJİK HEDEF 1.1

Mevcut İçme suyu tesislerinde, zamanla tıkanmalar, boru kırılmaları ve nüfus artışı sebebiyle; tesislerin iyileştirme, ilave ve bakım onarımlarının yapılması gerektiğinden dolayı, yeterli ve devamlı içme suyu sağlamak için 2011–2015 Yılları içerisinde toplam 375 Köyde İçme suyu tesisi bakım onarım ve ilave çalışması yapılacaktır. Köylerde içme suyu sayacı kullanım oranı artırılması yönünde, teşvik ve yönlendirmeler yapılarak; 2011-2015 yılları içerisinde, toplam 250 köyde su sayacı kullanımı sağlanarak, köylerin % 67'sinde su sayacı kullanımına geçilmesi sağlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.2

Yapılmış olan İçme suyu tesislerinde yer alan içme suyu depolarında, dış ve mevsimsel etkenler sebebiyle oluşan çatlak ve dökülmeler, içme suyu depolarında kaçak ve sızıntılara sebep olmaktadır. İçme suyu depolarından yeterli ve düzenli içme suyu sağlayabilmek amacıyla, 2011–2015 yılları içerisinde toplam 500 adet içme suyu deposunda bakım onarım çalışması yapılacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	YILLAR				Hedeften Sapma (%)
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
İçme suyu tesisi bakım onarım, depo yapım, depo onarım, sondaj ve ilave yapılan köy sayısı (adet)	235	101	120	183	+53

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe Ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Bakım onarım ve ilave yapılan içme suyu tesislerine ayrılan kaynak miktarı (TL) (KÖYDES Hariç)	763.629,58	1.024.818,97	1.130.000,00	1.474.240,30	130
2	Bakım onarım ve ilave yapılan içme suyu tesislerine ayrılan kaynak miktarı (TL) (KÖYDES Dahil)	1.558.037,38	1.221.275,50	1.130.000,00	1.561.505,53	138

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ – İLÇE ÖZEL İDARELER-KHGB BAŞKANLIKLARI

S.No Proje veya Faaliyet İsmi

Yerleşim
Yeri
(Adet)

Kaynak

İşin durumu

1	İçme suyu tesisi yapımı, bakım-onarımı amacıyla faaliyet (projeli yapım, malzeme yardımı vb.) yürütülen yerleşim yerleri: • <u>Merkez:</u> Akın, Ballıdere, Kervansaray, Nebi, Ormanbeyli, Semerci, Taşlıçiftlik, Yeşilyurt, Beşören, Boyalı, Dereyaka, Döllük, Çöregibüyük, Kocacık, Çerdiğin, Ulaş, Bakışlı, Kabakboğazı, Aydoğdu, Hasanbaba, Günçalı, Çökelikkışla, Şehitler, Söngüt, Gürpınar, Yenice, Derekışla, Kömeç, Oğulbey, Halilalan, Kargın, GOP, Keşlik, Bedirkale, Avşarağzı • <u>Almus:</u> Alan, Gebeli, Bakımlı, Çamköy, Kızılelma, Kolköy, Çilhane, Çamdalı, Babaköy, Kuruseki, Sağırlar, Çaykırı, Değeryer, Karadere • <u>Artova:</u> Ahmetdanişment, Yukarıgüçlü, Salur, Aktaş, Gürardıç, Aktaş, Devecikarkın, Mescit, Ağmusa, Tanyeli, Bebekderesi, Yenice, Gazıpınar • <u>Erbaa:</u> Çalkara, Çatalan, Yoldere, Hacıpazar, Aşağıçandır, İverönü, Karaağaç, Doğanyurt, Üçtepeler, Bağpınar, Güveçli, Hacıali, Çakır • <u>Niksar:</u> Dalkaya, Eryaba, Akgüney, Gündüklü, Musapınar, Kümbetli, Yeşilhisar, Gülbayır, Boğazbaşı, Asar, Çimenözü, Aydoğmuş, Yeşilyurt • <u>Pazar:</u> Ocaklı, Doğançalı, Menteşe, Beşevler, Dereçaylı, Tepeçaylı, Çayköy, Bağlarbaşı • <u>Reşadiye:</u> Uğurlu, Dutdibi, Akdoğmuş, Taşlıca, Güvendik, Beşdere, Saraykışla, Umurca, Döllük, Çakırlı, Aydoğmuş, Yağsiyan • <u>Sulusaray:</u> Ballıkaya, Beyazıt, Çime, Uylubağı,	183	1.474.240,30	Tamamlandı.
---	---	-----	--------------	-------------

	Alanyurt, Balıkhisar, Sarıyaprak, Belpınar, Arpacıkaraçay, Buğdaylı, Selimiye, Tekkeyeni • <u>Turhal:</u> Dökmetepe, Necip, Arzupınar, Kuşoturağı, Üçyol, Çamlıca, Çivril, Bahçebaşı, Kızkayası, Çayıraltı, Kamalı, Gökdere, Ataköy, Elalmış, Akbuğday, Bağlarpınarı, Samurçay, Hasanlı, Derbentçi, Koruluk, Kalaycık, Sarıkaya, Elalmış • <u>Yeşilyurt:</u> Muhtelif boru alımı (13 köy) • <u>Zile:</u> Karakuzu, Küçüközlü, Salur, Küçükkozluca, Belkaya, Eskiderbent, Yapalak, Büyükkarayün, Üçköy, Savcı, Cellokışla, Alihoca, Büyükkarayün, Uzunköy, Emirdolu, Kuruçay, Söğütözü, Karşeyh, Köylüürünü, Hacılar, Üçkaya, Kireçli, Çayıroluğu, Karşeyh, Kozdere, Kervansaray, Karşıpınar			
--	--	--	--	--

Uygulayan Birim: KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİK BAŞKANLIĞI – İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ (KÖYDES PROGRAMI)

Yerleşim

S.No Proje veya Faaliyet İsmi

Yeri



Kaynak

İşin

1	İçme suyu tesisi yapımı, bakım-onarımı amacıyla faaliyet (projeli yapım, malzeme yardımı vb.) yürütülen yerleşim yerleri: • <u>Merkez:</u> GOP • <u>Pazar:</u> Bağlarbaşı • <u>Yeşilyurt:</u> Merkez	3	87.265,23	Tamamlandı.
---	--	---	-----------	-------------

Değerlendirme:

- ✓ 2012 yılı içerisinde; bakım onarım yapılan tesis sayısı planlanan tesis sayısının % 53 üzerinde gerçekleşmiştir. Bu oran, kabul edilebilir bakım-onarım seviyesi olan % 10'lar düzeyinin üzerindedir. Hedefimiz, bakım – onarım yapılan tesis sayısını yıllar içerisinde azaltmak olmalıdır. Son üç yıla bakıldığında, genel olarak bir azalma olmadığı görülmektedir. Bakım-onarım için harcanan kaynak miktarında 2012 yılında bir yükseliş yaşanmıştır. Bakım-onarım oranının ve maliyetinin düşürülmesi için, farklı alternatifler üretilmesi faydalı olacaktır. Bunlar:
- Su sayacı kullanımının, tüm yerleşim birimlerinde sağlanması amacıyla, İdarenin zorlayıcı tedbirlere başvurusu (Su sayacı olmayan yerleşim birimlerine ek tesis yapılmaması gibi),
 - Ekonomik ömrünü doldurmuş tesislerin komple yenilenmesi,
 - Tesislerin yapılacak kanuni düzenlemeler ile tesisleri kullanan tüzel kişiliklere teslimi ve bakım ve onarımın bu tüzel kişiler tarafından karşılanması.
 - Tesis bakım onarımlarında sigorta şirketlerinin devreye sokulması.

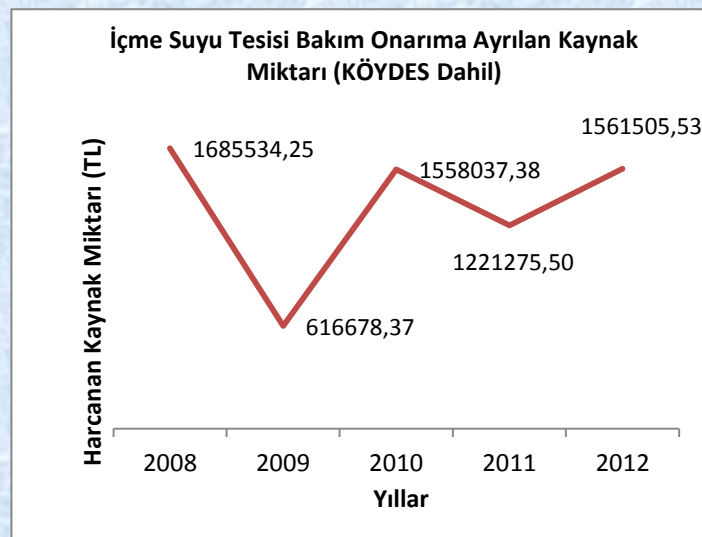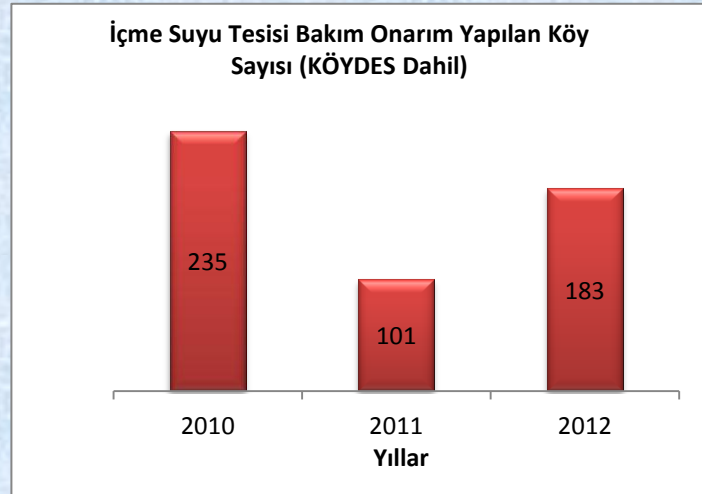

STRATEJİK HEDEF 1.3

Tüm kırsal yerleşim birimlerine sağlıklı bir içme suyu sağlayabilmek amacıyla, 2011–2015 yılları içerisinde, toplam 350 depoda klorlama ünitesi kurularak, mevcut su depolarının % 35'ine klorlama makinesi tesis edilecektir.

Performans Hedefi:

Tanımı	YILLAR				
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Klorlama tesisi tamamlanan içme suyu tesisi oranı (Kümülatif toplam) (%) (Toplam tesis sayısı 2010:950, 2011:960, 2012: 970 alınmıştır.)	2,4	5,6	9,6	11,0	+15

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedefe ulaşma (%)
1	Klorlama cihazı yapılan toplam tesis sayısı	23	54	90	113	125
2	Klorlama cihazı için harcanan kaynak miktarı (TL)	11.250,00	39.530,00	100.000,00	32.377,78	32

Değerlendirme:

✓ 2012 yılında, klorlama cihazı monte edilen toplam tesis sayısı 113'e ulaşmıştır. Bu durum belirlenen hedefin %25 üzerindedir. Bununla birlikte harcanan kaynak miktarı, hedeflenen miktarın altındadır. Bunun sebebi, klorlama cihazları 2011 yılında alınmıştır. Montesi ise 2012 yılında gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında klorlama cihazlarına tablet alımı yapılmıştır.

Uygulayan Birim: KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİK BAŞKANLIĞI – İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ (KÖYDES PROGRAMI)

S.No Proje veya Faaliyet İsmi	Depo Sayısı (Adet)	Kaynak (KÖYDES)	İşin durumu
1 Klorlama cihazı monte edilen yerleşim yerleri: • <u>Merkez:</u> Kızılköy, Çubuklu, Kızılöz (2 depo), Akın, Taşlıçiftlik, Gökdere, Kömeç, Çamdere, Altıntaş, Kocacık, Ulaş • <u>Almus:</u> Gümeleönü • <u>Artova:</u> Taşpınar, Yağcımusa, Boyunpınar, Danişment, Aktaş, Salur • <u>Başçiftlik:</u> Yeşilçam, Sariağıl • <u>Erbaa:</u> Tosunlar, Pınarbeyli, Tepekışla, Yukarıçandır, Demirtaş, Ballıbağ, Kaleköy • <u>Niksar:</u> Buzköy, Ormancık, Musapınarı, Cer • <u>Pazar:</u> Taşlık, Tatar, Dereçay, Çayköy, Ballica, Ovayurt, Menteşe, Bağlarbaşı • <u>Reşadiye:</u> Yağsiyan • <u>Sulusaray:</u> Ilıca, Uylubağı • <u>Yeşilyurt:</u> Karacaören, Doğanca • <u>Turhal:</u> Kayaören, Necip, Dökmetepe, Gümüştop, Çarıksız, Kızkayası • <u>Zile:</u> Acısu, Kırklar, Uzunöz, Boldacı, Büyüközlü, Edeköy, Yapalak, Turgutalp	59	32.377,78	Tamamlandı.

STRATEJİK AMAÇ 2

GÖREV ALANI İÇERİSİNDEKİ TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİNE, ÇALIŞIR DURUMDA KANALİZASYON HİZMETİNİ SUNMAK.

STRATEJİK HEDEF 2.1

Kanalizasyon tesisi bulunmayan yerleşim birimlerine, daha temiz ve sağlıklı çevre şartları sağlamak amacıyla; 2011–2015 yılları içerisinde toplam 50 köyde kanalizasyon tesisi yapılarak, Tokat İli Köylerinin %93'ünün kanalizasyonu tamamlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	YILLAR				Hedekten Sapma (%)
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
Kanalizasyon tamamlanma oranı (Kümülatif Toplam) (%)	86	87	89	87	-2

* Kanalizasyon oranları, 2010 yılında köy muhtarlıkları ile yapılan ankete göre yeniden düzenlenmiştir. Tokat İli toplam köy sayısı 583 olarak alınmıştır.

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Kanalizasyon tesisi yapılan köy sayısı (adet)	13	7	12	2 (İş devam ediyor.)	0
2	Yeni tesis kanalizasyon için harcanan kaynak miktarı (TL)	122.727,23	130.000,00	370.000,00	40.000,00	11

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Yerleşim

S.No Proje veya Faaliyet İsmi

Yeri
(Adet)

Kaynak

İşin durumu

1	Yeni tesis kanalizasyon yapımı <u>Niksar</u>: Büyükyurt (İş devam ediyor.), Şahinli (İş devam ediyor.)		40.000,00	İş devam ediyor.
---	---	--	------------------	-------------------------

Değerlendirme:

- ✓ 2011–2015 Stratejik Planı ile köylerin % 93'ünün kanalizasyonunun tamamlanması hedeflenmiştir. 2011 yılı sonu itibarıyla, bu oran % 87 olarak sonuçlanmıştır. 2012 yılında iki adet yeni kanalizasyon tesisi projesi bulunmaktadır. Bunların yapımı devam etmektedir. Kanalizasyon tesisi tamamlanma oranının, bu aşamadan sonra yükseltilmesi güç olmakla birlikte normal olan bir durumdur. Kanalizasyonu olmayan köylerin, nüfusu çok az ve topografya zordur. Bu tür yerleşim yerlerinde, kanalizasyon tesisinin yapılıp yapılmaması gerektiği değerlendirilmelidir. Şartlar uygun olduğu takdirde, Stratejik Plan hedeflerine rahatlıkla ulaşılabilecektir.

STRATEJİK HEDEF 2.2

Mevcut kanalizasyon tesislerinde, zamanla tıkanmalar ve nüfus artışı sebebiyle fosseptik yapımı, iyileştirme, ilave ve bakım onarımlarının yapılması gerektiğinden dolayı; 2011–2015 yılları içerisinde toplam 300 köyde kanalizasyon tesisi bakım-onarım ve ilave çalışması yapılacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	YILLAR				
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Kanalizasyon tesisi ilave ve bakım-onarım çalışması yapılan köy sayısı (adet)	171	108	70	139	+98

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedefe ulaşma (%)
1	Kanalizasyon iyileştirme ve bakım-onarım için harcanan kaynak miktarı (TL)	569.473,77	722.898,25	300.000,00	586.964,00	195

Projeler veya Faaliyetler:


Uygulayan Birim: İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ – İLÇE ÖZEL İDARELER-KHGB BAŞKANLIKLARI

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (Adet)	Kaynak	İşin durumu
1	Bakım onarım ve iyileştirme yapılan kanalizasyon tesisi yapımı Merkez: Alan, Çerdiğin, Bakışlı, Çubuklu, Hanpınar, Hasanbaba, Tekneli, Akın, Tekneli, Taşlıçiftlik, Yazıbaşı, Kızıllöz, Kızılkaya, Kabatepe, Çerçi, Kadıvakfı, Ahmetalan, Ulaş, Beşören, Keşlik, Çamaltı, Yakacık, Söngüt, Gökdere, Tahtoba, Dedeli, Kömeç, Semerci, Derekışla, Kızılköy, Ballıdere, Boyalı, Güzeldere, Eskiköy Almus: Çamköy, Sarıören, Karadere, Alan, Bakımlı, Mescit, Babaköy, Üçgöl, Gümeleönü, Oğulbey Artova: Gürardıç, Ağmusa, Devecikarkın, Salur, Ulusulu, Evlidere, Bayırlı, Aktaş, Tanyeli, Bebekderesi, Gazıpınar Başçiftlik: Erikbelen Erbaa: Çalkara, Yaylacık, Aydınsofu, Akgün, Tosunlar, İverönü, Çevresu, Y.çandır, Ağpınarı, Hacıpazarı, Güveçli Niksar: Gülbayır, Kapıağzı, Mezra, Yeşilhisar, Hacılı, Musapınarı, Çiçekli, Işıklı, Sarıyazı, Karabodur, Hüseyingazi, Köklüce, Günlüce, Güdüklü, Çimenözü, Teknealan, Buzköy, Tahtalı, Büyükyurt Pazar: Tatar, Ocaklı, Bağlarbaşı, Dereçaylı, Taşlık Reşadiye: Bağdatlı, Dutdibi, Çambalı, Taşlıca, Gökköy, İslamlı, Umurca, Çayırpınarı, Akdoğan Sulusaray: Uylubağı, Alpudere, Buğdaylı, Tekkeyeni, Çime, Alanyurt, Ballıkaya Turhal: Dökmektepe, Necip, Tatlıcak, Üçyol, Yeşilalan, Karkın, Erenli, Eriklitekke, Kalaycık Zile: Yeşilce, Alihoca, Osmanpınarı, Büyüközlü, Kuzualan, Yeniköy, Kervansaray, Güblüce, Küçükaköz, Üçkaya, Narlıkışla, Üyük, Kireçli, Yaraş, Derebaşı, Yaylakent, Yenidağıci, Kazancı, Palanlı, Karakuzu, Belpınar, Yeşilce, Karşıpınar, Korucak, Boldacı, Çayır	139	586.964,00	Tamamlandı.

Değerlendirme:

✓ 2012 yılı içerisinde; bakım onarım yapılan tesis sayısı planlanan tesis sayısının % 98 üzerinde gerçekleşmiştir. Mevcut kanalizasyon tesislerinin % 27'sinde bakım-onarım veya ek tesis yapılmıştır. Bu oran, kabul edilebilir bakım-onarım seviyesi olan % 10'lar düzeyinin üzerindedir. Hedefimiz, bakım – onarım yapılan tesis sayısını yıllar içerisinde azalmak olmalıdır. Son üç yıla bakıldığında, genel olarak bir azalma olmadığı görülmektedir. Bakım-onarım için harcanan kaynak miktarında 2012 yılında bir düşüş yaşanmıştır. Bakım-onarım oranının ve maliyetinin düşürülmesi için, farklı alternatifler üretilmesi faydalı olacaktır. Bunlar:

- Ekonomik ömrünü doldurmuş tesislerin komple yenilenmesi,
 - Tesislerin yapılacak kanuni düzenlemeler ile tesislerin kullanan tüzel kişiliklere teslimi ve bakım ve onarımın bu tüzel kişiler tarafından karşılanması,
 - Tesis bakım onarımlarında sigorta şirketlerinin devreye sokulması.
- vb. alternatifler olabilir.

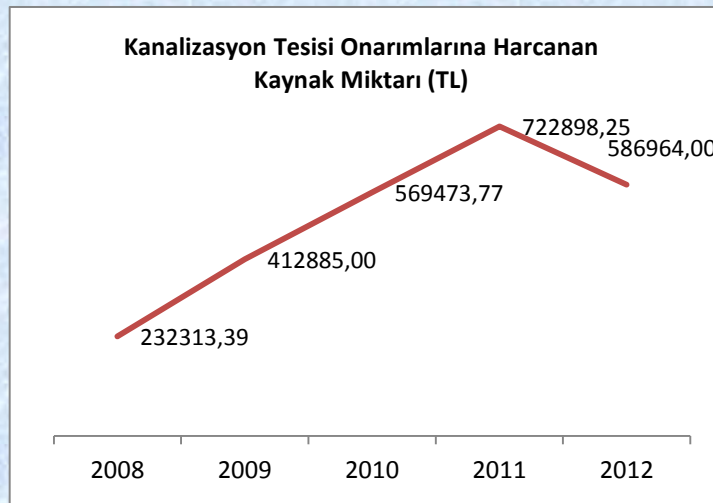

STRATEJİK AMAÇ 3

ULAŞIMIN HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLANABİLMESİ İÇİN BÜTÜN KIRSAL YERLEŞİM BİRİMİ YOLLARI ÇAĞDAŞ STANDARTLARA KAVUŞTURULACAKTIR.

STRATEJİK HEDEF 3.1

2011–2015 dönemi içerisinde, toplam 375 km köy yolunun standardı yükseltilecektir.

Performans Hedefi:

Tanımı	YILLAR				
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Standartı yükseltilen köy yolu miktarı (km) (Yol Onarımı + 1.Kat Asfalt)	96,6	72,6	70,0	71,6	+2

Değerlendirme:

- ✓ Yol standardının yükseltilmesi ifadesi ile yol onarımı ve 1. Kat asfalt yapımı dikkate alınmıştır. Yol onarım ve 1.Kat asfalt yapımında maliyet, diğer bölümlerde yapıldığı için bu kısımda yapılmamıştır.
- ✓ 2012 Yılı için belirlenen miktarın % 2 üzerinde olmuştur.
- ✓ Stratejik Plan ile hedeflenen 375 km yolun % 64'üne ulaşılmıştır. Önümüzde yer alan 3 yıl içerisinde, Stratejik Plan ile belirlenen hedef rahatlıkla yakalanabilecektir.

STRATEJİK HEDEF 3.2

Grup yollarından başlamak üzere tüm köy ve mahalle yollarının trafik ikaz ve işaret levhaları tamamlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	YILLAR				Hedeften Sapma (%)
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
Köy yollarının takılan trafik ikaz ve işaret levhası sayısı (adet)	850	250	200	300	+50

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Trafik levhası için harcanan kaynak miktarı (YTL)	153.000,00	38.350,00	150.000,00	74.348,26	50

Değerlendirme:

- ✓ Trafik levhası takılması belirlenen hedefin % 50 üzerinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte maliyet ise belirlenen hedefin sadece % 50'inde kalmıştır. Bunun sebebi; daha önceki yıllarda yapımı gerçekleştirilen levhaların takılmasının gerçekleştirilmesidir.

STRATEJİK HEDEF 3.3

Asfalt kaplamalı köy yollarının, grup yollarından başlamak üzere tümünün II. kat asfalt kaplaması yapılacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	YILLAR				Hedekten Sapma (%)
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
II. Kat asfalt kaplama yapılan köy yolu miktarı (km)	242,6	209	150	191,3	+27

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	II. Kat asfalt kaplama yapımı için harcanan kaynak miktarı (TL)	3.194.402,35	3.614.912,22	2.700.000,00	3.260.651,55	121

Performans değerlerine KÖYDES dâhil edilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 3.4

Stabilize kaplamalı veya asfalt niteliğini kaybetmiş köy yollarının, I. kat asfalt kaplaması yapılacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	YILLAR				
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
I. Kat asfalt kaplama yapılan köy yolu miktarı (km)	204,8	129,3	50,0	40,3	-19

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedefe ulaşma (%)
1	I. Kat asfalt kaplama yapımı için harcanan kaynak miktarı (TL)	12.791.534,36	8.629.185,74	3.250.000,00	3.613.342,97	111

- Performans değerlerine KÖYDES dâhil edilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 3.5

Asfalt kaplamalı köy yollarının, asfalt bakımları (Yama) yapılacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	YILLAR				
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Asfalt bakımı (yama) yapılan köy yolu miktarı (km)	1512	941	1000	1008	+1

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Asfalt bakımı (yama) yapımı için harcanan kaynak miktarı (TL)	2.590.747,00	1.678.100,00	2.000.000,00	2.700.000,00	135

- Performans değerlerine KÖYDES dâhil edilmiştir.

*** Diğer Yol Yapım Faaliyetleri Çizelgesi**

S.No	İsmi	YILLAR		
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Gerçekleşme
1	Tesviye Yapımı (km)	16	111,3	38,5
2	Orman Yolu Yapımı (km)	155	170,5	1,5
3	Yayla/Arazi Yolu Onarımı (km)	132,5	14,5	-
4	Yayla Yolu Reglaj Yapımı (km)	160	-	5
5	Stabilize Kaplama Yapımı (km)	396,4	217,3	147,5
6	Malzemeli Bakım Yapımı (km)	60,4	294,6	-
7	Greyderli Bakım (km)	5310	8580	7439
8	Büz-Menfez Konması (köy)	11	15	16
9	Köprü-Menfez Dolgusu Yapımı (köy)	9	15	5
10	Köprü Yapımı (adet)	2	1	1
11	Köprü Onarımı (adet)	1	1	1
12	Heyelan Temizliği Yapımı (köy)	56	70	12



- Performans değerlerine KÖYDES dâhil edilmiştir.

*** Yol Faaliyetleri Toplam Harcama Çizelgesi**

S.No	İsmi	YILLAR		
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Gerçekleşme
1	Yol yapım-bakım ve çeşitli mal ve malzeme için harcanan kaynak miktarı (KÖYDES Hariç) (TL)	13.303.244,00	5.099.209,71	4.793.578,34
2	Yol yapım-bakım ve çeşitli mal ve malzeme için harcanan kaynak miktarı (KÖYDES Dahil) (TL)	22.835.813,57	16.330.261,20	10.469.183,41

Değerlendirme:

- ✓ Tokat İli kırsalında, yolu olmayan yerleşim merkezi bulunmamaktadır. Bununla birlikte her yıl yeni yol yapımı ihtiyacı doğmakta olup, son üç yıl içerisinde toplam 165,8 km yeni yol (tesviye yapımı) yapımı gerçekleştirilmiştir. Bu durum mahalleler arası köy yolu açma isteğinden ileri gelmektedir. 2012 yılı, yol yapım hizmetlerinde önemli düzeyde faaliyetlerin gerçekleştirildiği yıl olmakla birlikte son üç yıl azalma eğilimine girmiştir. KÖYDES programından en fazla kaynak her yıl olduğu gibi yine yol yapım faaliyetlerine ayrılmıştır. 2012 Yılında yol yapım faaliyetlerine ayrılan kaynağın % 54'ü KÖYDES programından karşılanmıştır.
- ✓ Yol yapım faaliyetlerinde üzerinde durulması gereken en önemli konu yol standartlarının yükseltilmesi ve yapılan yol yatırımlarının etkinliğinin artırılmasıdır. Yol onarımları, stabilize yol yapımları, menfez ve köprü yapımları ve II.kat asfalt yapımları yol standartlarının yükseltilmesinde çok önemli işlevlere sahip faaliyetlerdir. Son beş yıl içerisinde bu konuda çok önemli mesafeler alınmış ve yatırımlar gerçekleştirilmiştir.

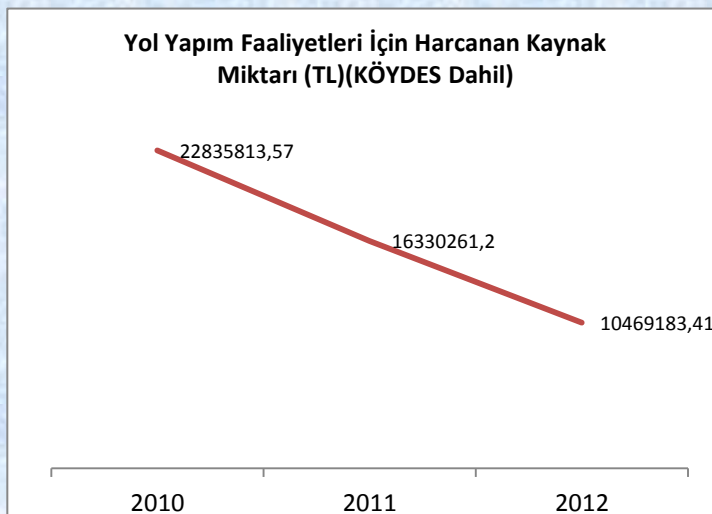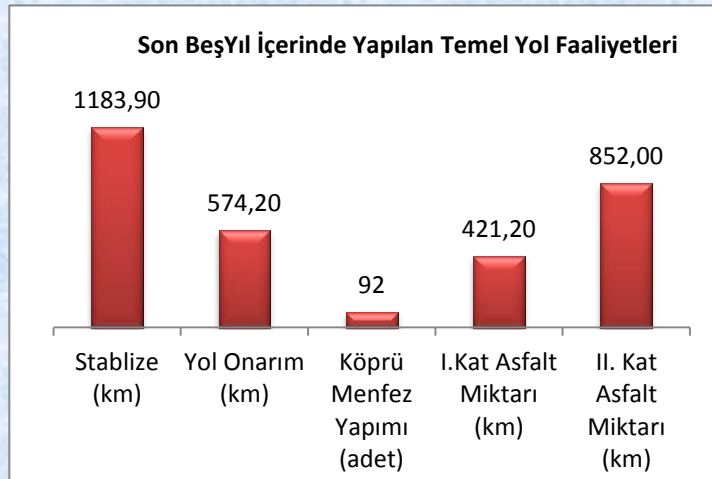

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Tesviye Yapımı - Merkez-Semerci-Hanpınar Arası - Erbaa-Çatalan Köyü - Erbaa-Kırıkgüney Köyü - Erbaa-Şükür Köyü - Erbaa-Yurtalan Köyü - Erbaa-Beykaya Köyü - Erbaa-Kurtuluş-İvaza - Erbaa-Kırıkgüney-Şükür Köyü- Güney Mah.Bağlantısı - Reşadiye-Hebüllü-Yukarı Mah. - Reşadiye-Elmacık-Bozçalı - Reşadiye-Vakıf Grup Yolu Göllüköy - Reşadiye-Zinav-Büşürüm-Altıntaş Mah. - Reşadiye-Umurca Mezra Mah. - Reşadiye-Bayırbaşı Mezarlık Yolu	38.50 km	300.000,00	Tamamlandı
2	Yol Onarımı Yapımı - Merkez-Batmantaş Köyü - Merkez-Aydınca Köyü - Merkez-Kabakboğazı, Üçgöl, Mülk arası - Erbaa-Alçakbel-Şükür Arası Grup Yolu - Erbaa-Hodaypınarı-Madenli Grup Yolu - Erbaa-Beykaya Feribot Yolu - Niksar-Çiçekli Köyü-Pelitli Mah.	31.80 km	-	Tamamlandı
3	Stabilize Kaplama Yapımı - Almus-Hubyar Köyü - Almus-Kapıcı Köyü - Niksar-Asar Köyü - Niksar-Kaşıkçı Köyü - Niksar-Kapıağzı Köyü	144.50 km	-	Tamamlandı

	• Reşadiye-Eymür Grup Bağlantı Yolu • Reşadiye-Tozanlıfındıcak Mah. • Reşadiye-İsmailiye Köyü Mah.Yolları • Reşadiye-Kaşpınar Köyiçi • Reşadiye-Döllük-Sazak Grup Bağlantı Yolu • Reşadiye-Danişment-Konak-Demircili Bağlantı Yolu • Reşadiye-Bostankolu Köyiçi • Reşadiye-Baydarlı-Çakıllı Bağlantı Yolu • Turhal-Buzluk Köyü • Turhal-Taşlıhöyük Köyü • Turhal-Karkın Köyü • Turhal-Yeşilalan Köyü • Turhal-Erenli Köyü • Turhal-Yazıtepe-Koruluk • Turhal-Dökmetepe-Necip • Turhal-Ormanözü Köyü • Turhal-Hasanlı Köyü • Turhal-Bahçebaşı Köyü • Zile-Turgutalp-Akkılıç Arası • Zile-Derebaşı Köyü • Zile-Üçkaya Köyü • Zile-Kazıklı Köyü • Zile-Kuzalan Köyü • Zile-Belpınar Köyü • Zile-Yaylakent Köyü • Zile-Çayır-Sofular Arası • Zile-Ağılcık Köyü			
4	I.Kat Asfalt Kaplama Yapımı • Başçiftlik-Yeşilçam • Erbaa-Gökal Grup Yolu • Sulusaray-Dutluca-Ballıkaya-Balıkhisar Grup Yolu • Sulusaray-Ilıcak-Sarıyaprak Yolu • Yeşilyurt-Sekücek-Bahçebaşı Arası	8,95 km	1.194.306,38	Tamamlandı

	Yeşilyurt-Kuşçu Yolu			
5	II.Kat Asfalt Kaplama Yapımı - Başçiftlik-Sarıağıl - Sulusaray-Dutluca- Yolu - Yeşilyurt-Çıkırık-Çırdak Yolu Arası	9,4 km	120.000,00	Tamamlandı
6	Sanat Yapıları (Menfez konması) - Merkez-Ahmetalan Köyü (1 Adet Kutu Menfez) - Merkez-Avşarağzı Köyü (1 Adet Kutu Menfez) - Merkez-Bakışlı Köyü (1 Adet Kutu Menfez) - Merkez-Çerçi Köyü (1 Adet Kutu Menfez) - Merkez-Gölcük Köyü (1 Adet Kutu Menfez) - Merkez-Kabakboğazı Köyü (1 Adet Kutu Menfez) - Erbaa-Meydandüzü Grup Yolu Alacabal Mevkii (Menfez) - Erbaa-Engelli-Şimşirlik (1 Adet 3x3) Menfez - Erbaa-Erdemli Mahalle Yolu (2 Adet 3x3) Menfez - Erbaa-Alan-Şükür Grup Yolu (3 Adet Beton Kasis) - Erbaa-Yurtalan-Gökal Arası Grup Yolu (Beton Kasis) - Sulusaray-Tekkeyeni Köyü-Ballıkaya Arasına Menfez Yapımı - Sulusaray-Ballıkaya Köyü Köyiçi İstinat Duvarı - Sulusaray-Sarıyaprak Köyyolu - Merkez-Acıpınar Köyü (4 Adet Kutu Menfez)	15 köy	255.000,00	Tamamlandı
7	Köprü Yapımı Artova-Zile Grup Yolu km	1 adet	30.000,00	Tamamlandı

8	Hizmet alımı - Başçiftlik-Hizmet Alımı - Niksar-Hizmet Alımı		28.000,00	Tamamlandı
9	Kutu Menfez Alımı Reşadiye İlçesi köy yollarında kullanılmak üzere	1 köy	7.552,00	Tamamlandı
10	Asfalt (Yama) Rodmiks Alımı - Merkez İlçe Köy yollarına - Niksar İlçe Köy yollarına	1008	2.700.000,00	Tamamlandı
11	Trafik İkaz İşaret Levhası ve Omega Direk Satın Alımı <u>Tokat Merkez ve İlçe köy yolları</u>	-	74.348,26	Tamamlandı
12	Kamulaştırma ve Parselasyon Harcamaları - Merkez Tahtoba köyü yol geçen 697 nolu parsel - Tokat Merkez Ulaş Köyü 16 ada, 1820 ve 1823 nolu parseller	-	6.695,00	Tamamlandı
13	Korge Boru Alımı Reşadiye İlçesi köy yollarında kullanılmak üzere	-	16.482,24	Tamamlandı
14	Ortofoto Harita ve Raster Satın Alımı	-	25.809,72	Tamamlandı
15	Malzeme Satın Alımı (Kırtasiye , Patlayıcı madde , Demir) - Müdürlüğümüz ihtiyaçları için kırtasiye Alımları - Müdürlüğümüz ihtiyaçları için Asfalt Bakım İşlerinde kullanılmak üzere muhtelif malzeme Alımı - Tokat-Merkez-Semerci-Çat Yolu Menfez İnşaatı için nevrürlü İnşaat Demiri Satın Alımı - Merkez ve İlçe köy yollarında yapım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere Patlayıcı Madde Satın Alımı	-	18.569,74	Tamamlandı
16	TR Uyumlu Cors GNNS Alıcı Satın Alımı	-	16.815,00	Tamamlandı

Uygulayan Birim : KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ - İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (KÖYDES PROGRAMI)

S.No Proje veya Faaliyet İsmi

Miktarı

Kaynak

İşin durumu

1	Stabilize Kaplama Yapımı • Reşadiye Demircili-Yağsiyan- Kuyucak yolu	3 km	49.088,00	Tamamlandı
2	I.Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı • Erbaa Sokutaş-Keçeci Yolu • Merkez Kömeç-Turhal Yolu Arası • Merkez Çamaltı Köy Yolu • Almus Oğulbey Köy Yolu • Artova Sağlıca-Ağmusa Grup Yolu • Başçiftlik Erikbelen Köy Yolu • Erbaa Meydandüzü Köy Yolu • Erbaa Tanoba-Esençay Grup Yolu • Erbaa Kızılçubuk-Kale-Çatalan Grup Yolu • Niksar Budaklı-Tepeyatak Grup Yolu • Reşadiye Bereketli-Taşlıca-Çakraz-Hebüllü-Keteneği Grup Yolu • Reşadiye Güvendik-İbrahimşeyh-Hasanşeyh-Demircili-Yağsiyan Grup Yolu • Reşadiye Sazak-İsmailiye Grup Yolu • Sulusaray Ilıcak-Sarıyaprak Yolu • Turhal Kızılkayası-Turhal Bağlantı Yolu • Turhal Ovayurt-Osb Arası • Turhal Bağlarpınarı-Zile Bağlantı Yolu • Turhal Necip-Tokat Bağlantı Yolu • Yeşilyurt Sekücek-Gündoğan-Bahçebaşı • Zile Büyükaköz Köy Yolu	31,3 km	2.419.035,97	Tamamlandı
3	II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı • Merkez Sivas Yol Ayrımı-Çördük-Beşören • Merkez Dedeli-Yelpe • Merkez Kocacık-Çamdere-Günevi • Merkez Yatmış-Günçalı • Merkez Akbelen Grup Yolu- Niksar Yol Ayrımı • Merkez Yazıbaşı Köy Yolu	181,9 km	3.140.651,55	Tamamlandı

• Merkez Küçükbağlar Köy Yolu • Merkez Gözova-Çökelikkışla Yolu • Merkez Güğümlü Köy Yolu • Merkez Çamaltı Köy Yolu • Almus Gümelönü-Çilehane Arası • Almus Bağtaşı-Kolköy Yolu • Artova Artova-Zile Grup Yolu • Artova Sağlıca-Ağmusa Grup Yolu • Erbaa Sokutaş-Keçeci Yolu • Erbaa Kızılçubuk-Kale-Çatalan Grup Yolu • Erbaa Gölönü Köy Yolu • Erbaa Zoğallıçukur-Ağcakeçi-İverönü Grup Yolu • Niksar Budaklı-Tepeyatak Grup Yolu • Niksar Çiçekli-Umurlu Grup Yolu • Niksar Yalıköy Köy Yolu • Niksar Çalca Köy Yolu • Niksar Kiracı Köyü İle Erbaa İlçesi Pınarbeyli Köyü Arası • Niksar Yeşilkaya-Yağmurlu Beldesi Arası • Niksar Bayraktepe Köy Yolu • Niksar Teknealan Köy Yolu • Niksar Eryaba Köy Yolu • Niksar Tepeyatak Köy Yolu • Pazar Ocaklı Köy Yolu • Pazar Kalaycık Köy Yolu • Reşadiye Bereketli-Taşlıca-Çakraz-Hebüllü-Keteneği Grup Yolu • Turhal Bağlarpınarı-Zile Bağlantı Yolu • Turhal Kat-Tokat Bağlantı Yolu • Zile Kireçli Köy Yolu • Zile Çeltek Köy Yolu • Zile Olukman Köy Yolu • Zile Uzunöz Köy Yolu • Zile Küçüközlü Köy Yolu • Zile Özyurt-Selamet Arası			
--	--	--	--

	Zile Büyükkozluca Köy Yolu			
4	Köprü Genişletme Turhal Kayaören	1 adet	50.000,00	Tamamlandı
5	Korige Boru Alımı - Almus Kapıcı Köy Yolu - Artova Muhtelif Köy Yolları	-	16.829,55	Tamamlandı

STRATEJİK HEDEF 3.6

Grup yollarının sıcak asfalt kaplama yapılabilmesi için, “Sıcak Asfalt Plenti”nin kurulması gerçekleştirilecektir.

Sıcak Asfaltlama Plenti’nin kurulmasına yönelik olarak; 2012 yılı için hedef belirlenmemiştir. Buna bağlı olarak da konu ile ilgili herhangi bir faaliyet yapılmamıştır.

STRATEJİK AMAÇ 4

HALKIMIZA GELİŞMİŞ ÜLKE STANDARTLARINDA BAYINDIRLIK VE İMAR HİZMETLERİ SAĞLANACAKTIR.

STRATEJİK HEDEF 4.1

İdare bünyesinde inşa edilen “Parke Yapım Tesisinde” üretilen Kilitli Beton Parke kullanılarak; 2011–2015 yılları içerisinde toplam 250 köyde, Kilitli Beton Parke çalışması yapılacaktır. Böylece köylerimizin daha temiz, daha güzel ve daha yaşanılır olmasına katkı sağlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	YILLAR				
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Parke yapılan köy sayısı (adet)	-	86	85	96	+13

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedefe ulaşma (%)
1	Parke çalışması yapılan alan (m ²)	-	197278	255000	202890	80
2	Parke yapımı için harcanan kaynak miktarı (TL)	-	1.598.037,56	1.430.000,00	1.629.420,00	114

Performans değerlerine KÖYDES dâhil edilmiştir.

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ-İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ-KHGB BAŞKANLIĞI

S.No Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1 Parke verilen köyler: • Merkez: Söngüt, Kızılköy, Kadıvakfı, Beşören, Keşlik, Tahtoba, Yelpe, Yayladalı, Bakışlı, Semerci, Yazıbaşı, Çerçi, Dedeli, Ulaş, Çubuklu • Almus: Gebeli, Bakımlı, Sahilköy, Oğulbey, Gümeleönü, Teknecik, Çamköy, Çamdalı • Artova: Aşağıgüçlü, Salur, Devecikarkın, Boyunpınar, Taşpınar • Başçiftlik: Şahnaalan • Erbaa: Ağcakeçi, Akgün, Çerkezfındıcak, Çeşmeli, Demirtaş, Gölönü, Karaağaç, Kozlu, Ocakbaşı, Pınarbeyli, Yaylalı • Niksar: Örenler, Hacılı, Güdüklü, Sorhun, Arıpınar, Sarıyazı (Yağan Mah.), Mahmudiye, Mercimekdüzü, Çiçekli • Pazar: Ovayurt, Kaledere-Manastır, Çiftlik, Menteşe • Resadiye: Elmacık, Güzeldere, Hebüllü, Taşlıca, Keteniği, İbrahimşeyh, Güvendik, İsmailiye, Çakmak, Eyüp, Kuzgölcük, Güneygölcük, Çambalı, Karlıyayla, Çakırlı, Toklar • Turhal: Necip, Kayaören, Bahçebaşı, Kuşoturağı, Ataköy, Çivril, Derbentçi, Dökmetepe, Kızkayası, Sarıkaya, Taşlıhöyük, Uluöz, Üçyol, Yeniceler • Yesilyurt: Bütet, Ekinli • Zile: Çayır, Selamet, Söğütözü, Ağıcık, Boldacı, Büyükoğlu, Çapak, Çayıroğlu, Derebaşı, Küçüközlü, Yeşilce	202890 m²	1.629.420,00	Tamamlandı.

Değerlendirme:

- ✓ 2011 – 2015 Stratejik Planı ile hedefler arasına giren bir faaliyet alanıdır. Kırsal yerleşim birimlerinin imarına yönelik, çok önemli bir faaliyet alanıdır. Kurum kendi bünyesi içerisinde, parke üretim tesisine de sahip bulunmaktadır. Söz konusu Stratejik Plan döneminde, köylerin yaklaşık % 42'sinin (250 köy) parke çalışmasının tamamlanması planlanmıştır. İlk iki yıl içerisinde gösterilen performansa göre (182 köy) hedefin % 73'ü karşılanmıştır. Bu verilere göre; beş yıl içerisinde Stratejik Plan ile belirlenen hedefe ulaşılabilecektir.

STRATEJİK HEDEF 4.2

Kırsal yerleşim alanlarında, olabilecek yangınlara daha kısa sürede müdahale edilebilmesi amacıyla; 2011–2015 yılları içerisinde toplam 150 köye, traktörle çekilir kendinden motorlu yangın söndürme makinesi sağlanacaktır.

Hedef ile ilgili herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir.

STRATEJİK HEDEF 4.3

İl bayındırlık ve imar hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için harcanan kaynak miktarı (TL)	45.481,19	46.303,87	30.000,00	41.082,42	+27

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Temizlik hizmeti alım giderleri	Muhtelif	16.965,45	Tamamlandı.
2	Taşı kiralaması giderleri	Muhtelif	12.221,39	Tamamlandı.
3	Büro makineleri alım giderleri	Muhtelif	7.897,74	Tamamlandı.
4	Kırtasiye alım giderleri	Muhtelif	3.997,84	Tamamlandı.
TOPLAM			41.082,42	

STRATEJİK HEDEF 4.4

Köy içi imar ve bayındırlık hizmetlerinin daha iyi standartlara kavuşturulmasına katkı sağlanacaktır.

Performans Hedefi:


Tanımı	YILLAR				
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedefften Sapma (%)
Küçük çaplı yatırım yapılan köy sayısı	300	293	150	160	+7

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Köy içi imar altyapısını düzeltmek üzere harcanan kaynak miktarı (TL)	1.645.647,01	1.290.400,00	1.031.000,00	950.250,00	92

Değerlendirme:

- ✓ Köy yardımları, küçük çaplı imar hizmetlerini kapsamaktadır. Böylece, küçük ölçekli hizmetlerin, mahallinde karşılanması sağlanarak, para ve zaman tasarrufu yapılmaktadır. Köy yardımları, etkinliği ve kontrol mekanizması iyi sağlandığı takdirde, hizmetin en az maliyetle yapılmasını sağlayan etkin bir yöntemdir. 2010 yılında en yüksek seviyesine ulaşan kaynak miktarı, bu yıldan itibaren hem köy sayısı ve hem de kaynak miktarı olarak azalma eğilime girmiştir.

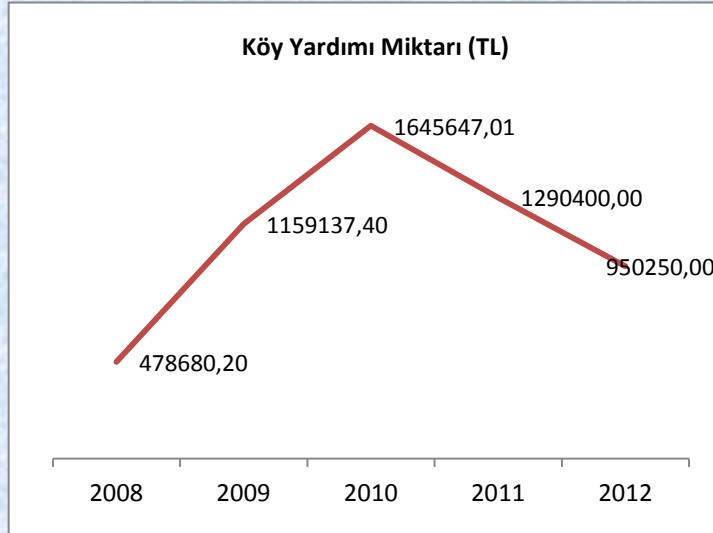

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (Adet)	Kaynak	İşin durumu	
Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Merkez: Acıpınar, Alan, Aluç, Avşarağzı, Aydoğdu, Bağbaşı, Bakışlı, Ballıdere, Beşören, Boyalı, Bula, Büyükbağlar, Çamağzı, Çamaltı, Çamdere, Çamlık, Çatalkaya, Çerçi, Çubuklu, Daylıhacı, Dedeli, Dereagzı, Derekışla, Dodurga, Döllük, Ekincilik, Fırındere, GOP, Gözova, Güğümlü, Gülpınar, Günçalı, Güzeldere, Hanpınar, Hasanbaba, Kabakboğazı, Kabatepe, Kadıvakfı, Keşlik, Kılıçlı, Kızılköy, Kızılöz, Kocacık, Kömeç, Küçükbağlar, Mülk, Nebiköy, Ormanbeyli, Ortaören, Pınarlı, Semerci, Sevindik, Söngüt, Şenköy, Tahtuba, Uğrak, Ulaş, Yakacık, Yatmış, Yazıbaşı, Yelpe, Yeşilyurt	62	436,000.00	Tamamlandı.	

Uygulayan Birim: ALMUS İLÇE ÖZEL İDARELE MÜDÜRLÜĞÜ				
S.No Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (Adet)	Kaynak	İşin durumu	
Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Çiftlik, Çamköy, Oğulbey, Üçgöl	4	18,000.00	Tamamlandı.	

Uygulayan Birim: ARTOVA İLÇE ÖZEL İDARELE MÜDÜRLÜĞÜ

S.No Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (Adet)	Kaynak	İşin durumu
Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Ağmusa, Boyunpınar, Salur, Ulusulu, Yukarıgüçlü	5	16,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: ERBAA İLÇE ÖZEL İDARELE MÜDÜRLÜĞÜ

S.No Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (Adet)	Kaynak	İşin durumu
Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Ağcakeçi, Bağpınar, Çakır, Demirtaş, Doğanıyurt, Eryaba, Hacpazarı, Kale, Kozlu, Salkımören, Tosunlar, Yaylalı	12	47,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: NİKSAR İLÇE ÖZEL İDARELE MÜDÜRLÜĞÜ

S.No Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (Adet)	Kaynak	İşin durumu
Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Dalkaya, Eryaba Aşağı ve Yukarı Mah., Gündüklü, Güzelyayla, Hanyeri, Haydarbey, Hüseyingazi, Kapağızı M.A.Mah, Kaşıkçı, Mahmudiye, Mercimekdüzü, Ormancık, Tepeyatak, Terzioğlu, Yeşilhisar	15	65,500.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: PAZAR İLÇE ÖZEL İDARELE MÜDÜRLÜĞÜ

S.No Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (Adet)	Kaynak	İşin durumu
Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Beşevler, Çayköy, Ocaklı, Ovayurt, Taşlık	5	28,000.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: REŞADİYE İLÇE ÖZEL İDARELE MÜDÜRLÜĞÜ

S.No Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (Adet)	Kaynak	İşin durumu
Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Bağdatlı, Çakırlı, Çakmak, Çambalı, Çat, Çavuşbeyli, Dolay, Güzeldere, Hebullü, İslamlı, Kabalı, Karataş, Keteniği, Kuyucak, Muratkaya, Özlüce, Sarıayla, Tozanlı fındıcak, Umurca, Yağsiyan, Yenituraç	21	97,500.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: SULUSARAY İLÇE ÖZEL İDARELE MÜDÜRLÜĞÜ

S.No Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (Adet)	Kaynak	İşin durumu
Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı Alpudere, Arpacıkaraçay, Balıkhisar, Ballıkaya, Belpınar, Buğdaylı, Çime, Ilıca, Sarıyaprak, Selimiye	10	85,750.00	Tamamlandı.

Uygulayan Birim: TURHAL İLÇE ÖZEL İDARELE MÜDÜRLÜĞÜ

S.No Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (Adet)	Kaynak	İşin durumu
-------------------------------	----------------------	--------	-------------

Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı • Çamlıca, Elalmış, Necip, Tatlıcak	4	69,500.00	Tamamlandı.
--	---	-----------	-------------

Uygulayan Birim: YEŞİLYURT İLÇE ÖZEL İDARELE MÜDÜRLÜĞÜ

S.No Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (Adet)	Kaynak	İşin durumu
-------------------------------	----------------------	--------	-------------

Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı • Doğanca, Doğlacık, Gündoğan, Kavunluk, Yeniköy	5	25,000.00	Tamamlandı.
---	---	-----------	-------------

Uygulayan Birim: ZİLE İLÇE ÖZEL İDARELE MÜDÜRLÜĞÜ

S.No Proje veya Faaliyet İsmi	Yerleşim Yeri (Adet)	Kaynak	İşin durumu
-------------------------------	----------------------	--------	-------------

Yerleşim yeri imar (cami, cem evi, mezarlık, köy konağı, yol düzenleme, parke yapımı, küçük çaplı içme suyu ve sulama suyu tesisi, sağlık ocağı, okul onarımı vb.) yapımı • Akdoğan, Ayvalı, Boldacı, Çayır, Çayıroluğu, Çeltek, Gölcük, Kazılı, Korucak, Kurupınar, Olukman, Turgutalp, Uzunöz, Üçköy, Yopalak, Yaraş, Yünlü	17	62,000.00	Tamamlandı.
--	----	-----------	-------------

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2012 YILI
FAALİYET RAPORU**

**EĞİTİM, GENÇLİK VE
SPOR
HİZMETLERİ**



STRATEJİK AMAÇ 1

EĞİTİM KURUMLARINDA GELİŞMİŞ ÜLKELER DÜZEYİNDE BİR EĞİTİM ALT YAPISI VE ÇEVRE DÜZENİ OLUŞTURMAK.

STRATEJİK HEDEF 1.1

Okul öncesinde tüm öğrencilerin okullaşabilmesi için, il genelinde 5 yıl içerisinde toplam 15 adet anaokulu yapılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.2

İlköğretim tüm okullarında sınıf bazında azami 30 öğrenci standardını yakalamak.

STRATEJİK HEDEF 1.3

Ortaöğretimde tüm okullarda sınıf bazında azami 30 öğrenci standardını devam ettirmek.

STRATEJİK HEDEF 1.4

Kırsal kesimdeki öğrencilerin eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri amacıyla, 2011–2015 yılları içerisinde 6 adet yeni yurt faaliyete geçirilecektir.

STRATEJİK HEDEF 1.5

Okullarımız engelli öğrencilerin eğitimlerini rahatlıkla devam ettireceği ortamlara dönüştürülebilmesi amacıyla; 2011–2015 yılları içerisinde, Yatırım Programı doğrultusunda okullarda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Yapılan anaokulu sayısı	5	2	2	2	100
2	İlköğretimde yapılan derslik sayısı	34	10	68	48	71
3	Ortaöğretimde yapılan derslik sayısı	24	24	60	0	0
4	Yapılan yurt ve pansiyon sayısı	0	0	2	2	100
5	Engelli öğrencilere yönelik yapılan çalışma sayısı	-	-	-	123	-
6	Harcanan Kaynak Miktarı (TL)	4.378.121,00	4.155.208,34	16.425.000,00	9.951.000,00	61



Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi (ANAOKULU)	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Anaokulu yapım sayısı	2	697.000,00	Tamamlandı.
2	İlköğretimde yapılan derslik sayısı	48	3.395.000,00	Tamamlandı.
3	Ortaöğretimde yapılan derslik sayısı	0	0	
4	Yurt ve pansiyon yapım sayısı	2	5.309.000,00	Tamamlandı.
5	Engelli öğrencilere yönelik yapılan çalışma sayısı	123	110.000,00	Tamamlandı.
TOPLAM			9.951.000,00	

Değerlendirme:

- ✓ Okul öncesi eğitim ve yurt-pansiyon yapımına yönelik olarak 2012 yılı için belirlenen hedef yakalanmıştır. İki adet anaokulu ve iki adet yurt-pansiyon yapımı gerçekleştirilmiştir. Okul öncesi eğitimde harcanılan kaynak miktarında azalma yaşanmıştır.
- ✓ İlk ve ortaöğretimde; yıllar içerisinde uygulamalar ve harcamalarda çok farklılıklar yaşanmıştır. Özellikle ilköğretimde 2009 yılından itibaren azalmaya başlayan derslik yapımı 2012 yılında tekrar artmıştır. Orta öğretimde ise azalma devam etmiş ve 2012 yılında herhangi bir derslik yapımı gerçekleşmemiştir. Bu uygulamalar; İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün programı doğrultusunda devam etmektedir.
- ✓ Okulların engelli öğrencilere göre düzenlenmesine yönelik hedefler ağırlık kazanmaya başlamış olup, konu ile ilgili olarak, 2012 yılında da önemli düzeyde çalışma gerçekleştirilmiştir.

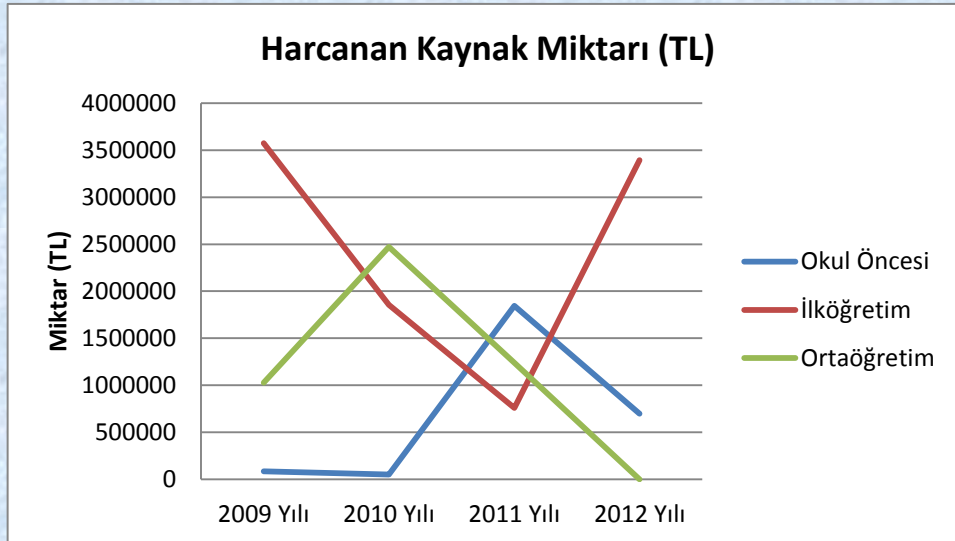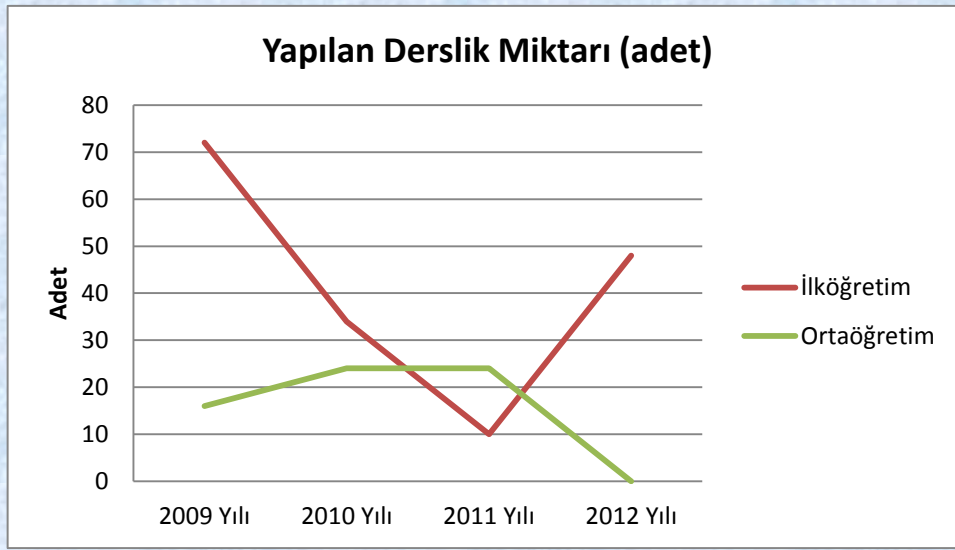

STRATEJİK HEDEF 1.6

Okul ve kurumlarımızın ders ve laboratuvar araç-gereçleri, akıllı tahta ve diğer donanım malzemesi ihtiyaçlarını, öğretim programlarına ve teknolojik gelişmelere uygun olarak karşılanmasına yönelik olarak; 2011-2015 yılları içerisinde, il genelindeki sınıfların % 60'ının teknolojik düzeyi artırılacaktır.

Hedef; Fatih projesi kapsamında gerçekleştirileceğinden dolayı, bu aşamada herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmeyecektir.

STRATEJİK HEDEF 1.7

İlk ve ortaöğretim kurumlarının bakım-onarım ihtiyaçları her yıl belirlenen duruma göre yapılacaktır.

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Bakım onarım yapılan ilköğretim ve orta öğretim kurumu sayısı	154	70	92	56	61
2	Bakım onarım giderleri için harcanan kaynak miktarı (TL)	3.468.733,35	3.303.514,14	5.000.000,00	4.141.000,00	83


Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Okul Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Okul bakım-onarım, çevre düzenleme, doğal gaz vb. faaliyetlerin yapımı - İlköğretimde bakım-onarım işleri - Ortaöğretimde bakım-onarım - Doğalgaza dönüştürülen okul - Okullarda deprem güçlendirmesinin yapılması	56	4.141.000,00	Tamamlandı.
2	Okullara mefruşat alımı	-	1.042.491,00	Tamamlandı.
3	Tüketime yönelik mal ve hizmet alımı	-	6.863.414,00	Tamamlandı.
4	Menkul , Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri	-	148.055,00	Tamamlandı.
			12.194.960,00	

Değerlendirme:

- ✓ Bakım onarıma ayrılan kaynak miktarı 2010 yılında maksimum miktarına ulaşmış ve 2010 yılından itibaren yavaş da olsa bir azalmaya başlamıştır. Bakım-onarım miktarının azalması ve kabul edilebilir düzeye gelmesi olumlu bir durumdur.

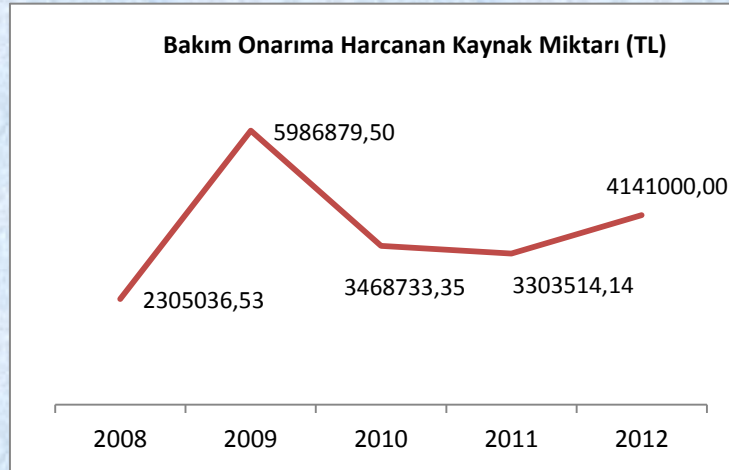

STRATEJİK HEDEF 1.8

Kırsal alanda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılabilmesi amacıyla; kapalı olan köy okul binalarının, köy konağı, okuma odası, sosyal tesis olarak düzenlenmesi, okul bahçelerinin ise gençlerin spor yapabileceği alanlara dönüştürülmesi sağlanacaktır. Bu amaçla 2011-2015 yılları içerisinde toplam 50 adet tesiste gerekli düzenleme çalışmaları yapılacaktır.

Hedef ile ilgili herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir.

STRATEJİK AMAÇ 2

EĞİTİM KURUMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN SPOR YAPABİLECEĞİ OKUL SPOR TESİSLERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER SEVİYESİNE ÇIKARTILACAKTIR.

STRATEJİK HEDEF 2.1

Eğitim kurumlarına ve öğrenci yurtlarına yakın bölgelerde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak amacıyla; 2011–2015 yılları içerisinde toplam 10 adet spor salonu hizmete açılacaktır.

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Yapılan spor tesisi sayısı	0	1	3	1	33
2	Yapılan spor tesisi için harcanan kaynak miktarı(TL)	0,00	810.925,00	3.000.000,00	81.774,00	3

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Sayısı	Kaynak	İşin durumu
1	Spor tesisi yapımı	1	81.774,00	Tamamlandı
TOPLAM		1	81.774,00	

Değerlendirme:

- ✓ 2012 yılı için belirlenen miktar kadar ödenek ayrılmamış ve planlanan spor tesisi sayısına ulaşamamıştır. Milli Eğitim Müdürlüğünün programı doğrultusunda faaliyetler sürdürülmektedir.

STRATEJİK AMAÇ 3

TÜM TOKAT HALKINA HİZMET SUNABİLECEK SPOR TESİSLERİNİ İNŞA ETMEK VE İŞLERLİĞİNİ SAĞLAMAK.

STRATEJİK HEDEF 3.1

2011–2015 yılları içerisinde, İlimize 12 adet yeni spor tesisi yapılması sağlanacak; İlimizdeki lisanslı sporcu sayısı 20000’e, tescilli spor kulübü sayısı 75’e, milli sporcu sayısı ise 35’e çıkartılacaktır.

Performans Göstergeleri:


S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Yeni yapılan tesis sayısı	0	1	3	0 (2 iş devam ediyor)	0
2	Bakım onarım yapılan tesis sayısı	muhtelif	7	10	12	120
3	Spor tesisleri yapım ve bakım onarım için harcanan kaynak miktarı	677.022,33	1.043.785,53	6.000.000,00	1.362.853,78	23

Uygulayan Birim : GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	BAŞÇİFTLİK SPOR SALONU YAPIMI	1	455.654,52	Son hakediş yapılacak.
2	ARTOVA SPOR SALONU YAPIMI	1	521.434,20	Devam Ediyor
3	SPOR TESİSİ BAKIM	12	289.942,64	Tamamlandı
4	ARAÇ ALIM	1	45.901,99	Alındı
5	MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI	6	49.920,43	Tamamlandı
TOPLAM			1.362.853,78	

Değerlendirme:

- ✓ Spor tesisi yapımı, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün programları doğrultusunda yürütülmektedir. 2012 yılı için belirlenen hedefler tam olarak yakalanamamıştır. Bununla birlikte 2 adet spor salonunun yapımı devam etmektedir. Hedefin yakalanamamasında, bu iki spor salonu yapımının tamamlanamaması etkili olmuştur.
- ✓ Spor tesislerinin yapım ve bakım onarımına harcanan kaynak miktarı, son dört yıl için devamlı artış göstermiştir.

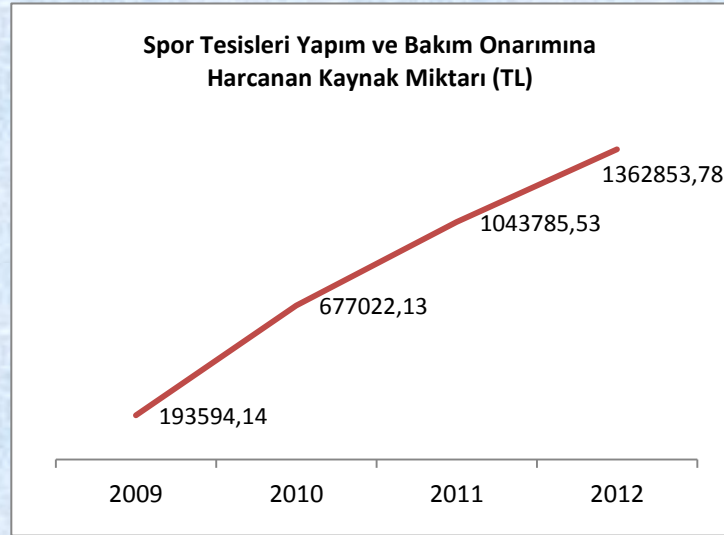

STRATEJİK AMAÇ 4

GENÇLERİMİZİ SPORTİF EĞİTİM VE FAALİYETLERE YÖNLENDİREREK, DAHA SAĞLIKLI VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK BİR NESİL YETİŞTİRİLMESİNE KATKIDA BULUNMAK.

STRATEJİK HEDEF 4.1

Tokat Merkez ve İlçelerimiz Gençlik Merkezlerine katkı sağlanarak İlimiz gençliğinin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımının artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Gençlik merkezine yapılan katkı miktarı (TL)	123,649.44	294,739.91	270.000,00	154.740,51	57

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Gençlik eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılan giderler	Muhtelif	47.964,64	Tamamlandı.
2	Tüketime yönelik malzeme alımları	Muhtelif	106.775,87	Tamamlandı.
TOPLAM			154.740,51	

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2012 YILI
FAALİYET RAPORU**

TARIMSAL HİZMETLER



STRATEJİK AMAÇ 1

TARIMSAL ÜRETİM VE HAYVANCILIK GELİRİNİ ARTIRMAK.

STRATEJİK HEDEF 1.1

Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.2

Örtü altı tarımının geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.3

Yem bitkileri yetiştiriciliğinde (Macar fiği, yonca, korunga, silajlık mısır), sertifikalı tohumluk kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.9

2011-2015 yılları arasında, tarımsal ve hayvansal üretimi geliştirmeye yönelik olarak, yetiştirici ve üreticilere ait 100 adet projenin hayata geçirilmesine katkı sağlanacaktır.

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Yukarıda belirlenen hedeflerle ilgili gerçekleştirilen proje sayısı	14	9	24	10	42
2	Harcanan kaynak miktarı (TL)	425.000,00	1.123.914,14	855.000,00	409.198,10	48

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

S.No Proje veya Faaliyet İsmi Miktarı Kaynak İşin durumu

1	Organik Tarımı Geliştirme Projesi	Muhtelif	9.735,00	Tamamlandı
2	Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi	Muhtelif	119.371,64	Tamamlandı
3	Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi.	Muhtelif	139.241,34	Tamamlandı
7	Meyveciliği Geliştirme Projesi	Muhtelif	66.000,00	Tamamlandı
8	Süt Soğutma Tankı, Süt Güğümü Alımı	Muhtelif	34.869,00	Tamamlandı
9	İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne malzeme alımı	Muhtelif	17.368,89	Tamamlandı
10	Selektör alımı	Muhtelif	16.992,00	Tamamlandı
11	İlan Giderleri için	Muhtelif	5.620,23	Tamamlandı
TOPLAM			409.198,10	

Değerlendirme:

- ✓ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Tokat tarım ve hayvancılığının geliştirilmesi amaçlı projeler karşılığında, İdareimiz tarafından yapılan destek miktarı; 2011 yılı hariç yatay bir seyir izlemektedir. 2011 yılında destek miktarının yüksekliği, örtü altı tarımının geliştirilmesine yönelik olarak, seracılığa yönelik bir projenin uygulanmasından ileri gelmektedir. Bununla birlikte hedeflenen proje miktarına ulaşılamamıştır. Önümüzdeki yıllarda hedeflenen projelerin belirlenmesinde (Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlanmasında), İl Özel İdaresinin katılımı daha üst düzeyde sağlanmalı ve hedeflerin daha yüksek düzeyde yakalanmasına gayret gösterilmelidir.

STRATEJİK HEDEF 1.4

Tokat ilinde tüplü fidan üretimini gerçekleştirilerek, yeni bir üretim modeli olarak yeni bağ tesislerinde tüplü fidanlar kullanılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.5

Tokat İlinde sebze tarımının geliştirilmesi kapsamında, bazı sebzelerde araştırma ve survey çalışmaları yürütülecektir.

STRATEJİK HEDEF 1.6

Tokat ilinde Bafra koyun ırkının yaygınlaştırılması amacıyla araştırma yürütülecektir.

STRATEJİK HEDEF 1.7

2011-2015 yılları arasında Tokat ili merkez ve ilçelerinde, en az 20 gıda işletmesine, hijyen ve işletme sanitasyonu hakkında eğitim verilecektir.

STRATEJİK HEDEF 1.8

Tokat ve yöresine uygun yemeklik, sanayilik ve çok amaçlı patates çeşitleri geliştirmek, Başçiftlik beyazı yerel patates çeşidinin ıslahı, meristem kültürüyle mini yumru üretimi yapmak

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Yukarıda belirlenen hedeflerle ilgili gerçekleştirilen proje sayısı	5	7	15	6	40
2	Harcanan kaynak miktarı (TL)	180.110,50	89.950,91	200.000,00	191.437,53	96

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim :GOP ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Tıbbi ve Aromatik Yeni Bir Bitki: Goji Beri (Lycium Barbarum L. Chinense) Kültüre Alınması ve Tokat Koşullarında Yetiştirilebilme Potansiyeli Üzerinde Bir Araştırma	1	7.892,75	Tamamlandı.
2	Patateste Yani Çeşit Geliştirme Projesi	1	19.119,47	Tamamlandı.
3	Bağcılığı Geliştirme Projesi	1	119.174,71	Tamamlandı.
4	Tokat Yöresinde Domates, Biber ve Kavun Tarımının Geliştirilmesi	1	19.906,14	Tamamlandı.
5	Tokat Yöresinde Örnek Domates Kurutma Tesisi Geliştirilmesi	1	19.350,82	Tamamlandı.
6	Seçilmiş Bazı Aspir (Carthamus Tinctorius L.) Çeşit ve Hatlarının Tokat-Kazova Şartlarında Yazlık ve Kışlık Performanslarının Belirlenmesi	1	5.993,64	Tamamlandı.
TOPLAM			191.437,53	

Değerlendirme:

- ✓ GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesine, Tokat tarım ve hayvancılığının geliştirilmesi amaçlı projeler karşılığında, İdareimiz tarafından yapılan destek miktarı; yıllar içerisinde farklılıklar göstermektedir. En yüksek miktarına 2012 yılı itibariyle ulaşılmıştır. Bununla birlikte hedeflenen proje miktarına ulaşamamıştır. Önümüzdeki yıllarda hedeflenen projelerin belirlenmesinde (Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlanmasında), İl Özel İdaresinin katılımı daha üst düzeyde sağlanmalı ve hedeflerin daha yüksek düzeyde yakalanmasına gayret gösterilmelidir.

STRATEJİK AMAÇ 2

İNSAN, HAYVAN VE BİTKİ SAĞLIĞINI KORUMAK.

STRATEJİK HEDEF 2.1

Boş ilaç kutu ve ambalajlarının toplatılma projesi kapsamında; yılda 30 adet yayım projesi uygulanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 2.2

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında, yılda 30 adet yayım projesi yapılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 2.3

Yabani domuzlarla mücadele programı kapsamında, yılda 40 köyde faaliyet yürütülerek, domuz zararını % 80 oranında azaltmak.

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Yukarıda belirlenen hedeflerle ilgili gerçekleştirilen proje sayısı	3	3	2	3	67
2	Harcanan kaynak miktarı (TL)	49.449,33	51.658,97	70.000,00	100.900,76	144

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

S.No Proje veya Faaliyet İsmi		Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Yabani Domuzlarla ilgili Av Fişerği Alımı Projesi	Muhtelif	20.000,14	Tamamlandı
2	Acil Gıda Güvenliği	Muhtelif	74.430,62	Tamamlandı
3	Hayvan Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele Projesi	Muhtelif	6.470,00	Tamamlandı
	TOPLAM		100.900,76	

Değerlendirme:

- ✓ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, insan, hayvan ve bitki sağlığının koruma amaçlı projeler karşılığında, İdareimiz tarafından yapılan destek miktarı; son üç yılda devamlı artmıştır. Bununla birlikte hedeflenen proje miktarına ulaşılammıştır. Önümüzdeki yıllarda hedeflenen projelerin belirlenmesinde (Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlanmasında), İl Özel İdaresinin katılımı daha üst düzeyde sağlanmalı ve hedeflerin daha yüksek düzeyde yakalanmasına gayret gösterilmelidir.

STRATEJİK AMAÇ 3

TARIMSAL ÜRETİMDE TOPRAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRICI VE MINIMUM GİRDİ (GÜBRE, SU, İLAÇ VB) KULLANIMINI SAĞLAYICI YÖNTEMLERİ ARTIRMAK.

STRATEJİK HEDEF 3.1

Tokat yöresi arazilerinin detaylı etüt ve haritalanması yapılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 3.2

Aşırı ve yetersiz gübre uygulamalarının önlenmesi sonucunda, topraktaki mevcut besin elementleri arasındaki dengenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, toprak analizlerine dayalı olarak gübre kullanımının artırılmasına yönelik olarak; 2011-2015 dönemi içerisinde toplam 32500 adet toprak numunesinin analizini gerçekleştirilecektir.

STRATEJİK HEDEF 3.3

Tokat İli sultanır tarım alanlarında damla sulama sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla, 2011-2015 dönemi içerisinde, toplam 27 adet köyde, 1350 adet çiftçiye, damla sulama eğitimi verilecektir.

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Yukarıda belirlenen hedeflerle ilgili gerçekleştirilen proje sayısı	1	1	1	1	100
2	Harcanan kaynak miktarı (TL)	30.000,00	20.000,00	20.000,00	16.995,54	85

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : ORTA KARADENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Hidrolik Geçirgenlik Seti Alımı	1 adet	16.995,54	Tamamlandı
	TOPLAM		16.995,54	

Değerlendirme:

- ✓ Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğüne, Tokat tarımının geliştirilmesi amaçlı projeler karşılığında, İdareміz tarafından yapılan destek miktarı; 2012 yılı hariç yatay seyir izlemiştir. 2012 yılında toprak analizi yapımına yönelik destek sağlanmamış fakat toprak laboratuvarı ihtiyacı olan cihaz alımı gerçekleştirilmiştir. Stratejik plan ile belirlenen diğer hedeflerin birçoğuna kaynak ayrılmamıştır. Bu sebepten dolayı; Önümüzdeki yıllarda hedeflenen projelerin belirlenmesinde (Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlanmasında), İl Özel İdaresinin katılımı daha üst düzeyde sağlanmalı ve hedeflerin daha yüksek düzeyde yakalanmasına gayret gösterilmelidir.

STRATEJİK AMAÇ

TÜM TARIM ALANLARINA YETERLİ OLABİLECEK SU KAPASİTESİ OLUŞTURULARAK; ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ SU KULLANIMI PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE, TÜM TARIM ALANLARINA SULAMA TESİSİ İNŞA EDİLECEKTİR.

STRATEJİK HEDEF 4.1

Sulama suyu kapasitesinin artırılması amacıyla her yıl 2 adet sulama göleti yapımı gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi:

Tanımı	YILLAR				
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
İşletmeye açılan gölet tesisi sayısı	1 (1 adet onarım)	2 (2 adet onarım)	-	1 (1 adet gölet temizleme)	0

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedefe ulaşma (%)
1	Hazırlanan proje sayısı (adet)	1	2	4	4	100
2	Gölet yapım ve onarımlarında harcanan kaynak miktarı (TL)	147.503,00	1.232.091,00	880.000,00	1.592.124,28	181

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-KHGB
BAŞKANLIĞI

S.No Proje veya Faaliyet İsmi

Proje
Sayısı


Kaynak

İşin durumu

1	Merkez/GOP Göleti		332.128,01	İş devam ediyor.
2	Almus/Çevreli Göleti Yapımı		1.210.857,41	İş devam ediyor.
3	Merkez/Ormanbeyli Göleti Temizlenmesi	1	49.138,86	İş Bitti.
TOPLAM		1	1,592,124.28	

Değerlendirme:

- ✓ Son üç yıldır yeni açılan bir gölet bulunmamaktadır. Bununla birlikte son üç yıldır devamlı artan bir kaynak kullanımı mevcuttur. Bunun sebebi inşa halinde gölet yatırımlarının bulunmasıdır. Önümüzdeki yıllarda bu göletlerin hizmete girmesi sağlanacaktır. Özellikle Almus/Çevreli Göleti oldukça yüksek kapasiteli (1.5 milyon m³) bir projedir. Tamamlandığında önemli bir alanı sulamaya kavuşturacaktır.

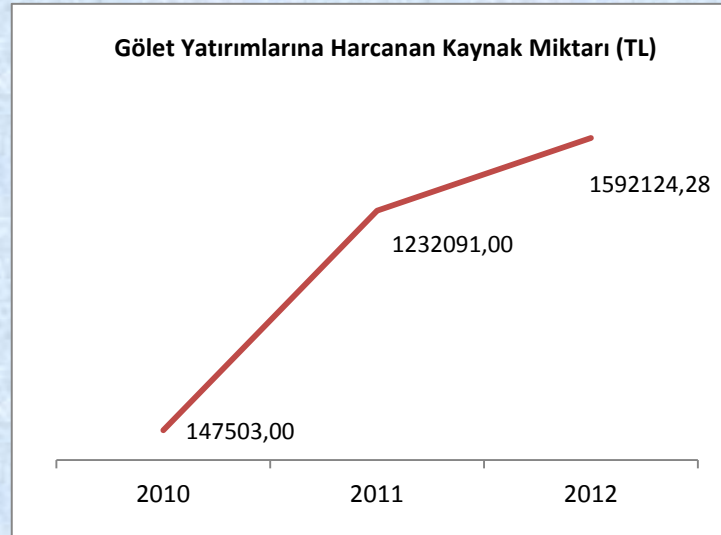

STRATEJİK HEDEF 4.2

Sulama suyu ihtiyacı, yüzey suyu ile karşılanamayan yörelerde, yapılacak yer altı suyu sulama kuyuları ile yılda 150 m³/h ekstra sulama suyu kapasitesi elde edilecektir.

Performans Hedefi:

Tanımı	YILLAR				
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
İşletmeye alınan sulama suyu kapasitesi miktarı (m ³ /h)	72	378	450	576	+28

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedefe ulaşma (%)
1	Hazırlanan I. ve II. Aşama rapor sayısı	-	0	2	0	0
2	Açılan yer altı suyu kuyusu sayısı	2	9	2	0	0
3	İşletmeye alınan yer altı suyu kuyusu sayısı	2	3	6	4	67

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ-TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Zile/Göçenli 1 adet yer altı sulama kuyusu kapasitesi (m ³ /h)	18	Maliyet, sulama projeleri kısmında yazılıdır.	İşlemeye alınmadı.
2	Turhal/Tatlıcak 1 adet yer altı sulama kuyusu kapasitesi (m ³ /h)	180		İşlemeye alındı.
3	Turhal/Kayaören 1 adet yer altı sulama kuyusu kapasitesi (m ³ /h)	72		İşlemeye alındı.
4	Turhal/Gümüştop 1 adet yer altı sulama kuyusu kapasitesi (m ³ /h)	144		İşlemeye alındı.
5	Erbaa/Kale 1 adet yer altı sulama kuyusu kapasitesi (m ³ /h)	180		İşlemeye alındı.

Değerlendirme:

- ✓ 2012 yılı, 2011 yılında açılan kuyuların, bazılarının işletmeye alındığı bir yıl olmuştur. 2012 yılında yeni sulama kuyusu açılmamıştır. Son yıllarda kuyu açımında yapılan yeni uygulama; yer altı suyu sulama kuyusu açımının, Kurum tarafından gerçekleştirilmesi (DSİ izni kapsamında) ve işletme ruhsatının bu şekilde DSİ tarafından verilmesidir. Geçmişte yapılan uygulama, Kurum tarafından raporlama (I.ve II.Aşama) işlemlerinin yapılması ve kuyu ile ilgili tüm işlemlerin ise DSİ tarafından gerçekleştirilmesi şeklinde olmuştur. Bu yöntem hala kullanılmakta olup süreç olarak oldukça ağır işlemektedir. 2011 yılında DSİ tarafından da bir kuyu açımı Kurumumuza bildirilmemiştir. Bu sebepten dolayıdır ki I.ve II.Aşama Rapor yazımı da gerçekleşmemiştir.
- ✓ 2012 yılında yıllık olarak belirlenen 450 m³/h ekstra sulama kapasitesi, % 28 aşılarak 576 m³/h olarak elde edilmiştir. Stratejik plan ile beş yıl için belirlenen 750 m³/h, iki yıllık miktar olan 954 m³/h ile şimdiden aşılmıştır.
- ✓ Yer altı sulama kuyuları ile çalıştırılacak tesislerin uygulamaya aktarılmasında; gerek işletme maliyeti ve gerekse yer altı su durumu açısından daha fazla dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu sebepten dolayı da, Stratejik Planlama sürecinde üzerinde daha fazla tartışılması gereken bir konu olarak değerlendirmeye alınmalıdır.

STRATEJİK HEDEF 4.3

2011-2015 yılları arasında, toplam 5500 ha alana hitap edebilecek sulama tesisi inşa edilecektir.

Performans Hedefi:



Tanımı	YILLAR				Hedeften Sapma (%)
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
Yapılan tesisler ile sulanan alan (ha)	1556	1300	1850	2760	+49

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Yapımı gerçekleştirilen açık kanal sulama suyu tesisi projesi sayısı (adet)	50	13	16	8	50
2	Açık kanal sulama tesisleri ile sulanan alan miktarı (ha)	449	131	350	563	161
3	Yapımı gerçekleştirilen kapalı sistem sulama suyu tesisi proje sayısı (adet)	12	37	33	25	75
4	Kapalı sistem sulama tesisleri ile sulanan alan miktarı (ha)	1107	1169	1500	2197	146
5	Sulama suyu tesisi yapımına yönelik yapılan harcama tutarı (TL)	4.177.829,67	3.506.196,09	2.730.000,00	3.235.249,73	118

Değerlendirme:

- ✓ 2011 yılında yapılması planlanan sulama alanının, % 49 üzerine çıkmıştır. Son üç yıllık verilere göre toplam 5616 ha alana su götürecek şekilde sulama tesisi yapılmıştır. Bu veriler ile Stratejik Planda belirlenen 5500 ha üç yılda aşılmıştır. Bunun en önemli gerekçesi, özellikle hibe programları vasıtasıyla yapılan kapalı sistem sulama tesisi projeleridir.
- ✓ Kurum, sulama tesislerinde kapalı sisteme ağırlığını son üç yıldır devam ettirmektedir. Açık sistem projelerinde azalma olmakla birlikte, 2012 yılında sulama alanında artış kaydedilmiştir. Bu durum projelerin hitap ettiği alanların arttığını göstermektedir.
- ✓ Projelerin, ortalama sulama alanına düşen maliyetinin; 2012 yılında oldukça düştüğü gözlemlenmektedir. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, açık sulama projelerinin daha fazla alana hitap eder şekilde yapılmasıdır. İkincisi ise 2011 yılında başlayıp, 2012 yılında biten büyük çaplı hibe projelerinin ödemelerinin önemli bir kısmının 2011 yılında yapılmış olmasından ileri gelmektedir. 2011 yılında bu projeler bitmediği için sulama alanı değerleri 2012 yılına yazılmıştır. Dört yıl için ortalama maliyet: 2271 TL/ha olarak ortaya çıkmaktadır.

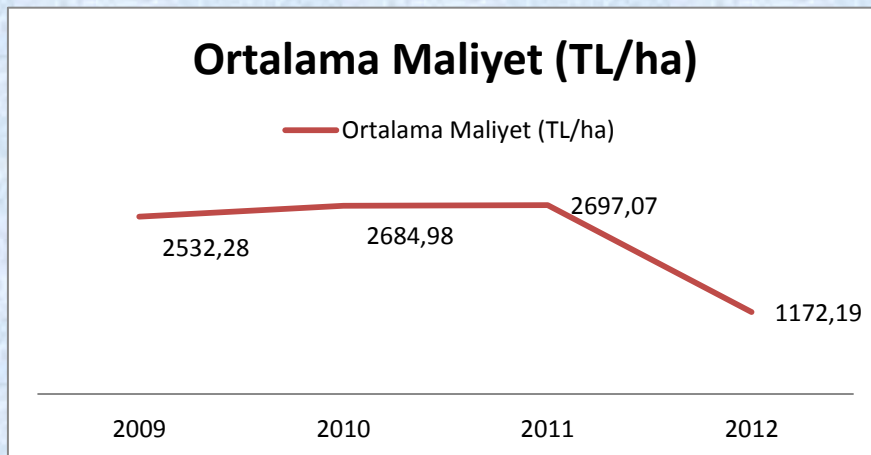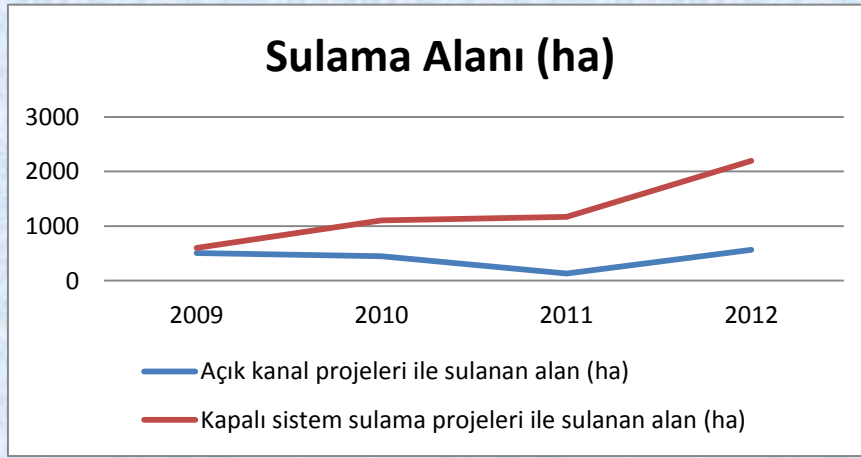

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ- İL ÖZEL İDARESİ MÜLGA PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ-KHGB BAŞKANLIĞI

S.No Proje veya Faaliyet İsmi	Sulama Alanı (ha)	Kaynak	İşin durumu
-------------------------------	-------------------	--------	-------------

1	Zile/Kazıklı, Yenidağıçı, Çayıroğlu S.S.T. (2 Proje)	Açık Kanal	30	89.528,25	Tamamlandı.
2	Merkez/Kızık S.S.T.	Açık Kanal	100	100.215,80	Tamamlandı.
3	Merkez/Aluç Bakım-Onarım	Açık Kanal	33	37.500,85	Tamamlandı.
4	Turhal/Bağlarpınarı S.S.T.	Açık Kanal	25	81.192,12	Tamamlandı.
5	Sulusaray/Alanyurt S.S.T.	Açık Kanal	150	54.710,78	Tamamlandı.
6	Almus/Ormandibi S.S.T.	Açık Kanal	25	127.862,30	Tamamlandı.
7	Erbaa/Alacabal, Ballıbağ, Güveçli S.S.T. (3 Proje)	Açık Kanal	100	24.631,73	Tamamlandı.
8	Zile/Yapalak S.S.T.	Açık Kanal	100	55.755,76	Tamamlandı.
TOPLAM			563	571.397,59	

Uygulayan Birim: İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ- İL ÖZEL İDARESİ MÜLGA PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ-KHGB BAŞKANLIĞI

S.No Proje veya Faaliyet İsmi	Sulama Alanı (ha)	Kaynak	İşin durumu
-------------------------------	-------------------	--------	-------------

1	Merkez/İhsaniye, Beşören, Uğrak S.S.T. Tamamlama (3 Proje)	Kapalı Sistem	50	126.509,26	Tamamlandı.
2	Niksar/Tepeyatak, Örenler S.S.T. (2 Proje)	Kapalı Sistem	10	0.00	Tamamlandı.
3	Zile/Söğütözü Yağmurlama S.S.T.	Kapalı Sistem	30	56,237.17	Tamamlandı.
4	Yeşilyurt/Karagöz Gölüalan Köyü Karadere Mah. S.S.T.	Kapalı Sistem	100	152.949,65	Tamamlandı.
5	Turhal/Kızılkayası, Gümüştop YAS Tamamlama S.S.T. (2 Proje)	Kapalı Sistem	160	122.012,80	Tamamlandı.
6	Merkez/Derekışla, Dedeli, Çamağzı S.S.T. (3 Proje)	Kapalı Sistem	30	86.114,83	Tamamlandı.
7	Niksar/Kapıağzı, Asar S.S.T. (2 Proje)	Kapalı Sistem	70	114.454,35	Tamamlandı.
8	Başçiftlik/Hatıpli S.S.T.	Kapalı Sistem	100	95.832,53	Tamamlandı.
9	Turhal/Yağlıalan S.S.T.	Kapalı Sistem	10	62.185,58	Tamamlandı.
10	Merkez/Kadıvakfı Bakım-Onarım S.S.T.	Kapalı Sistem	10	57.683,54	Tamamlandı.
11	Turhal/Tatlıcak YAS S.S.T.	Kapalı Sistem	80	174.422,08	Tamamlandı.
12	Reşadiye/Darıderesi İdris Mah. S.S.T.	Kapalı Sistem	100	126.259,95	Tamamlandı.

13	Merkez/Yazıbaşı, Efeköy S.S.T. (2 Proje)	Kapalı Sistem	50	61.129,10	Tamamlandı.
14	Turhal/Kayaören YAS S.S.T.	Kapalı Sistem	50	129.491,30	Tamamlandı.
15	Zile/Göçenli YAS S.S.T.	Kapalı Sistem	-	63.047,57	İş devam ediyor.
16	Artova/İğdir, Çelikli S.S.T.	Kapalı Sistem	50	36.188,13	Tamamlandı.
17	Turhal/Gümüştop Pompaj Projesi E.M.P. Grubu Alımı	Kapalı Sistem	-	0,00	Tamamlandı.
18	Merkez/Çat S.S.T. (Hibe Programı) (2011 Yılından devam eden iş)	Kapalı Sistem	200	81.826,34*	Tamamlandı.
19	Merkez/Çamaltı S.S.T. (Hibe Programı) (2011 Yılından devam eden iş)	Kapalı Sistem	300	62.007,92*	Tamamlandı.
20	Merkez/Yayladalı S.S.T. (Hibe Programı) (2011 Yılından devam eden iş)	Kapalı Sistem	300	240.800,68*	Tamamlandı.
21	Niksar/Gökçeli S.S.T. (Hibe Programı) (2011 Yılından devam eden iş)	Kapalı Sistem	100	196.816,12*	Tamamlandı.
22	Zile/Hacılar YAS S.S.T. (Hibe Programı) (2011 Yılından devam eden iş)	Kapalı Sistem	100	69.768,94*	Tamamlandı.
23	Erbaa/Kale YAS S.S.T. (2011 Yılından devam eden iş)	Kapalı Sistem	65	233.933,23	Tamamlandı.
24	Zile/Emirdolu III.Kısım, Büyüközlü I.Kısım S.S.T. (2 Proje)	Kapalı Sistem	85	133.320,99	Tamamlandı.
25	Merkez/Ortaören-Niksar/Arpaören YAS S.S.T. (2 Proje)	Kapalı Sistem	67	116.524,00	Tamamlandı.
26	Merkez/Kabatepe YAS S.S.T.	Kapalı Sistem	80	64.336,08	Tamamlandı.
TOPLAM			2197	2.663.852,14	

* Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı 6. Etap Hibe Programı kapsamında yapılan projelerdir. Kaynak miktarı; Tokat İl Özel İdaresi tarafından karşılanan, toplam proje maliyetinin % 25'dir.

STRATEJİK AMAÇ 5

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA YATIRIMLARINDA, DEVAM ETMEKTE OLAN PROJELER KURUMUMUZ TARAFINDAN, BÜTÇESİ TARIM BAKANLIĞINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE TAMAMLANACAK OLUP; BUNDAN SONRA YAPILACAK ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI TARIM BAKANLIĞI İLE KOORDİNELİ OLARAK, TARIM BAKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

STRATEJİK HEDEF 5.1

Niksar ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin, % 20 sinin toplulaştırması tamamlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	YILLAR				
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Niksar ovasında toplulaştırma tamamlanma oranı (%)	6,00	7,00	20,00	8,00	-60

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedefe ulaşma (%)
1	Tokat/Niksar-Hacılı, Çengelli, Korulu ve Ormancık köyleri toplulaştırma projesi tamamlanma oranı (%)	75	77	100	85	85
2	Uygulanan toplulaştırma projelerine harcanan kaynak miktarı (TL)	881.348,00	590.614,00	1.700.000,00	1.278.527,01	75

STRATEJİK HEDEF 5.2

Erbaa ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin, % 100'ünün toplulaştırması tamamlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	YILLAR				
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Erbaa ovasında toplulaştırma tamamlanma oranı (%)	86,00	88,00	97,00	90,00	-7

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedefe ulaşma (%)
1	Tokat/Erbaa - Değirmenli, Hacıpazar, Aş.Yk. Çandır, Evyaba 2.Kısım toplulaştırma projesinin tamamlanma oranı (%)	80	81	100	82	82
2	Tokat/Erbaa – Karayaka toplulaştırma projesinin yapımının tamamlanma oranı (%)	65	78	100	79	79
3	Uygulanan toplulaştırma projelerine harcanan kaynak miktarı (TL)	2.805.932,00	2.745.291,00	5.285.000,00	811.513,41	15

STRATEJİK HEDEF 5.3

Zile ovasında toplulaştırma yapılabilecek arazilerin, % 26' sının toplulaştırması tamamlanacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	YILLAR				
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedefften Sapma (%)
Zile ovasında toplulaştırma tamamlanma oranı (%)	23,00	23,00	26,00	23,00	-11

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedefe ulaşma (%)
1	Tokat/Zile - Özyurt toplulaştırma projesinin tamamlanma oranı (%)	62	62	100	62	62
2	Tokat/Zile – Güzelbeyli (Temecik) 2. Kısım toplulaştırma projesinin tamamlanma oranı (%)	100				
3	Uygulanan toplulaştırma projelerine harcanan kaynak miktarı (TL)	140.630,00	0,00	1.250.000,00	209.444,84	17

Değerlendirme:

- ✓ Tarımsal faaliyetlerin ve alt yapı yatırımlarının etkinliğinin artırılmasında, en önemli yatırım projeleri olarak yer alan toplulaştırma faaliyetleri, son yıllarda ki ödenek problemleri sayesinde istenilen hedeflere ulaşamamıştır. Tokat İli Türkiye’de toplulaştırma yatırımlarının en iyi olduğu birkaç ilden bir tanesidir. Tamamlanmayı bekleyen birçok yatırımı bulunmaktadır. Tarım Bakanlığı, devam eden bu projelerin ödeneğini sağlamaktadır. 2010 yılından itibaren beklenen kadar olmasa da önemli bir miktar yatırım gerçekleşmiştir. 2012 yılı içerisinde toplam 2.299.484,42 TL ödenek harcanmıştır. En yüksek yatırım ise Niksar Ovasında gerçekleşmiştir.

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2012 YILI
FAALİYET RAPORU**

**SANAYİ VE TİCARET
HİZMETLERİ**



STRATEJİK AMAÇ 1

TOKAT İLİNİ, EKONOMİK KAYNAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİREBİLEN, DIŞ DÜNYA İLE ENTEGRE OLMUŞ BİR SANAYİ VE TİCARET YAPISINA KAVUŞTURMAK.

STRATEJİK HEDEF 1.1

İl sanayi ve ticari faaliyetlerine yönelik olarak; çeşitli bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine destek sağlanacaktır.

Hedef ile ilgili olarak, İl Özel İdaresi tarafından herhangi bir kaynak aktarımı sağlanmamıştır.

STRATEJİK HEDEF 1.2

İl sanayi ve ticari faaliyetlerine yönelik olarak; çeşitli fuar, etkinlik ve organizasyonlara destek sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Düzenlenen kurs sayısı	-	7		9	
2	Organizasyonlara katılan kursiyer sayısı	-	210		300	
3	Harcanan kaynak miktarı (TL)	-	28.555,00		34.157,00	

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: **İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ-TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	KOSGEB Bilgilendirme Toplantıları • Almus/Esnaf ve Sanatkarlar Odası • Artova Halk Eğitim Müdürlüğü • Başçıftlık Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü (2 Kurs) • Sulusaray Halk Eğitim Müdürlüğü • Reşadiye Kaymakamlığı • Turhal Kaymakamlığı Turhal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi • Yeşilyurt Kaymakamlığı • Zile Kaymakamlığı	9	34.157,00	Tamamlandı.

Değerlendirme:

- ✓ Girişimciliğin geliştirilmesi yönelik olarak KOSGEB bilgilendirme toplantılarına destek sağlanmıştır. Kurs programları kapsamında 9 adet kurs düzenlenmiş ve 300 kişi bilgilendirilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 1.3

Tüketici bilinçlendirme faaliyetlerine destek sağlanacaktır.

Hedef ile ilgili olarak, İl Özel İdaresi tarafından herhangi bir kaynak aktarımı sağlanmamıştır.

STRATEJİK HEDEF 1.4

Tokat İli ile özdeşleşen, coğrafi işaret ve yöresel ürünlerin tescilin yapılması sağlanacaktır.

Hedef ile ilgili olarak, İl Özel İdaresi tarafından herhangi bir kaynak aktarımı sağlanmamıştır.

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2012 YILI
FAALİYET RAPORU**



**RUHSAT VE DENETİM
HİZMETLERİ**

STRATEJİK AMAÇ 1

İLİMİZ YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARINDAN ELDE EDİLEN ÜRETİMİ, KAYNAKLARINI GELECEK NESİLLERE TAŞIMA VE ÇEVREYE DUYARLI BİR ANLAYIŞ İÇERİSİNDE ARTIRMAK.

STRATEJİK HEDEF 1.1

Kum-çakıl ve taş ocaklarının tamamının yıl içerisinde denetimi yapılacaktır. Ruhsatlandırmalar; çevre, imar, tarihi ve kültürel değerler açısından gerekli şartların sağlanmasına yönelik projelendirmeler ve nakliye güzergâhlarının korunmasına yönelik alınacak tedbirler doğrultusunda yapılacaktır.

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Faaliyette olan kum-çakıl ocağı sayısı	13	12	-	20	
2	Faaliyette bulunan maden ocağı sayısı		62	-	71	
3	GSM ve Sıhhi Müessese ruhsatı verilen işletme sayısı	52	73	-	46	
4	Verilen yapı ruhsatı sayısı	7	11	-	29	
5	Verilen yapı kullanma ve yapı izin belge sayısı	2	248	-	362	
6	Verilen su kiralama sayısı	28	27	-	29	
7	Verilen su kaynağı kiralama sayısı	4	4	-	4	

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Müessese Miktarı Adet	Kaynak	İşin durumu
------	--------------------------	-----------------------------	--------	-------------

1	1.Sınıf GSM Ruhsatı Verilmesi - Güvenal Gaz (LPG Dolum Tüp) - Aytaç Gıda Tar. - İnte İnşaat(Tıbbi Atık)	3	İdari Giderler	Tamamlandı.
2	2.Sınıf GSM Ruhsatı Verilmesi - Ant İnş.Mad.San.Ltd.Şti. - Seferoğulları Akaryakıt - ARK İnşaat - Cenesizler - Özdemir Antimuan - Erkan ŞAHİNOĞLU - Niksar Enerji Sant.Ltd Şti - BER-ER - Tokat Erdem Hazır Beton - NİMSAN - Boğazbaşı Petrol - NİBAŞ - DSİ 7.Bölge - Nimsan - Bensu - Özdemir Antimuan - Akhel inş. - Elit Hancı Petrol - Erektaş Tur.Sey.San.Tic.Ltd.Şti. - Zeynep ŞEN - Cangözler San. Tic. Ltd. şti - Bahçebaşı TKK - Özdemir Antimuan - Adoçim - Öz Aydınlar	24	İdari Giderler	Tamamlandı.

	- Pem Enerji A.Ş. - Tatbak Gıda - Mehmet AYDIN - Astek Tekel Ürünleri			
3	3.Sınıf GSM Ruhsatı Verilmesi - Erbaa TKK - Dökmetepe TKK)	2	İdari Giderler	Tamamlandı.
4	3.Sınıf Sıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi - Özaydınlar Petrol - Ayşe SOLMAZ - Kifayet ACAR - Şaban KIŞLA - Necati ÖZDEMİR - Murat ÖZER - Aydın FIRTINA - Bünyamin TOSUN - Keşkekler Petrol - Keşkekler Petrol - Sait BABÜRHAN - Ekrem İŞERİ - Osman İŞLER - Ahmet Yalçın - Yalçın TAŞ - Gökdere Acar Petrol - Cangözler San Tic Şti	17	İdari Giderler	Tamamlandı.
5	Yapı Ruhsatları - Selahattin GÜRER - Ömer AYALAN - Kemal DOĞANYILDI - Yıldırım ÇAKMAK - Naturel Tarım - Bektaş AKTAŞ - Rüstem KAYA - Yücel BOLAT - Erdoğan YILDIRIM	29	İdari Giderler	Tamamlandı.

	• Ali ARSLAN • Dilek GÜNER • BENSU • Şehri KATEKE • Şehri KATEKE • Benli Köy Tüzel Kişiliği • Sezai UÇAK • Alan Köy Tüzel Kişiliği • Bekir DUMAN • İsmail TUNA • Ayşe AKBAŞ • Satiye BOZKURT • Özbucak Gıda Tarım • Özbucak Gıda Tarım • Özbucak Gıda Tarım • Özbucak Gıda Tarım • Akçansa Beton Sanayi • Ümmüye Pusat YILMAZ • Şerife AKGÜL • Bedrettin AKDENİZ			
6	Yapı Kullanma ve Yapı İzin Belgesi • Mithat AYBEK • Niksar HES • Şehri KATEKE • Bensus • Maliye Hazinesi • Katı Atık Yönetim Birliği • Katı Atık Yönetim Birliği • Bektaş AKTAŞ • Ayşe AKBAŞ • Dursun DARAKÇI • Şehri KATEKE • Yapı izni verilen köy sayısı: 351 adet	362	İdari Giderler	Tamamlandı.
7	İl geneli maden ocağı ruhsatı • Akiktaş	71	İdari Giderler	Tamamlandı.

	• Almen Mermer • Almen Mermer -2 • Almer Mermer-3 • Alternatif Mermer • Antek Mad.Lld.Şt. • Aryıl Madencilik • As Mermer Lld.Şt. • Ataç Tarım Ltd Şti • Atılğan Yeşil Oniks • Bayraktaroğlu • Birdal Mermer • Çanbensan A.Ş • Çenesizler A,Ş • Çenesizler A,Ş • Çenesizler A,Ş • Dilşat San Tic Ltd Şti • Doğansoy Mermer • Emek İnş • Erbaa Hazır Beton • Erbaa Toprak San • Erdal Ayyıldız • Fimar • Gökmer Mermer • Günsayıl • Güzeldal Mermercilik • Hayati Sevinç • Heltan • İlik Mermer • Kaptan İnş • Karakaya Bentonit • Karakaya Bentonit • Karakaya Bentonit • Karayolları 16.Böl, Müd. • Karmen Mad. • Kasım Kaş • Kasım Kaş • Mehmet Akyüz • Mer-Mera Ltd Şti			
--	--	--	--	--

	• Mikro Maden • Murat Okkan • Nimsan A.Ş • Nimsan A.Ş • Öntaş • Öz-Apsa • Özdemir Antimuna • Samaş • Sms Made. • Unmertaş • Unmertaş • Veli Menekşe • Yılmaz Gelebür • Ekrem Sansar • Tokat Erdem Beton • Erhan Şahinoğlu • Arki İnş.Müh. • Akhel İnşxşti • Adoçim • Karaçan Kum Eleme • Dks Bakır Krm.Mad. • Erkar İnş.Tah.Şti. • Çevreli Bel. • Cevat Atılğan • Karahan Ökseloğlu • Fatih Aldemir • Özak İnşaat Şti • Servet Cansever • Petma Mermer Şti • İçtaş İnşaat San Tic • Uğur Çağlayan • Arslan Dalğış			
8	Su kiralaması (Alabalık Üretim Tesisleri) yapan firma veya şahıslar: • Ali YILMAZ • Osman ÇALAŞ -Yeloğlu Tarım (devir) • Satılmış LEYLEK • Akbal İnşaat Hay.Ltd.Şti.	29	İdari Giderler	Tamamlandı.

	• Hayri GÖNÜLTAŞ • İbrahim OKTAR • Yılmaz ALPOĞLU • Mustafa KOÇ • Halil ERYILMAZ • Kazım ENGİN • Ümit BALCI • Emine DEMİRCİ • Talip ZARALI • Tokel Balık. Çevre Gıd. Tur.İnş.Tic.San.Ltd.Şti. • Burhan ÖZBARUTÇU • Üzümlören Belediyesi • Mustafa ÖĞÜD • Gölada tur.Su Ür.Peyz. Prj.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. • Mustafa ALTINOK • Ersu Su Ürünleri Üretim ve Pazarlama • Mustafa Kürşat ALPOĞLU • Yayla GÜNDOĞAN • Kenan DEMİR • Tokel Balık. Çevre Gıd. Tur.İnş.Tic.San. Ltd.Şti. • Kürşat ALPOĞLU • Ali YILMAZ • Tokel Balık. Çevre Tur.İnş.Tic.San.Ltd.Şti. • Ayhan DİLMEK • Baki PEKER			
9	Su kaynağı kiralaması yapan firma veya şahıslar: • Niksar Karabodur Kaynak Suyu (Niksar Belediyesi) • Erbaa Gökal Kaynak Suyu (Zekariya İZAN) • Almus Çevreli Kaynak Suyu (Çevreli Belediyesi) • Batmantaş köyü kaynak suyu (Bensu Kaynak Suyu)	4	İdari Giderler	Tamamlandı.
10	Jeotermal Kaynak Suları (5686 sayılı Jeotermal KaynaklıDoğal Mineralli sular kanununa göre) • Niksar Karabodur Kaynak Suyu (Niksar Belediyesi) • Erbaa Gökal Kaynak Suyu (Zekariya İZAN) • Almus Çevreli Kaynak Suyu (Çevreli Belediyesi) • Batmantaş köyü kaynak suyu (Bensu Kaynak Suyu)	4	İdari Giderler	Tamamlandı.

STRATEJİK AMAÇ 1

KURUM GÖREV ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN HARİTA İMAR HİZMETLERİNİ MODERN BİR HİZMET ANLAYIŞI ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK.

STRATEJİK HEDEF 2.1

2015 yılı sonuna kadar köy yerleşik alan sınır tespiti yapılmayan köy kalmayacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	YILLAR				
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedekten Sapma (%)
Köy yerleşik alan sınırı tespit edilen köy oranı (%)	57	63	69	71	+3

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Köy yerleşik alan sınır tespiti yapılan köy sayısı	45	35	46	61	133
2	Yapılan ifraz (bölme) işlemi sayısı	14	19	-	26	
3	Yapılan tevhid (birleştirme) işlemi sayısı	4	6	-	18	
4	Hazırlanan hâlihazır haritalar ve mevzi imar planı sayısı	6	6	-	4	

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Yapılan ifraz (bölme) işlemi : • Mekrek Alan Köyü • Zile Saraç Köyü Fırtınan Mezrası • Merkez Ortaören Köyü • Turhal Tatlıcak köyü • Turhal Kalaycık • Erbaa Doğanyurt • Reşadiye Yeşilyurt • Niksar Gökçeoluk • Sulusaray Belpınar köyü • Turhal Çivril köyü • Yeşilyurt Çırdak • Turhal Kalaycık • Zile Küçük karayün köyü • Niksar Özdemir köyü • Zile-Yenidağıçi • Niksar- Şeyhler • Merkez-Kızılköy • Reşadiye Yeşilyurt • Reşadiye- Sazak • Merkez-Küçükbağlar • Reşadiye-Uğurlu • Reşadiye-Sazak • Turhal-Ayranpınar • Turhal-Ayranpınar • Almus-Gebeli • Reşadiye-Altıparmak	26	İdari Giderler	Tamamlandı.

2	Yapılan tevhid (birleştirme) işlemi : • Niksar Abdalköy • Zile Çayır • Turhal Sütüce • Niksar Günlüce • Zile Üçkaya • Turhal Necip • Erbaa Yaylacık • Merkez Dereağzı • Pazar Menteşe • Zile Hacılar köyü • Yeşilyurt Karacaören köyü • Niksar Abdalkolu • Erbaa Tandırlı • Merkez Ulaş • Reşadiye İbrahimşeyh • Merkez Kömeç • Niksar-Korulu • Sulusaray-Belpınar	18	İdari Giderler	Tamamlandı.
3	Hazırlanan hâlihazır haritalar ve mevzi imar planı : • Turhal Kızılkaya Hayvancılık Tesisi • Turhal Necip Hayvancılık Tesisi • Reşadiye İbrahim şeyh Hayvancılık Tesisi • Merkez Kömeç Hayvancılık Tesisi	4	İdari Giderler	Tamamlandı.
4	Köy yerleşik alan plan sınırı tespiti : • Almus: Çilhane, Dereköy, Alan Merkez Mah., Alan Taşlıtarla Mah., Aşağı Alan Mah., Alan Köyü Güven Mah., Alan Köyü Kendigelen Mah., Arısu Köyü Merkez Mah., Arısu Köyü Çayırli Mah., Arısu Köyü Altıdam Mah., Çiftlik, Çiftlik Köyü Kamışlık Mah., Çamköy Merkez Mah., Çamköy Bağlıca Mah., Çamköy Budaklı Mah., Çamköy Uğurlu Mah., Yeşilalan, Gebeli, Çayönü, Sarıören , Hubyar Köyü Merkez Mah., Hubyar Köyü Bekülü	61	İdari Giderler	Tamamlandı.

	Mah., Kapıcı, Çambulak • Başçiftlik : Sariağıl • Erbaa : Pınarbeyli, Pınarbeyli Köyü Alan Mah. • Niksar: Mezra, Kapıağı Köyü Merkez Mah., Kapıağı Köyü Derlen Mah., Kapıağı Köyü Madiller Mah., Kapıağı Köyü Camii Mah., Kapıağı Köyü Uzunoğlu Mah., Kapıağı Köyü Eskiköy Mah., Şeyhler Köyü Aygünler Mah., İslamlı • Reşadiye: Yeşilyurt Köyü Merkez Mah., Yeşilyurt Köyü Yumurcakaş Mah., Yeşilyurt Köyü Yoğurtluca Mah., Sazak Köyü Haydarlar Mah., Sazak Köyü Yenikent Mah., Sazak Köyü Yerlice Mah., Dolay, Uğurlu, Karşıkent • Sulusaray : Alpudere • Yeşilyurt: Karaoluk • Zile: Yeşilce, Kaşıpınar, Ağıcık			
--	---	--	--	--

Değerlendirme:

- ✓ İl genelinde köy yerleşik alan sınırları belirlenen köy sayısı, toplam köy sayısının % 71'ine ulaşılmıştır. Bu rakam hedeflenen oranın % 3 üzerinde olduğunu göstermektedir. Stratejik Plan ile belirlenen, “2015 yılı sonuna kadar tüm köylerin yerleşik alan sınırlarının belirlenmesi hedefi” yakalanabilecektir. Köy yerleşik alan sınırının tespit edilmesinde, öncelikle talepler karşılanmakta olup, bunun dışında ise belli bir sıra dâhilinde devam edilmektedir. 2012 yılında belirlenen hedefin, % 33 üzerinde bir performans gösterilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 2.2

Köy içi imar ve ruhsatlandırma faaliyetlerinin, daha düzenli ve etkin hale getirilebilmesi amacıyla; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili olarak, tüm köy muhtarlığının bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Değerlendirme:

- ✓ Köylerin ruhsatlandırma işlemleri ile ilgili bilgilendirilmeleri; toplantılar, afiş ve ilanlar 2011 yılında yapılmış olmasından dolayı, 2012 yılında yapılmamıştır.

STRATEJİK HEDEF 2.3

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, “Tokat İli Çevre Düzeni Planı” yeniden değerlendirilerek 2015 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.

- ✓ İl Çevre Düzeni Planı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacağı için herhangi bir faaliyet gerçekleşmemiştir.

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2012 YILI
FAALİYET RAPORU**

**SAĞLIK
HİZMETLERİ**



STRATEJİK AMAÇ 1

TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİNDE YAŞAYAN İNSANLARA İLK SAĞLIK MÜDAHELESİNİN YAPILABİLECEĞİ VE RAHATLIKLA ULAŞILABİLECEK, SAĞLIK TESİSLERİ İNŞAA EDİLECEK VE DÜZENLİ ÇALIŞMALARI SAĞLANACAKTIR.

STRATEJİK HEDEF 1.1

Sağlık hizmetin etkin bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla, yılda 2 adet yeni sağlık tesisi yapımı ile 11 adet sağlık tesisinin bakım-onarımı yapılacaktır.

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Yeni yapılan sağlık tesisi sayısı	2	2	1	-	0
2	Bakım onarım yapılan sağlık tesisi sayısı	15	19	5	11	220
3	Sağlık altyapısı ve tıbbi cihaz alımı için harcanan kaynak miktarı (TL)	8.219.654,85	24.895.890,89	110.000,00	199.710,00	181

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Tokat Merkez ve İlçelerinde Bulunan Sağlık Evi (Almus/Bakımlı, Merkez/Kızılköy, Ormanbeyli, Erbaa/Hacıpazarı, Yeşilyurt/Çıkrık, Niksar/Şahinli) Bakım Onarım İşi	6	112.700,00	Devam ediyor
2	Tokat Merkez/Yazıbaşı Köyü, Akın Köyü, Çubuklu Köyü Sağlık Evi Onarım İşi	3	27.210,00	Devam ediyor
3	Tokat Merkez/Keşlik Köyü Sağlık Evi Onarım İşi	1	19.900,00	Devam ediyor
4	Tokat Zile/Küçüközlü Köyü Sağlık Evi Onarım İşi	1	39.900,00	Devam ediyor
TOPLAM			199.710,00	

Değerlendirme:

- ✓ 2012 Yılı içerisinde, yeni bir sağlık tesisi yapımına yönelik bir faaliyet gerçekleşmemiştir. Bu tür yatırımlar Sağlık İl Müdürlüğünün programı doğrultusunda Bakanlık kaynakları ile yapılmaktadır.
- ✓ Sağlık tesislerinin bakım- onarım ihtiyaçları, İl sağlık Müdürlüğü programı kapsamında yapılmaktadır. Belirlenen hedeflerin üzerinde bir bakım-onarım hizmeti gerçekleştirilmiştir.

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2012 YILI
FAALİYET RAPORU**

**KÜLTÜR VE TURİZM
HİZMETLERİ**



STRATEJİK AMAÇ 1

TOKAT İLİNDEKİ TARİHİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK MEKÂNLARI KORUMAK, GELİŞTİRMEK VE TANITIMINI YAPARAK TURİZME KAZANDIRMAK.

STRATEJİK HEDEF 1.1

2011 yılının sonuna kadar, somut olmayan kültürel mirasların envanteri çıkarılacak ve koruma amaçlı imar planı hazırlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.2

Tokat genelinde 5 adet kazı çalışması yapılacaktır.

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Kazı çalışmaları yapılan proje sayısı	1	1	3	1	-67
2	Harcanan kaynak miktarı (TL)	50.827,76	117.583,00	320.000,00	99.448,31	31

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Gümenek (Komana Pantika) Antik Şehrinde kazı yapılması	1	99,448.31	
TOPLAM		1	99,448.31	

Değerlendirme:

✓ Kazı çalışmaları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün programı doğrultusunda, Bakanlıktan gelen kaynaklar ile yapılmaktadır. 2012 yılında yapılan tek kazı çalışması olan, Gümenek Komana Kazısı ödeneği ise, İl Özel İdaresinin kaynakları ile gerçekleştirilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 1.3

İl genelinde muhtelif tarihi yapıların; bakım, onarım, restorasyon ve rekonstrüksiyonu yapılacaktır.

Performans Hedefi:

Tanımı	YILLAR				
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Bakım, onarım, restrasyon ve rekonstriksiyon yapılan proje sayısı	-	5	2	3	+50

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedefe ulaşma (%)
1	Bakım, onarım, restrasyon ve rekonstriksiyon yapılan proje sayısı	5	3	1	3	300
2	Harcanan kaynak miktarı (TL)	3.424.782,49	834.326,58	250.000,00	689.983,22	275

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Tokat Latifoğlu Konağı ikmal onarım ve teşhir-tanzim işi	1	14.190,67	Tamamlandı.
2	Tokat Bedesten, Arastanın teşhir-tanzim ve restorasyon yapımı	1	451.572,67	Tamamlandı.
3	Tokat Kültür Evi onarımı ve teşhir-tanzim işi	1	224.219,88	Tamamlandı.
TOPLAM		3	689.983,22	

Değerlendirme:

- ✓ Restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinde belirlenen hedefin üzerinde bir performans sergilenmiştir.

STRATEJİK HEDEF 1.4**Niksar Talazan Köprüsünün onarımı yapılacaktır.**

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

STRATEJİK HEDEF 1.5**2013 yılına kadar 112 adet sivil mimari örneği evlerin bulunduğu Bey hamam sokağı ve Sulusokak, sokak sağlıklılaştırmaları ve cephe giydirmeleri yapılacaktır.****Performans Göstergeleri:**

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Harcanan kaynak miktarı (TL)	387,851.10	11,780.77	-	-	

2012 yılı için herhangi bir hedef belirlenmemiş ve buna bağlı olarak da herhangi bir yatırım gerçekleştirilmemiştir.

STRATEJİK HEDEF 1.6

Şehrin turizm ve kültür hayatına katkısını artırmaya yönelik olarak; iyileştirme ve düzenleme çalışmalarını içeren muhtelif projeler hayata geçirilecektir.

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	İyileştirme ve düzenleme çalışmaları yapılan proje	1	2	2	1	+50
2	Harcanan kaynak miktarı (TL)	309.832,17	325.000,00	57.000,00	851.867,75	1494

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Yerleşim merkezlerinde, park, çevre düzenlemesi ve mesire alanı yapılması - Yeşilyurt Belediyesi (2 proje) - Gökçeli Beldesi (3 proje) - Serenli Beldesi (2 proje) - Tanoba Beldesi - Akça Beldesi - Gürçeşme Beldesi - Kuşcu Beldesi - Karayaka Beldesi - Yolkonak Beldesi - Emirseyit Beldesi - Çevreli Beldesi - Kemalpaşa Beldesi - Niksar Belediyesi (2 proje) - Bozçalı Beldesi - Günebakan Beldesi (2 proje)	1	851.867,75	Tamamlandı.
TOPLAM		1	851.867,75	

Değerlendirme:

- ✓ Şehir düzenlemelerinin hepsi bir proje olarak kabul edilmiştir. Bakanlıktan, beklenenden daha fazla ödenek sağlanmıştır. 15 belde ve ilçe belediyesinde toplam 21 proje uygulaması yapılmıştır.

STRATEJİK HEDEF 1.7

2012 yılı sonuna kadar, İldeki kaplıcaların geliştirilerek sağlık turizmine katkısını artırmaya yönelik olarak 2 adet proje hayata geçirilecektir.

Hedef ile ilgili olarak, İl Özel İdaresi tarafından herhangi bir kaynak aktarımı sağlanmamıştır.

STRATEJİK HEDEF 1.8

Kültür ve turizm varlıklarımızın daha bilinçli tanıtılması için sektördeki yönetici ve çalışanların geliştirilmesine yönelik turizm ile ilgili konularda il genelinde yılda en az 5 adet eğitim programı düzenlenecektir.

Hedef ile ilgili olarak, İl Özel İdaresi tarafından herhangi bir kaynak aktarımı sağlanmamıştır.

STRATEJİK HEDEF 1.9

İldeki göl, gölet, dere, ırmak, nehir, baraj çevreleri ve turizme uygun yaylaların değerlendirilerek turizme kazandırılması amacıyla muhtelif projeler hayata geçirilecektir.

Performans Hedefi:

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Göl, dere, ırmak ve yayla gibi yerleri turizme kazandırmak amaçlı uygulanan proje sayısı	-	2	1	1	100
2	Harcanan kaynak miktarı (TL)	-	1.042.997,55	1.400.000,00	1.471.190,12	105

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: İL ÖZEL İDARESİ - İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ - KHGB BAŞKANLIĞI

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Gümenek Mesire Alanı Rekreasyon Projesi (OKA Destekli)	1	1.471.190,12 (548.788,94 TL'si Hibe)	İş Bitti.
TOPLAM		1	1.471.190,12	

Değerlendirme:

- ✓ Son yıllarda özellikle; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projelerde artışlar yaşanmaktadır. Bu projeler, hem turizm açısından ve hem de çevre açısından önem taşımaktadır. Bu tip projelerin artarak devam etmesi, yöremizde yer alan çok sayıdaki tabiat güzelliklerin insanlar tarafından paylaşılmasına ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte, bu tip projelere hibe katkısının sağlanabilmesi, projelerin İdareye çok fazla yük getirmeden tamamlanmasını sağlamaktadır.

STRATEJİK HEDEF 1.10

2013 yılı sonuna kadar, Şehir genelinde bir gezi parkuru oluşturulacak ve ziyaret edilmesi gereken tüm kültürel ve turistik yerlere asılması için tanıtım levhaları hazırlanacaktır.

Hedef ile ilgili olarak, İl Özel İdaresi tarafından herhangi bir kaynak aktarımı sağlanmamıştır.

STRATEJİK HEDEF 1.11

Tokat İli'nin yöresel kültürünü yansıtan zanaat ve ürünlerin yaşatılmasına yönelik 4 adet proje hayata geçirilecektir.

STRATEJİK HEDEF 1.12

2011 yılı içerisinde, Tarih, Kültür ve Doğa şehri Tokat'ı marka kimliğinin oluşturulması ve konumlandırılması çalışmaları yapılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.13

Tokat ilinin kültürel geçmişi üzerine geniş bir bilgi kaynağı oluşturmaya yönelik 11 adet yayın ve tanıtım materyali hazırlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.14

Tokat İli'nin tanıtımına ve kültürel birikimlerin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak her yıl, etkinlik ve organizasyon düzenlenecek ve çeşitli organizasyonlara etkinlik ile katılım sağlanacaktır.

1.11 Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Yukarıda belirlenen hedefler için harcanan kaynak miktarı (TL)	284.970,09	135.870,27	1.070.000,00	80.093,82	7

1.11 Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim: İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ - KHGB BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞI

S.No Proje veya Faaliyet İsmi Miktarı Kaynak İşin durumu

1	Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri - İstanbul EMITT Fuarı - Travel Turkey İzmir Fuarı - Mehmet Akif Ersoy Anma Programı - Müze Açılış Töreni	4	49.389,31	Tamamlandı.
2	Baskı ve Cilt Giderleri	muhtelif	9.962,74	Tamamlandı.
3	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	muhtelif	4.620,00	Tamamlandı.
4	Yayın Alım Giderleri	muhtelif	4.893,78	Tamamlandı.
5	İlan Giderleri	muhtelif	8.968,00	Tamamlandı.
6	Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu	muhtelif	2.259,99	Tamamlandı.
TOPLAM			80.093,82	

Değerlendirme:

- ✓ Tanıtıma yönelik hedefler, dış kaynak sağlanmasına yönelik hedefleme yapılmış fakat dış kaynaklı kaynak sağlamamıştır.

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2012 YILI
FAALİYET RAPORU**

**ÇEVRE KORUMA VE
DİNLENME
HİZMETLERİ**



STRATEJİK AMAÇ 1

İNSANLARA TEMİZ, YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK.

STRATEJİK HEDEF 1.1

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğal kaynakların korunması çevre ve insan sağlığı için; yapılmış olan kanalizasyon sistemine, 2011-2015 yılları içerisinde toplam 100 adet köyde doğal arıtma tesisi inşa edilerek, 2015 yılı sonuna kadar kanalizasyon tesislerinin % 28'ine doğal arıtma tesisi inşa edilecektir.

Performans Hedefi:

Tanımı	YILLAR				
	2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Doğal arıtma tesisi yapılan kanalizasyon tesisi oranı (Kümülatif Toplam) (%)	9	10	14	10	-40
Toplam Doğal Arıtma Tesisi Sayısı (Kümülatif Toplam)	46	50	62	50	-19

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	Hedefe ulaşma (%)
1	Yapılan doğal arıtma tesisi sayısı	2	5	12	0	0
2	Doğal arıtma tesisine yönelik harcanan kaynak miktarı (TL)	65.500,00	232.000,00	370.000,00	0,00	0

Değerlendirme:

- ✓ Doğal arıtma tesisleri, kanalizasyon tesislerinin yapımı ile birlikte, çevre açısından yapılması zaruri tesislerdir. Fakat konu ile ilgili yatırımlar bu güne kadar istenilen düzeyde gerçekleşmemiştir. Bunun en önemli sebebi, doğal arıtma tesislerinin çalışmasından yeterli verimin alınamamasıdır. Bu durum bu tesislerin yapımını engellemektedir. Konu ile ilgili problemler çözüldükten sonra bu tür yatırımların hızla gerçekleştirilmesi daha doğru olacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.2

Kırsal yerleşim birimlerinde, sosyal yaşamın geliştirilmesine yönelik olarak, çocuk oyun alanları inşa edilecektir.

2012 yılında konu ile ilgili bir kaynak aktarımı gerçekleşmemiştir.

STRATEJİK HEDEF 1.3

Kırsal yerleşim birimlerinde, daha temiz bir çevre oluşturulması amacıyla; çöp konteynırları alınacaktır.

2012 yılında konu ile ilgili bir kaynak aktarımı gerçekleşmemiştir.

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2012 YILI
FAALİYET RAPORU**

SOSYAL HİZMETLER



STRATEJİK AMAÇ 1

SOSYAL HİZMETLERDE AB STANDARTLARINDA BİR HİZMET ANLAYIŞI İÇERİSİNDE, SOSYAL YARDIMA İHTİYAÇ HİSSEDEN HERKESİN YANINDA YER ALINACAKTIR. TOPLUMUN HER KESİMİNİN ÜRETİME KATILIMI SAĞLANACAKTIR.

STRATEJİK HEDEF 1.1

Sosyal Hizmetler hizmet binalarının bakım-onarımı ile Kuruluşun ihtiyaçlarının teminine katkı sağlanacaktır.

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne harcanan kaynak miktarı (TL)	195,695.70	99,104.70	100,000.00	40.286,19	40
2	Türkiye Grameen Mikro Kredisini kapsamında yardım yapılan üye sayısı	1546	1546	-	1940	
3	Türkiye Grameen Mikro Kredisini kapsamında üyelere verilen kredi miktarı	1,321,752.00	2,060,222.00	-	2.730.207,00	
4	Türkiye Grameen Mikro Kredisine kapsamında İl Özel İdaresince ayrılan kaynak miktarı (TL)	120,000.00	120,000.00	-	245.000,00	

Projeler veya Faaliyetler:



Uygulayan Birim : İL AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜDÜRLÜĞÜ

S.No Proje veya Faaliyet İsmi Miktarı Kaynak İşin durumu

1	Demirbaş alımı	Muhtelif	11.146,39	Tamamlandı
2	Hizmet binası onarımı	Muhtelif	16.944,80	Tamamlandı
3	Makine teçhizat alımı	Muhtelif	12.195,00	Tamamlandı
TOPLAM			40.286,19	

Değerlendirme:

- ✓ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün hizmet binası onarımı ve teçhizat alımlarında kullanması için 2012 yılı için hedeflenen belirlenen ödeneğin, % 40'ı kadar bir kaynak sağlanmıştır. Söz konusu Müdürlüğe sağlanan kaynak 2010 yılından itibaren bir azalış sürecine girmiştir.
- ✓ Kurumumuz bünyesinde yürütülen, Türkiye Grameen Mikro Kredis Programı başarılı çalışmalar yürütmektedir. İstihdam artışına katkı sağlamak amacıyla, küçük çaplı fakat etkin faaliyetler yürütmektedir. Faaliyetlerinin başarısı, yıllar içerisinde ulaştıkları kapasite ile görülmektedir. Kurumumuzdan aldıkları yardım çok fazla olmamasına karşın, kredi verdikleri üye sayısında beş yılda 6.6 kat, verdikleri kredi miktarında ise 14 kat artış sağlanmıştır. Burada önemli nokta, insanlara iş kurması için verilen kaynağın, bir hibe olmamasıdır. Bir kredi programı olmasına rağmen, üye sayısında artış sağlanmakta ve kredi dönüşünde bir sıkıntı yaşanmamaktadır.



**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2012 YILI
FAALİYET RAPORU**

**GÜVENLİK VE
SAVUNMA HİZMETLERİ**



STRATEJİK AMAÇ 1

GÜVENLİK VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ; ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ, MODERN BİR YAPIYA KAVUŞTURULACAKTIR.

STRATEJİK HEDEF 1.2

Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları ve lojmanlarının 2015 yılı sonuna kadar bakım onarım işlerinin yapılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri:

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Güvenlik hizmetleri için harcanan kaynak miktarı (TL)	530.659,54	1.863.806,80	250.000,00	199.992,74	80

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
S.No	Proje veya Faaliyet Raporu	Miktarı	Kaynak	İşin Durumu
1	Kırtasiye Alımları	Muhtelif	25.301,75	Tamamlandı
2	Hizmet binalarının yakacak ihtiyacının karşılanması için yakacak alımı	Muhtelif	72.494,48	Tamamlandı
3	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Araç Gereç	Muhtelif	18.208,80	Tamamlandı
4	Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımı	Muhtelif	65.377,00	Tamamlandı
5	Muhtelif temizlik malzemeleri alımı	Muhtelif	13.083,25	Tamamlandı
6	Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları onarım işi	Muhtelif	5.527,12	Tamamlandı
TOPLAM			199.992,74	

STRATEJİK HEDEF 1.2**Sivil Savunma hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.****Performans Göstergeleri:**

S.No	İsmi	YILLAR				Hedefe ulaşma (%)
		2010 Gerçekleşme	2011 Gerçekleşme	2012 Hedef	2012 Gerçekleşme	
1	Sivil savunma hizmetleri için harcanan kaynak miktarı (TL)	97.587,00	236.787,63	510.000,00	461.815,96	91

Projeler veya Faaliyetler:

Uygulayan Birim : İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Proje veya Faaliyet İsmi	Miktarı	Kaynak	İşin durumu
1	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı	Muhtelif	71.658,89	Tamamlandı
2	Hizmet alımları	Muhtelif	28.148,87	Tamamlandı
3	Menkul Mal,G.maddi Hak Alım Bak.On.Gid	Muhtelif	52.482,72	Tamamlandı
4	Cari transferler	Muhtelif	40.000,00	Tamamlandı
5	Mamul mal alımları	Muhtelif	140.849,04	Tamamlandı
6	Gayri Maddi Hak Alımları (Sermaye Gid)	Muhtelif	15.493,40	Tamamlandı
7	Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri	Muhtelif	98.473,64	Tamamlandı
8	Diğer giderler (Yolluklar,vergi,posta v.b.)	Muhtelif	14.709,40	Tamamlandı
TOPLAM			461.815,96	

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2012 YILI
FAALİYET RAPORU**

İDARİ FAALİYETLER



**1. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ:**


S.No	İsmi	Katılan Personel Sayısı (Adet)	Süresi (gün)
1	e-içişleri Eğitimi	10	33
2	Çevre ve Sağlık Kom.Seminer	1	3
3	Eğt. Kültür ve Sos.Hiz.Eğt.	1	3
4	Mali Hizmet Müdürleri Eğt.VHB.	1	5
5	Encümen Müdürleri Eğitimi	1	4
6	Tarımsal Hiz.Müd.Eğitimi	1	4
7	İmar Mevzuatı Eğitimi	1	4
8	SGK Personel Bilgilerinin Sisteme Aktarılması	1	1
9	Teknik Personel Ulaşılabilirlik Eğt.	1	1
10	Kamu İhale Mev. (Mal ve Hizmet Alımı) Eğitimi	1	4
11	Mahalli İdareler Mali İstatistik Eğt. (Maliye Bak.)	2	8
12	Ruhsat Den.Mev.Eğt.Sem.VHB.	1	4
TOPLAM		22	74

PERSONEL HARCAMALARI:

S.No	İsmi	Katılan Personel Sayısı (Adet)	Harcanan Kaynak (TL)
------	------	--------------------------------	----------------------

ÖZEL İDARE PERSONEL GİDER BÜTÇESİ			
1	Memur harcamaları	63	2.574.235,65
2	İşçi harcamaları	38	5.059.739,38
TOPLAM		101	7.633.975,03
MÜLGA KHGM PERSONEL GİDER BÜTÇESİ			
1	Memur harcamaları	48	2.608.947,17
2	İşçi harcamaları	207	12.436.027,03
TOPLAM		255	15.044.974,20
GENEL TOPLAM		356	22.678.949,23

Not: Personel sayısı, 31.Aralık.2012 tarihindeki miktardır. Geçici işçiler 5 ay 29 gün çalışmaktadır.




ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Uygulayan Birim : ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Cinsi	Miktar (adet)
1	İl genel Meclisi Karar sayısı	150
2	İl Encümeni Karar sayısı	175

3. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜLGA PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALIMLAR:

S.No	Cinsi	Harcanan Ödenek (TL)
1	Akaryakıt ve Madeni Yağ (Merkez)	2.499.219,90
	Akaryakıt ve Madeni Yağ (KHGB)	1.385.000,00
2	Yedek parça ve servis ücreti işçiliği alımı	1.667.268,76
3	Araç kiralama	80,352.80
4	Otomobil ve iş makinası alımı	1.371.291.45
5	Diğer alımlar (mefruşat, haberleşme, büro malzemeleri, yakacak (kömür ve doğalgaz), elektrik, su, temizlik malzemesi, sigorta, ilan vb.)	1,544,515.65
TOPLAM		8,547,648.56

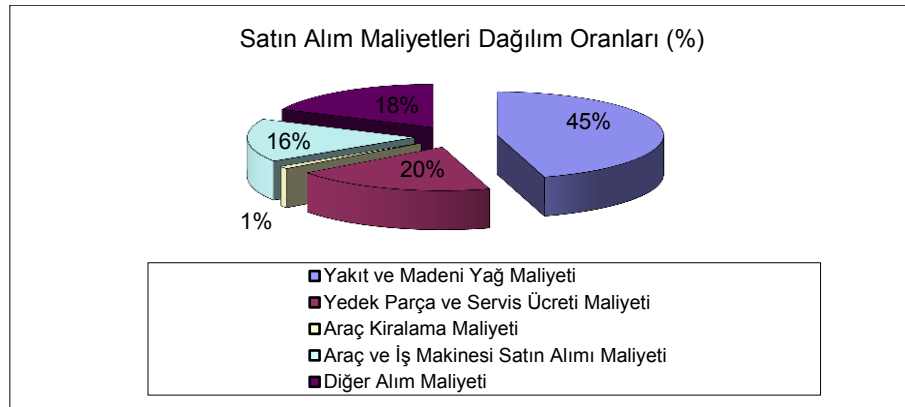

ATÖLYE FAALİYETLERİ:

S.No	Cinsi	Miktar (Adet)
1	İş makineleri için açılan iş emri sayısı	198
2	Binek araçları için açılan iş emri sayısı	50
3	Kamyonlar için açılan iş emri sayısı	343
TOPLAM		591
4	Arazide tamir yapılan araç (iş makinesi ve kamyon) sayısı	348

KİRALIK MAKİNE ÇALIŞTIRMA

S.No	Cinsi	Miktar	Alınan Kira Bedeli (TL)
1	İş Makinesi (Dozer, Greyder, Silindir, Motoscraper, Trayler)	13	15,741.64
TOPLAM			38,974.80

MAL ALIM İHALE FAALİYETLERİ:

S.No	Cinsi	Miktar (Adet)
1	Mal alım ihalesi Akaryakıt ürünleri ve madeni yağ alımı (3 adet) Kömür ve tutuşturucu odun alımı (2 adet) Yedek parça alımı (3 adet) Otomobil, pick-up ve iş makinaları alımı DMO (1 adet) Damper dorse alımı (1 adet) Muhtelif lastik alımı (3 adet)	13
2	Hizmet alım ihalesi - Araç kiralama (Minibüs, midibüs, pick-up ve otomobil) (2 adet) - Diğer hizmet alım (Zorunlu sigorta yaptırılması) (1 adet) - Güvenlik hizmet alımı (1 adet)	4
3	Doğrudan temin Küçük ölçekli yedek parça, işçilik, inşaat, elektrik, temizlik malzemesi vb. alımlardır.)	345
4	Avanslar	90
TOPLAM		452

4. YAPIM VE HİZMET ALIM İHALE FAALİYETLERİ:

S.No	Cinsi	Miktar (Adet)
1	MİLLİ EĞİTİM (İLKÖĞRETİM) • Tokat Merkez Büyükyıldız İlköğretim Okulu Deprem Tahkiki, Güçlendirme ve Onarım İnşaatı İşi • Tokat Merkez Karşıyaka Mahallesi 18 Derslikli Okul Çevre Tanzimi İşi • Zile İlçesi Atiye Bekir Dinçer Anaokulu Yapım İşi • Reşadiye Merkez Atatürk ve Bereketli İlköğretim Okulları Onarım İşi • Erbaa Merkez Bölücek (Yeni Mahalle) İlköğretim Okulu Kalorifer Kazan Dairesi ve Tesisatı Yapım İşi • Tokat Zübeyde Hanım Anaokulu Onarım- Niksar Ulvi Saime YİBO Onarım ve Doğalgaz Dönüşüm İşi • Turhal Ali şevki Erek YİBO Onarımı ve Hacılar İÖO Kalorifer Yapımı ve Bina Onarımı • Almus Çevreli Şehit Abdullah Eymür İ.Ö.O Anasınıfı Yapım İşi • Sulusaray Alanyurt İ.Ö.O. Kalorifer Tesisatı –Kazan Dairesi-WC Yapımı ve Ana Bina Onarım İşi • Niksar İlçesi Aydınlıkevler Anaokulu ve Ulucan İlköğretim Okulu Onarım İşi • Tokat İli Gözova Köyü İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı • Niksar İlçesi İsmet Kaya ÖZDEN YİBO Onarım İnşaatı İşi • Zile Merkez Fevzi Çakmak İ.Ö.O ve Şehit Ümit Günel İ.Ö.O. Onarım İşi • Erbaa Yuvam Anaokulu Ek Yemekhane Yapım İşi • Zile Ayvalı Köyü İ.Ö.O ve Zile Boldacı Köyü İ.Ö.O Kazan dairesi ve Kalorifer Tesisatları Yapım İşi • Tokat Merkez Günevi Mh. 18 Derslikli İ.Ö.O Yapım	22

	İşi • Tokat Merkez Halil Rıfat Paşa İlköğretim Okulu Doğalgaz Dönüşüm İşi • Tokat Turhal Hamide Köyü 12 Derslikli İ.Ö.O. İnşaatı Yapım İşi • Tokat Merkez Güryıldız 12 Derslikli İlk Öğretim Okulu İnşaatı Yapım İşi • Zile İlçesi Minare-i Sağır Mahallesi 12 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı • Tokat Merkez Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi Doğalgaz Dönüşüm İşi • Tokat Merkez 18 Mart İ.Ö.O. Doğalgaz Dönüşümü Yapım İşi	
2	MİLLÎ EĞİTİM (ORTAÖĞRETİM) • Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi Onarım İnşaatı • Tokat Merkez Atatürk Anadolu Lisesi ve Zile Sakarya Lisesi Onarım İşi • Pazar İlçesi Üzümlören Çok Programlı Lise Onarım İnşaatı İşi • Turhal Özel Eğitim Meslek Lisesi Halı Saha İnşaatı İşi • Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım İşi • Zile Endüstri Meslek Lisesi Doğalgaz Dön. Yapım İşi • Tokat Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesi Onarım İşi • Erbaa İlçesi Coşkun Önder ve Yılmaz Kayalar Fen Liseleri Onarım İşi • Turhal Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesi Onarım İşi • Tokat İli Niksar İlçesi Gürçeşme Kasabası Ek 4 Derslikli İlköğretim Okulu İkmal İnşaatı • Tokat Merkez Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi Onarım İşi • Gazi Osman Paşa Lisesi Ek Bina ve Arif Nihat Asya Lisesi Onarım İşi	24

	• Erbaa Kız Meslek Lisesi Doğalgaz Dönüşüm İşi • Tokat Mesleki Eğitim Merkezi Onarım İşi • Tokat İli Turhal İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Onarım İşi • Artova Lisesi ve Niksar Danişment Gazi Lisesi Onarımı • Tokat Yeşilyurt İlçesi Çok Programlı Lise Onarımı İşi • Tokat Rehberlik Araştırma Merkezi Doğalgaz Dönüşümü Turhal Ortopedik Engelliler İ.Ö.O / Zile Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Onarım İşi • Zile İlçesi Endüstri Meslek Lisesi Okul Binası ve İş Okulu İnşaatı İşi • Tokat İli Erbaa İlçesi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi İle Niksar İlçesi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Onarım İşi • Tokat Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi-Zübeyde Hanım Teknik ve Kız Meslek Lisesi Onarım İnşaatı • Tokat Merkez Mehmet Akif Ersoy Lisesi Prefabrik Kantin İnşaatı Yapım İşi • Tokat Anadolu Öğretmen Lisesi Doğalgaz Dönüşüm İşi • Tokat İli Niksar İlçesi Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşi	
3	VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ • Yeşilyurt Hükümet Konağı Yapım İşi	1
4	EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ • Erbaa İlçesi Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı İşi	1
5	TARIMSAL ALTYAPI PROJELERİ • Tokat- Merkez - Gaziosmanpaşa Köyü Sulama Göleti Projesi Yapım İşi	27

	• Tokat Merkez Aluç Köyü Kapalı Sistem Sulama Tesisi Bakım Onarım İşi • Tokat Turhal Bağlarpınarı Sulama Suyu Tesisi Tamamlama İşi • Tokat Merkez Kızık Köyü S.S.T. Tamamlama Projesi İşi • Tokat Sulusaray - Alanyurt Köyü S.S.T. Tamamlama İnşaatı İşi • Almus Merkez ve Ormandibi S.S.T. Tamamlama İşi • Yeşilyurt Karagözü Köyü S.S.T. Yapım İşi • Tokat Zile Söğütözü Köyü Yağmurlama S.S.T Projesi İşi • Tokat Turhal Gümüştop Kızılkayası Köyleri Y.A.S. Elektropompaj Tamamlama İşi • Tokat Merkez Çamağzı-Dedeli-Derekışla Köyleri S.S.T. Yapım İşi • Tokat Başçiflik Hatıpli Beldesi Sulama Suyu Tesisi Yapım İşi • Tokat/Zile/Emirdolu Köyü Yas Yağ.S.S.T. III.Kısım ve Büyüközlü Köyü Yas Yağ.S.S.T. I. Kısım Yapım İşi • Tokat Niksar Kapıağzı Köyü Basınçlı Sulama Suyu Tesisi ve Asar Köyü S.S.T.Tamamlama İşi • Tokat Niksar Arpaören Köyü YAS Yağ. S.S.T.II.Kısım- Tokat Merkez Ortaören Köyü Yağ.S.S.T. Ek Hat Yapım İşi • Turhal Tatlıcak Köyü Y.A.S. Elektromotopompaj Tamamlama İşi • Tokat Merkez Yazıbaşı Ve Efe Köyleri Basınçlı S.S.T. Yapım İşi • Tokat Turhal Yağlıalan Köyü S.S.T. Tamamlama İşi • Tokat Merkez Kadıvakfı Köyü S.S.T. Bakım Onarım İşi • Tokat Reşadiye Darıderesi (İdris Mah.)Kapalı Sistem	
--	--	--

	Sulama Tesisi • Turhal Kayaören Köyü S.S.T. • Erbaa Alacabal Mah., Ballıbağ ve Güveçli Köyleri S.S.T. Tamamlama ve Bakım Onarım İşi • Tokat Zile Çayıroluğu, Kazıklı ve Yenidağıçı Köyleri S.S.T. Yapım İşi • Tokat Merkez Kabatepe Köyü YAS Yağmurlama Sulama Suyu Tamamlama Tesisi Ana Hat Yapımı • Tokat Merkez İhsaniye, Beşören, Uğrak Köyleri S.S.T. Tamamlama İşi • Zile Göçenli YAS Elektropompaj Tesisi Yapım İşi • Artova İğdir Köyü Ve Çelikli Kasabası S.S.T İşi • Tokat Zile Yapalak Köyü S.S.T. Tamamlama İşi	
6	HİZMET ALIMI • Yeşilyurt Hükümet Konağı Binası Zemin Etüd Proje ve Maliyet Hazırlama Hizmet Alım İşi • Yeşilyurt Hükümet Konağı Binası Proje ve Maliyet Hazırlama Hizmet Alım İşi	2
7	PROJE HAZIRLAMA İŞLERİ • Tokat İli Reşadiye, Erbaa ve Niksar İlçeleri Güçlendirme Projesi Hazırlanması İşi • 1.Bölge Tokat İli Pazar, Zile Ve Turhal İlçeleri Güçlendirme Projesi Hazırlanması İşi • 3.Bölge Tokat İli Merkez ve Almus İlçeleri Güçlendirme Projesi Hazırlanması İşi	3
TOPLAM		80

5. İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Cinsi	Miktarı (TL)
1	Lojman Kira Geliri (TL)	125.940,06
2	Diğer taşınmaz kira geliri (TL)	1.020.557,53
TOPLAM		1.146.497,59

4. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Cinsi	Miktarı (Adet)	Harcanan Kaynak (TL)
1	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon	77	126.810,00

S.No	Cinsi	Toplantı Sayısı (Adet)	Elde Edilen Gelir (TL)
1	26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Süleyman DEMİREL Salonu Kiraya verilmesi	115	28.100,00

5. YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

S.No	Cinsi	Harcanan Kaynak (TL)	İşin Durumu
1	İdari binalar, hizmet binaları, sosyal tesisler, ilçe bakım evleri ve lojmanların bakım onarım harcamaları	200.059,06	Tamamlandı.

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2012 YILI
FAALİYET RAPORU**

**IV - KURUMSAL
KABİLİYET VE
KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ**

A – ÜSTÜNLÜKLER

Kuvvetli Yönler	Düşünceler
1) Kurumun kaliteli idari ve teknik personele sahip olması. Genel çalışma kurallarında sağlanan uyum. Kurum içi koordinasyonda sağlanan başarı.	Kurumun; gerek İl Özel İdaresinden ve gerekse Mülga Köy Hizmetleri'nden gelen tecrübeli teknik personel ve idarecilere sahip olması, problemlerin çözümüne ve uygulamaların verimliliğinde önemli avantajlar sağlamaktadır. Teknik ve idari personeldeki yeterlilik ve tecrübe; Kurumun çalışmalarında iyi bir uyumun ve Kurum içi koordinasyonun sağlanmasına katkı sağlamaktadır.
2) Kurumun kendi idari yapısında ve görev alanındaki hizmetlerde; karar alma ve uygulama, serbestliğine ve yetkiye sahip olması.	İl Özel İdaresi 5302 Sayılı Kanunla birlikte, görev alanı içerisinde yatırımların kararlarını alabilme, bütçelendirme ve uygulama yetkisine ve serbestliğine sahip olmuştur. Bu durum birçok olumlu gelişmeyi beraberinde getirmiştir. Bunlar; • Yerel problemlerin çözümünde ve yatırım kararlarında daha hızlı karar alma süreci ve uygulamanın daha hızlı gerçekleştirilmesi. • Yatırım kararı alma süreçlerinde, yörenin problemlerine vakıf kişi ve kurumların yer almasından dolayı, yatırımların etkinliğinin artması. • Kurumlar arası işbirliğinin daha yüksek düzeyde gerçekleştirilebilmesi.
3) Kurumun bu zamana kadarki uygulamaları neticesinde, halkta ve diğer kurumlarda oluşturulan güven duygusu.	İl Özel idaresi; yaptığı yatırımların yüksek düzeyde hedefe ulaşma oranı, idarenin kurum faaliyetlerine vakıf olması ve mali saydamlığı ön planda tutması, yatırımların ve mal alımlarının finansmanından dolayı herhangi bir kuruluşun sıkıntıya düşürülmemesi, yatırımların gerçekleştirilmesinde diğer kamu kurumları ile işbirliğinin sağlanması gibi sebeplerden dolayı toplumda güven tesis etmiştir. Kurum bu güvenin vermiş olduğu rahatlıkla, yatırımlarını daha yüksek bir kararlılıkta gerçekleştirebilmektedir.

4) Kurum idari ve teknik personelinin, hizmetlerini yapar iken kullandığı makine ve ekipmanın, günümüz bilgi ve iletişim çağıyla uyumlu olması.	Kurum personeli yeniliklere açık ve yenililere adapte olabilen bir yapıya sahiptir. Özellikle teknik birimlerde proje yapım ve uygulamaları, daha yenilikçi bir yapıda olmayı gerektirmiştir. Kurum bu yönde her türlü katkıyı personeline sağlamıştır. Tüm personel, haberleşme ve iletişim imkânına sahiptir. Özellikle teknik birimler, proje ve uygulama aşamasında kullanabilecekleri ekipman ve bilgisayar programları ile desteklenmiştir. Bununla birlikte, teknolojik gelişim devamlı takip edilerek, gelişimlerden uzak kalınmamalıdır.
5) İlgili diğer kurumlar ile ilişkilerin olumlu tutulması.	İl Özel İdaresi görev alanı gereği birçok kurum ile birlikte çalışma zorunluluğundadır. Birçok kuruma destek sağlamaktadır. İşlerin verimliliği ve hizmet kalitesinin yüksek olması açısından diğer kurumlar ile olan ilişkilerin iyi olması gerekmektedir. İdari ve teknik personel bu durumun farkındadır ve bu zaman kadar yapılan çalışmalarda bu konuya gerekli hassasiyet gösterilmektedir.
6) Tarafsız ve şeffaf bir Kurum imajının sağlanmış olması.	İl Özel İdaresi, görev alanı içerisinde yer alan kırsal yerleşim birimlerine hizmet götürmede tüm gayreti ile çalışmaktadır. Yatırımlar hiçbir ayırım gözetilmeden, Tokat ekonomisine kazandırılmaktadır. Kurumun her türlü hizmet ve uygulamaları şeffaf olarak sürdürülmektedir.

B – ZAYIF YÖNLER

Zayıf Yönler	Düşünceler
1) Yatırımlarda, öncelik kriterlerinin ve uzun dönem stratejilerinin belirlendiği kurum master (kalkınma) planının olmayışından dolayı, projelendirmelerde hizmetin gerekliliği ile ilgili uzun vadeli planlamaların yapılamayışı.	Kurumun görevleri ile ilgili uzun vadeli planlamalarda faydalanılacak ve yatırımların etkinliğini artırmaya yarayacak bir master plan yapılamamıştır. Bununla birlikte, yol yapım faaliyetleri ile ilgili bir uzun dönem planlamaya yönelik bir master plan çalışması bulunmakta ve faydalanılmaktadır. Bu çalışmanın tüm faaliyetler için (inşaat-iskan, tarım, eğitim, sağlık vb.) bulunması, yapılan yatırımların etkinliğini artıracaktır. Bununla birlikte, stratejik planlama yaklaşımının gelmesi, bu konudaki bazı açıkları kapatmaya yönelik bir adımdır. Esas olarak, hazırlanan stratejik planların, master plan ile uyumlu olması ve master planın gösterdiği amaçlara yönelmesi gerekmektedir.
2) Yatırımların sürdürülebilirliğinin artırılmasına yönelik olarak, yatırım sonrası izleme değerlendirme sürecinin tam olarak yapılamaması ve yatırımların kurumsal bir işletme yapısına teslim edilemeyeşi.	Yatırımların sürdürülebilir olmasında iki temel husus vardır. Bunlar yatırım sonrası izleme ve yatırımların işletilmesi hususudur. Özellikle, bu konuda sıkıntı çekilen yatırımlar kırsala yönelik içme suyu, sulama tesisi gibi yatırımlardır. Bu tesisler köy tüzel kişiliğine teslim edilmektedir. Köylerde yatırımlar için profesyonel bir işletme anlayışının olmayışı, tesislerin etkin bir şekilde kullanılamama problemlerini getirmektedir. Sürdürülebilirlik ile ilgili birinci problem olan yatırım sonrası izleme ve değerlendirme, kurumun sorumluluğundadır. Kurumun bu zamana kadar, bu tür bir çalışma stratejisi olmamıştır. Bununla birlikte, bu tür çalışmaya yönelik önem gittikçe anlaşılmakta ve çalışma başlatma eğilimi bulunmaktadır. Çok kısa bir süre içerisinde bu yöndeki eksikliklerini giderecektir. Böylece yapılacak yeni yatırımlarda, olabilecek hatalarını düzeltebilme ve yatırım etkinliğini artırabilme şansını yakalayacaktır. Yatırımların sürdürülebilirliğini etkileyen bir diğer problem ise yatırım sonrası işletme problemidir. Bu problem daha çok sulama ve içme suyu tesislerinde kendini göstermektedir. Sulama tesislerinde, yeraltı suyu ile sulama tesislerinde işletim için sulama

	kooperatifi kurdurulma zorunluluđu bulunmaktadır. Diğer sulama tesislerinde de aynı yaklaşım veya muhtarlık içerisinde bir idareci bulundurulma zorunluluđu gibi bir yaklaşım getirilebilir. İçme suyu tesislerinde ise su saati kullanımının yaygınlaştırılmasıyla düzenli bir su kullanımı sağlanacaktır.
3) Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmaması.	Kurum birçok faaliyeti alanında hizmet götürmektedir. Bütün bu hizmet alanlarının tanıtımının yapılması ise özel bir çalışma alanını gerektirmektedir. Bu zamana kadar bu yönde, profesyonel bir anlayışta çalışacak bir biriminin oluşturulmaması, tanıtım faaliyetlerinin yeterli düzeye getirilememesine sebep olmaktadır.
4) Kurum bilgi işleme, veri değerlendirme ve arşivleme sisteminin istenilen seviyeye ulaştırılamaması.	Günümüz modern dünyasında; kurumlar yaptıkları hizmetleri ve müşteri ile olan ilişkilerini bir bilgisayar tuşu ile görebilme şansına sahiptir. Tokat İl Özel İdaresi bu konularda yaklaşık bir yıl içerisinde önemli mesafe kaydetmiş ve e-devlet sistemine geçerek, yazışmalarını elektronik ortamda gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu önemli bir adımdır. Bununla birlikte bu konuda diğer adımlarında atılması gerekmektedir. Özellikle yapılan yatırımların, her an izlenmesini mümkün kılacak bir elektronik ortamın oluşturulması gerekmektedir. Bilgiye anında ulaşılabilmelidir. Geçmişe yönelik bütün yatırımların yeri, amacı ve durumu elektronik ortama aktarılmalı ve takip edilebilmelidir. Arşivleme özellikle yatırımlar bazında, hem normal dosyalama ile hem de bilgisayar ortamında yapılmalıdır. Böylece yatırımları takip edebilmemiz mümkün olabilecektir. Bu konuda da Müdürlükler bazında bazı çalışmalar başlatılmaktadır. Özellikle, yeni uygulanmaya başlanan, performans programı ve faaliyet raporu yaklaşımı, bu tür bir çalışmayı zorunlu hale getirmektedir.

**T.C.
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ**



**2012 YILI
FAALİYET RAPORU**

**V - ÖNERİ VE
TEDBİRLER**

Tokat İl Özel İdaresi, gelişmiş ülkeler seviyesinde kurum ve hizmet anlayışına kavuşmayı ve sorumlu olduğu insanların yaşam düzeyini artırmayı hedeflemiştir. Ülkemiz insanlarını, hak ettikleri hizmete kavuşturmak için, daha hızlı bir gelişme düzeyini yakalamamız gerekmektedir. Ancak bu yapılabildiği takdirde, gelişmiş ülkelerin standartları yakalanabilecektir. Bunu yapabilmek ise, problemleri günlük çözüme yaklaşımı yerine, problemleri daha geniş perspektiflerde değerlendirmek ve çözümleri bu süreç içerisinde geliştirmek ile mümkündür. Bu yapılabildiği takdirde, çözümler daha kolay olacak, yeni problemler oluşturmayacak ve kaynak tasarrufu sağlanacaktır. Master plan, Stratejik plan ve performans programları, bu amaca hizmet etmek amacıyla geliştirilmiştir. Stratejik plandan istenilen faydanın sağlanması; stratejik planın sahiplenilmesi, performans programları ile titizlikle uygulanması ve master plan ile desteklenmesi ile mümkündür.

Kurum, son yapılan kanuni düzenlemeler ile birlikte çok önemli bir değişim sürecinden geçmektedir. Bu değişim süreci, aynı zamanda yenilenme için bir fırsattır. Kurum, geçmişinden gelen çok önemli idari ve teknik kapasiteye sahiptir. Bu kapasite modern yönetim ve teknoloji ile desteklendiği ve yatırım kararları alınırken bu teknik kapasite kullanılabildiği takdirde, hizmetlere olumlu olarak yansıtacak ve kurum performansı artacaktır. Ayrıca, Kurum kendi personelini, modern yönetim anlayışı içerisinde organize etmek ve de modern iletişim ve bilgi sistemleri ile donatmak durumundadır. Bununla birlikte, Kurum insana verdiği değeri üst düzeye taşıyarak, kurum – müşteri ilişkilerinde elektronik ortamı kullanmaya yönelik çalışmalara başlamalıdır. e-devlet uygulamasını yaklaşık üç yıl gibi bir sürede bütün kuruma yayması ve etkin olarak kullanmaya başlaması ve e-imza uygulamasına geçilmesi, elektronik ortamda çok daha fazla gelişimlere ulaşacağının önemli bir göstergesidir.

Kurum kendi bünyesi içerisinde ürettiği ve desteklediği projelerde, projelerin sosyal ve ekonomik faydasını ortaya koyan, etkin değerlendirme sistemlerine geçmek durumundadır. Projeler sadece teknik detaylardan oluşturulmamalı ve etkin gerekçelendirmelerle desteklenmelidir. Bu yapılabildiği takdirde, projelerin etkinliği artacaktır.

Tokat İl Özel İdaresi, yatırımlarını çok geniş bir alanda sürdürmekte ve birçok farklı kurum ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmektedir. Yatırımların etkinliğinin artırabilmesi için yatırım sonrası izleme ve değerlendirme sürecini başlatmak durumundadır. Bunun için yapılması gereken, yatırım bilgi ve izleme süreci için sistemler geliştirilmelidir. Her an izlenmesini mümkün kılacak, elektronik yazılım ve formatlardan istifade edilmelidir. Bu yapılabildiği takdirde, yatırımların daha etkin bir şekilde yönlendirilmesi ve planlanması yapılabilecektir.

Sonuç olarak, Stratejik Planda yer alan hedeflere ulaşmak, tüm vatandaşlara yerinde ve adil bir şekilde hizmetleri ulaştırabilmek için özel idarenin gelirlerinin artırılması önem arz etmektedir.

